

जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का सामाजिक अंकेक्षण

जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना (म.प्र.)

समयावधि
मार्च-अप्रैल
2025



सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट



जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन का सामाजिक अंकेक्षण



जनपद- पन्ना, जिला-पन्ना, मध्यप्रदेश

समयावधि - मार्च-अप्रैल 2025



समर्थन-सेंटर फार डेवलपमेंट सपोर्ट, भोपाल, मध्यप्रदेश

संकेत सूची

प्रस्तावना	02
1. प्रदेश, जिला एवं जनपद की वर्तमान स्थिति	02
2. सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया	03
3. 35 ग्रामों की 41 जल सप्लाई व्यवस्था	04
4. जल सप्लाई एवं जल सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख प्रगति	04
4.1 42 फीसदी से 28 फीसदी बचे नल कनेक्सन से वंचित घर	04
4.2 जेजेएम ग्राम कार्ययोजनाओं के सापेक्ष प्रगति	04
4.3 जीपीडीपी/मनरेगा- कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति	06
4.4 जलकर संग्रहण से जल सप्लाई व्यवस्था में सुधार	06
5. ग्राम वार जल सप्लाई से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ-एक नजर में	08
6., 24 फीसदी जल सप्लाई व्यवस्था बंद, 20 फीसदी अप्रारंभ	09
7. 06 ग्रामों में पेय योग्य नहीं है जल- खारेपन की शिकायत	11
8. ग्राम जहां एक बोरवेल/स्रोत से सप्लाई है	12
9. बिजली बन रही जल सप्लाई में बाधा	12
10. नल कनेक्सन की वर्तमान स्थिति	12
11. कनेक्सनधारी परिवारों में जल दबाव की स्थिति	16
12. ग्राम स्तरीय संस्थाओं में नल कनेक्सन एवं जल सप्लाई की स्थिति	18
13. जल सप्लाई की बेहतरी हेतु प्रमुख अनुसंधानें	19

संलग्नक

1. ग्राम वार घर एवं संस्थाओं में नल कनेक्सन तथा जल सप्लाई की स्थिति	22
2. समुदाय द्वारा चिन्हित जल सप्लाई से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ	30
3. ग्राम कार्ययोजना, मनरेगा एवं जीपीडीपी में चिन्हित गतिविधियां एवं प्रगति	41

सारांस

जल जीवन मिशन के तहत पन्ना जिले की पन्ना जनपद में हर घर नल से जल देने हेतु खड़ी की गई अधोसंरचना, दिये गये नल कनेक्सन तथा शुद्ध, पर्याप्त एवं नियमित जल उपलब्ध कराने की स्थिति को समझने हेतु सामाजिक अंकेक्षण किया गया। साथ ही दो वर्ष पूर्व जल जीवन मिशन के तहत समुदाय के साथ मिलकर बनाई गई ग्राम कार्ययोजनाओं (व्ही.ए.पी.) में दर्ज गतिविधियों में हुई प्रगति को समझने के लिये पन्ना जिले की पन्ना जनपद अंतर्गत आने वाले 35 ग्रामों में समुदाय तथा ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के साथ चर्चा की गई जिससे जमीनी परिस्थितियां सामने आईं। 35 ग्रामों में चलाई गई इस प्रक्रिया के दौरान जहां एक तरफ प्रगति देखी गई वहीं दूसरी तरफ चुनौतियां भी सामने आईं। ग्राम कार्ययोजना बनाने के दौरान इन 35 ग्रामों में चिन्हित कुल 6148 घरों में से 2602 घर नल कनेक्सन से वंचित थे जबकि मार्च 2025 में किये गये सर्वेक्षण में नल कनेक्सन विहीन घर घटकर 1717 रह गये हैं। ग्राम कार्ययोजनाओं में चिन्हित पेयजल से जुड़ी 420 गतिविधियों में 118 गतिविधियां पूर्ण हो चुकी हैं। ठीक इसीप्रकार कार्ययोजनाओं में दर्ज जल संरक्षण से जुड़ी 421 गतिविधियों में 37 पूर्ण हो चुकी हैं। इन्हीं ग्रामों की मनरेगा एवं जीपीडीपी की कार्ययोजनाओं में पेयजल से जुड़ी 54 गतिविधियां दर्ज की गई थी जिसमें से 33.6 फीसदी गतिविधियां पूर्ण हो चुकी हैं वहीं कार्ययोजनाओं में दर्ज जल संरक्षण हेतु दर्ज 163 गतिविधियों में से 27.6 फीसदी गतिविधियां पूर्ण हो चुकी हैं। पन्ना जनपद के जिन ग्रामों में जल सप्लाई प्रारंभ की गई है उनमें से 29 ग्रामों में समिति द्वारा जलकर संग्रहण की शुरुआत हुई है जिसमें से अधिकांश ग्रामों में समितियों के द्वारा नियमित जलकर एकत्रित किया जा रहा है जिसका उपयोग पंप आपरेटर का मानदेय देने एवं मरम्मत के कामों में किया जा रहा है।

दूसरी तरफ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। 35 में से 08 ग्रामों में अभी तक सप्लाई प्रारंभ नहीं हो सकी है जबकि 10 ग्रामों में जल सप्लाई प्रारंभ होने के बाद अलग-अलग कारणों से बंद है। 35 ग्रामों में से 10 ग्रामों में बोर का मोटर खराब है जिससे सप्लाई बंद है। 07 ग्रामों में संप/ओवरहेड टैंक को दूसरे बोरवेल से नहीं जोड़ा गया है। 21 ग्राम ऐसे हैं जहां पाईप लाईनों एवं नल कनेक्सनों में कई जगह लीकेज है जिससे कई बसाहटों में जल दबाव या तो सून्य है या फिर काफी कम है। इन 35 ग्रामों में से 23 ग्रामों में पाईप लाईनों की कमी है जिससे कुछ बसाहटें नल कनेक्सन से वंचित हैं। 24 ग्रामों में जरूरी स्थानों पर वाल्व की कमी है जिन्हें लगाकर उचित जल दबाव के साथ जल सप्लाई को बेहतर बनाया जा सकता है। सर्वेक्षण में शामिल 35 ग्रामों में से 06 ग्रामों में जल सप्लाई व्यवस्था का जल पीने योग्य नहीं है। ग्राम स्तरीय संस्थाओं जैसे स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में से अधिकांश में नल कनेक्सन तो कर दिये गये हैं लेकिन अधिकांश में सप्लाई बंद है। 45 आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 19 में ही कनेक्सन है लेकिन 8 में ही सप्लाई चालू है। ठीक कुल 68 स्कूलों में से 31 में नल कनेक्सन दे दिये गये हैं लेकिन मात्र 15 स्कूलों में ही जल सप्लाई चालू है। पन्ना जिले में जेजेएम की सहभागी ग्राम कार्ययोजनाओं की प्रगति समीक्षा से प्रारंभ होकर सामाजिक अंकेक्षण तक की इस यात्रा में एवं प्रतिवेदन तैयार करने में संस्था के निदेशक डा0 योगेश कुमार जी का नियमित मार्गदर्शन एवं सहयोग मिला है। जमीनी स्तर पर घरों का सर्वेक्षण करने एवं जमीनी स्थिति को समझने में पन्ना टीम के साथी श्री कमल सेन, श्री चाली राजा एवं ग्राम स्तर पर कार्य करने वाले सभी साथियों की मेहनत एवं सहयोग से संभव हुआ है। सभी सहयोगियों एवं साथियों का मैं आभारी हूँ।

राजकुमार

प्रस्तावना

जल जीवन मिशन के माध्यम से हर घर नल से शुद्ध, नियमित एवं पर्याप्त जल मुहैया कराने के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है जिसे 2028 तक पूर्ण करना सुनिश्चित किया गया है। इस मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में निवास करने वाले हर घर में नल से जल देने हेतु ठोस व्यवस्था बनाने का कार्य किया जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान मध्यप्रदेश के पन्ना जिले के कई ग्रामों में जल सप्लाई की व्यवस्था बनाई गई है। जिसके तहत कुछ ग्रामों में बोरवेल कर सीधे जल सप्लाई की व्यवस्था बनाई गई तो कुछ ग्रामों में प्लास्टिक ओव्हरहेड टैंक तथा कुछ में सीमेंट ओव्हरहेड टैंक का निर्माण, जल वितरण पाईप लाईनों को बिछाने का कार्य, नल कनेक्शन देने के साथ ग्राम के स्तर पर बोरवेल कर जल सप्लाई प्रारंभ की गई है। वहीं कई ग्राम ऐसे भी हैं। इनमें से अधिकांश ग्रामों में जल सप्लाई प्रारंभ भी की जा चुकी है।

भारत सरकार की गाईडलाईन के अनुसार जल सप्लाई हेतु ग्राम की योजना निर्माण के साथ क्रियान्वयन एवं सतत् निगरानी/देखरेख की जिम्मेवारी एवं अधिकार ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों/समुदाय एवं ग्रामसभा को दिये गये हैं। म0प्र0 पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 के अनुसार भी ग्रामसभा एवं उसकी समितियों को अपने दायित्वों से संबंधित कार्य की निगरानी एवं बेहतरी के प्रयास करने का अधिकार है। किसी भी ग्राम में मजबूत जल सप्लाई व्यवस्था बनाने एवं उसके सफल संचालन हेतु समिति एवं समुदाय द्वारा जल सप्लाई व्यवस्था की समस्याओं को लगातार चिन्हित किया जाना एवं उसमें त्वरित सुधार की पैरवी आवश्यक है। ताकि कोई परिवार जल से वंचित न रहे।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर समर्थन-सेंटर फार डेवलपमेंट सपोर्ट द्वारा विगत वर्ष जनवरी 2024 में पन्ना जिले की पन्ना जनपद अंतर्गत आने वाले 37 ग्रामों में समुदाय के नजरिये से गांव में जल सप्लाई से जुड़ी वर्तमान प्रगति एवं समस्याओं को चिन्हित करने का प्रयास किया गया था। पुनः मार्च 2025 में पन्ना जनपद के 35 ग्रामों में इसे दोहराया गया है ताकि प्रगति एवं वर्तमान समस्याओं को चिन्हित किया जा सके। इस प्रतिवेदन को तीन हिस्सों में बांटा गया है जिसमें जल सप्लाई एवं जल सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों में प्रगति, वर्तमान समस्याएँ एवं अनुसंशायें मुख्य हैं। आशा है यह प्रतिवेदन पन्ना जिले में जल सप्लाई से जुड़ी जमीनी स्थिति को समझने में उपयोगी होगा।

1. प्रदेश, जिला एवं जनपद की वर्तमान स्थिति

जेजेएम के अनुसार मध्यप्रदेश में कुल 51154 ग्राम हैं जिनमें से 304 ग्राम हैं जहां वर्तमान में नल जल सप्लाई नहीं है। आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के बुरहानपुर एवं निवारी दो ऐसे जिले हैं जहां 100 फीसदी घरों को नल से जल दिया जा चुका है। पन्ना जिले की बात करें तो जिले में कुल 940 ग्राम हैं। जल जीवन मिशन के आंकड़ों के अनुसार 99.14 फीसदी यानी 932 ग्रामों में पाईप जल सप्लाई की व्यवस्था है। इनमें से 248 ग्रामों (26.4 फीसदी) ग्रामों में प्रमाणिक रूप से 100 फीसदी घरों में नल से जल दिया जा रहा है। अगर पन्ना जनपद की बात करें तो जल जीवन मिशन के आंकड़ों के अनुसार पन्ना जनपद के 184 ग्रामों में से केवल 02 ग्राम ऐसे हैं जहां नल कनेक्शनों की संख्या सून्य है। जबकि 1 से 10 घरों में नल कनेक्शन वाले ग्रामों की संख्या 75 है। ऐसे गांव जहां 50 या इससे अधिक घरों में नल कनेक्शन दिये जा चुके हैं उनकी संख्या 58 है।

क्र	क्षेत्र सीमा	कुल ग्राम	जल सप्लाई व्यवस्था युक्त ग्राम	जल सप्लाई से वंचित ग्राम	100 फीसदी नल कनेक्शन वाले ग्राम	100 फीसदी जल सप्लाई के गांव (प्रतिशत में)
1	मध्यप्रदेश	51154	50850	304	18630	36.41
2	जिला-पन्ना	940	932	08	248	26.4
3	जनपद पन्ना	184	182	02	49	26.6

2. सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रक्रिया

जेजेएम का केन्द्र समुदाय है। समुदाय की भागीदारी को महत्व दिया गया है जिससे बेहतर नियोजन एवं क्रियान्वयन के साथ बेहतर संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसलिये आवश्यक था कि समुदाय के नजरिये से उस ग्राम की जल सप्लाई व्यवस्था को समझा जाये। जल सप्लाई की स्थिति को समझने के लिये ऐसे 35 ग्रामों का चयन किया गया जिनमें से 24 ग्रामों में 100 फीसदी घरों में प्रमाणिक तौर पर नल से शुद्ध जल देने की बात कही जा रही है। इन ग्रामों का चयन जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों में बसे ग्रामों को भी आधार बनाया गया। इसमें प्रमुख रूप से वनों के बीच बसे ग्राम, डायरेक्ट बोर से सप्लाई वाले ग्राम, ओव्हरहेड टैंक तथा संप के माध्यम 3 से जल सप्लाई व्यवस्था वाले ग्राम प्रमुख हैं। साथ ही इनमें से कुछ ऐसे ग्रामों को भी शामिल किया गया जहां के समुदाय द्वारा जल सप्लाई के जल को पीने योग्य नहीं माना गया। सर्वेक्षण की प्रक्रिया के तौर पर ग्राम कार्ययोजना निर्माण के दौरान तैयार की गई नल कनेक्सन युक्त एवं वंचित परिवार सूची की वर्तमान स्थिति का घर-घर पुनः सत्यापन, ग्राम स्तरीय संस्थाओं खासतौर पर स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्सन एंड जल सप्लाई की स्थिति को जानना तथा ग्राम कार्ययोजना में चयनित गतिविधियों की प्रगति की स्थिति को समझना तय किया गया। साथ ही यह समझना तय किया गया कि समुदाय द्वारा जल सप्लाई की वर्तमान स्थिति में किसप्रकार की चुनौतियां महसूस की जा रही हैं। जल सप्लाई की स्थिति के आंकलन हेतु तय किये गये ग्रामों का विवरण निम्न है।

क्र	ग्राम का नाम	जेजेएम अनुसार वर्तमान स्थिति		क्र	ग्राम का नाम	जेजेएम अनुसार वर्तमान स्थिति	
		घरों में नल कनेक्सन	पूर्ण / प्रगतिरत			घरों में नल कनेक्सन	पूर्ण / प्रगतिरत
1	दिया	100 %	प्रगतिरत	19	अमहाई	100 %	पूर्ण
2	जमुनिहा	<100 %	प्रगतिरत	20	सवाईगंज	100 %	प्रगतिरत
3	नैगुवां	100 %	प्रगतिरत	21	गुडहा	<100 %	प्रगतिरत
4	रमखिरिया	<100 %	प्रगतिरत	22	रानीगंजपुरवा	<100 %	प्रगतिरत
5	बिजवारा	100 %	पूर्ण	23	पल्थरा	100 %	पूर्ण
6	मुटवा कला	100 %	प्रगतिरत	24	बहेरा	100 %	प्रगतिरत
7	गोविंदपुरा	<100 %	प्रगतिरत	25	रतगवां	<100 %	प्रगतिरत
8	सुन्दरा	100 %	प्रगतिरत	26	गुखौर	<100 %	प्रगतिरत
9	इटवां तिल्हा	100 %	प्रगतिरत	27	मनकी	<100 %	प्रगतिरत
10	मनोर	100 %	प्रगतिरत	28	ऊंटन	100 %	पूर्ण
11	तारा	100 %	प्रगतिरत	29	दुबहिया	100 %	प्रगतिरत
12	कुल्हुआ	100 %	प्रगतिरत	30	समाना	100 %	प्रगतिरत
13	देवरी	100 %	प्रगतिरत	31	फूलदरी	100 %	प्रगतिरत
14	डडबरिया	100 %	प्रगतिरत	32	मुराछ	100 %	प्रगतिरत
15	बंगला	100 %	प्रगतिरत	33	जस्थोवा	100 %	पूर्ण
16	नुनाही	100 %	प्रगतिरत	34	अकोला	100 %	प्रगतिरत
17	उमरी	<100 %	प्रगतिरत	35	पाठा	<100 %	प्रगतिरत
18	कोढनपुरवा	<100 %	प्रगतिरत				


3. चयनित 35 ग्रामों की 41 जल सप्लाई व्यवस्था

सामाजिक अंकेक्षण/ प्रगति आंकलन में शामिल किये गये 35 ग्रामों में 21 जल सप्लाई की व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। इन 35 ग्रामों में से 05 ग्रामों दिया, मुराछ, जरधोवा, तारा एवं मनोर में एक ही ग्राम की अलग-अलग बसाहटों में अलग-अलग जल सप्लाई की व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं। तारा ग्राम में ओव्हरहेड टैंक से जल सप्लाई की व्यवस्था है साथ ही इसकी दो बसाहटों टपरियन एवं शंकरपुरा में डायरेक्ट बोरवेल से जल सप्लाई की व्यवस्था बनाई गई है। मतलब यह हुआ कि एक ही ग्राम की अलग-अलग बसाहटों में जल सप्लाई की अलग-अलग व्यवस्थाएँ हैं।

4. जल सप्लाई एवं जल सुरक्षा से जुड़ी प्रमुख प्रगति

4.1 42 फीसदी से 28 फीसदी बचे नल कनेक्सन से वंचित घर

वर्ष 2023-24 में जल जीवन मिशन की ग्राम कार्ययोजना (व्ही.ए.पी.) निर्माण के समय सर्वेक्षित 35 ग्रामों में के दौरान लगभग 42 फीसदी ऐसे परिवार थे जिनके घरों में नल कनेक्सन नहीं दिये गये थे। ऐसे सभी कनेक्सन विहीन घरों को चिन्हित किया गया एवं कनेक्सन नहीं होने के कारणों को ग्राम कार्ययोजना में स्थान दिया गया। बाद में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, ग्राम पंचायत तथा संस्था की टीम के द्वारा कार्ययोजनाओं एवं समय-समय पर चिन्हित समस्याओं को पीएचईडी एवं जिला प्रशासन से साझा किया गया। परिणामस्वरूप कई वंचित बसाहटों में पाईप लाईन डाली गई एवं नल कनेक्सन से वंचित परिवारों को नल कनेक्सन दिये गये। वर्तमान में सर्वेक्षण हेतु चयनित 35 ग्रामों में 28 फीसदी ऐसे घर हैं जो नल कनेक्सन से वंचित हैं। इनमें से 07 ग्राम उमरी, रतगवां, गुखौर, गुड़हा, पाठा, मनकी एवं जमुनिहा में अभी तक जल सप्लाई की व्यवस्था बनाने का कार्य चल रहा है इन ग्रामों में जल सप्लाई अभी प्रारंभ नहीं हुई है। नल कनेक्सन से वंचित परिवारों का विवरण निम्नानुसार है।

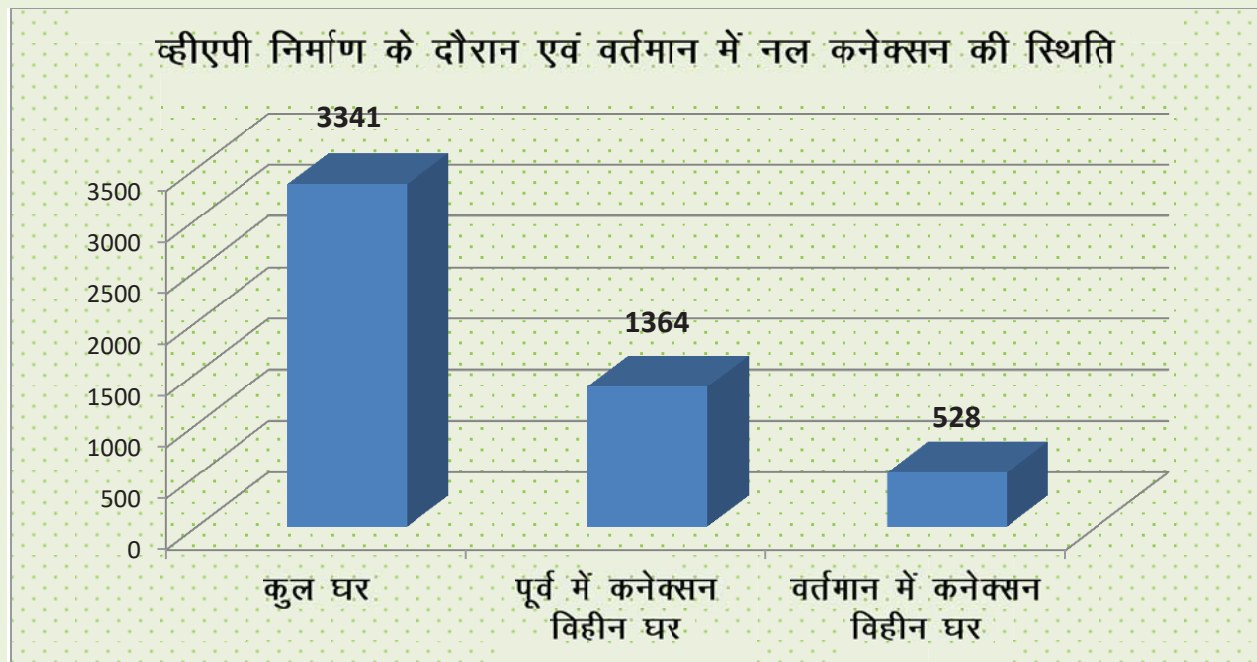


4.2. ग्राम कार्ययोजना (VAP) के सापेक्ष प्रगति

ग्राम कार्ययोजना में मूलतः नल कनेक्सन से वंचित घर एवं नल कनेक्सन से वंचित ग्राम स्तरीय संस्थाओं को चिन्हित किया गया एवं इन्हें नल कनेक्सन देने के साथ उचित दबाव से जल मिले इससे जुड़ी समस्याओं जैसे— वंचित बसाहटों में पाईप लाईन डालना, ओव्हरहेड टैंक का निर्माण, संप निर्माण, मोटर बदलना, वाल्व लगाना, कूप मरम्मत जैसी गतिविधियों को शामिल किया गया। इसके साथ ही स्रोत स्थायित्व के लिये आवश्यक वर्षा जल संरक्षण गतिविधियां, ग्रेजल प्रबंधन, छत जल प्रबंधन, जल संरचनाओं का निर्माण एवं मरम्मत, पौधरोपण के साथ-साथ स्वच्छता एवं ग्राम की प्रमुख समस्याओं को दर्ज किया गया। ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति, समुदाय एवं पंचायतों को प्रेरित कर जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियों को जीपीडीपी एवं मनरेगा की कार्ययोजनाओं में शामिल कराने जोर दिया गया। वर्तमान में देखा गया कि ग्राम कार्ययोजना में दर्ज की गई गतिविधियों में से काफी गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा चुका है। जिन्हें निम्न आंकड़ों से समझा जा सकता है।

गतिविधियों का स्रोत	कार्ययोजनाओं में शामिल पेयजल/ जल संरक्षण गतिविधियों का विवरण								
	कुल	पेयजल				जल संरक्षण			
		कुल	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ	कुल	पूर्ण	प्रगतिरत	अप्रारंभ
ग्राम कार्ययोजना (VAP)	841	420	118	10	292	421	37	14	370

नोट— पेयजल की गतिविधियों में प्रमुख रूप से कूप मरम्मत, वंचित बसाहटों में पाईप लाईन, ओव्हरहेड टैंक, संप, मोटर, वाल्व, घरों में नल कनेक्सन, ग्राम संस्थाओं में नल कनेक्सन से जुड़ी गतिविधियां शामिल है जबकि जल संरक्षण की गतिविधियों में ग्रेजल प्रबंधन, छत जल प्रबंधन, तालाब निर्माण, स्टापडेम निर्माण एवं इनकी मरम्मत/सुधार के कार्य शामिल है।

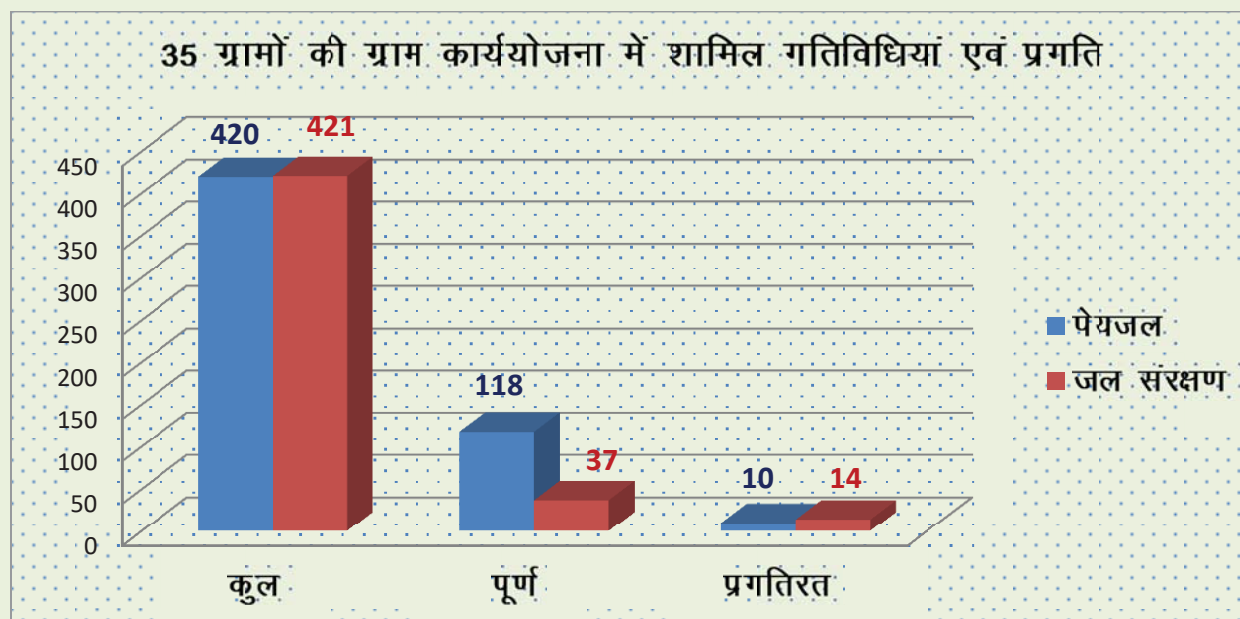

4.3 जीपीडीपी/मनरेगा कार्ययोजना के सापेक्ष प्रगति

ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना (जीपीडीपी/मनरेगा) निर्माण के दौरान संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों को प्रशिक्षित किया गया। इस दौरान जल के महत्व एवं बढ़ते जल संकट के बारे में चर्चा कर संवेदनशील बनाया गया। साथ ही समुदाय को भी जागरूक किया गया ताकि वे ग्रामसभा के दौरान ग्राम में चिन्हित जल संचय से जुड़ी गतिविधियों को कार्ययोजना में जोड़ने की पहल करें। पिछले वित्तीय वर्षों 2023-24 एवं 2024-25 में 35 ग्रामों में कार्ययोजनाओं में शामिल पेयजल एवं जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां तथा उनकी प्रगति/वर्तमान स्थिति को निम्न प्रकार से देखा जा सकता है।

गतिविधियों का स्रोत	सर्वेक्षित 17 ग्रामों में ग्राम पंचायत की वार्षिक कार्ययोजनाओं में शामिल पेयजल/ जल संरक्षण गतिविधियां एवं उनमें प्रगति का विवरण										
	कुल	पेयजल					जल संरक्षण				
		कुल	पूर्ण	पूर्ण % में	प्रगति रत	अप्रारंभ	कुल	पूर्ण	पूर्ण % में	प्रगति रत	अप्रारंभ
जीपीडीपी 23-24, 24-25	117	51	18	35.3	1	32	66	7	10.6	1	58
मनरेगा 23-24, 24-25	101	3	0	0	1	2	97	38	39.2	30	29
कुल	218	54	18	33.3	2	34	163	45	27.6	31	87

नोट— पेयजल से जुड़ी पूर्ण हुई गतिविधियों में मोटर मरम्मत कार्य, जल सप्लाई पाईप लाईन मरम्मत, सार्वजनिक कूप मरम्मत जैसी गतिविधियां प्रमुख हैं। जबकि जल संरक्षण की पूर्ण हुई गतिविधियों में परकुलेशन टैंक निर्माण, स्टापडेम निर्माण, चेकडेम, बोल्टर चेकडेम निर्माण, ग्रेबियन निर्माण, चेकडेम मरम्मत जैसे कार्य प्रमुख हैं।

4.4 जलकर संग्रहण से जल सप्लाई व्यवस्था में सुधार

ग्राम स्तर पर हर घर को नल से जल देने हेतु बनाई गई जल सप्लाई का नियमित एवं सफल संचालन करना बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। जिसकी जिम्मेवारी ग्राम समितियों एवं पंचायतों को दी गई है। यह तभी संभव है जब समितियां एवं ग्राम पंचायतें इस व्यवस्था की मरम्मत एवं संचालन में ध्यान दें। समय-समय पर होने वाली टूट-फूट की मरम्मत, पंप आपरेटर के वेतन से जुड़े खर्च एवं बिजली का बिल भरने आदि में राशि की जरूरत होती है। भारत सरकार की गाईडलाईन में लिखा गया है कि समितियां/पंचायतें उपभोक्ताओं से जल कर ले सकती हैं। जल कर एकत्रित होने से समितियों के पास हमेशा राशि होगी जिसका उपयोग वे योजना के रखरखाव एवं बेहतर संचालन में कर सकते हैं। संस्था के द्वारा कार्यक्षेत्र के ग्रामों में गठित ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही समुदाय को जागरूक एवं प्रेरित किया गया ताकि वे अपने गांव में जल सप्लाई हेतु बनाई गई व्यवस्था को सफलता पूर्वक संचालित कर सकें। वर्तमान में पन्ना जनपद की 29 समितियों के द्वारा न सिर्फ 60 रुपये प्रतिमाह प्रति नल कनेक्शन के हिसाब से जल कर की वसूली की जा रही है बल्कि इस राशि से दैनिक मरम्मत एवं बेहतर संचालन में उपयोग किया जा रहा है।

क्र	ग्राम का नाम	मार्च 2025 की स्थिति में जल कर संग्रहण का विवरण (रु0 में)			
		औसत जलकर प्रतिमाह	कुल संग्रह	कुल खर्च	शेष राशि
1	जरधोवा	13800	111400	100000	11400
2	अकोला	1200	5080	5080	0
3	गोविंदपुरा	2100	3900	3900	0
4	ऊंटन	1560	6320	6000	320
5	बमुरहिया	3900	10400	10000	400
6	बहेरा	1200	18920	16000	2920
7	इटवां तिल्हा	7020	42835	32000	10835
8	दुबहिया	7500	25390	21000	4390
9	सुन्दरा	7260	6430	4200	2230
10	फुलवारी	7920	4000	4000	0
11	फुलदरी	8520	4000	4000	0
12	समाना	4320	46920	42000	4920
13	मनोर	4200	22540	21000	1540
14	पल्थरा	1680	35820	32000	3820
15	बिजवारा	1440	19240	17000	2240
16	अमहाई	1080	7420	7200	220
17	बंगला	2100	15240	14000	1240
18	पहाड़ीखेरा	48000	86000	44000	42000
19	मुराछ	3300	5040	5000	40
20	डडबरिया	7320	27940	24000	3940
21	तारा	10680	131220	120000	11220
22	झरकुआ	9900	40550	36000	4550
23	दिया	5100	58460	54000	4460
24	नैगुवां	2100	19220	18000	1220
25	रानीगंज पुरवा	9720	30030	26000	4030
26	सवाईगंज	4020	51770	48000	3770
27	कमलपुरा	1740	14240	13000	1240
28	कुल्हुआ	7680	7100	7100	0
29	राजापुर	10080	44590	29000	15590
औसत प्रति ग्राम		6773.79	31103.97	26326.90	4777.07

नोट- जरधोवा में अधिक जलकर संग्रहण के साथ खर्च भी ज्यादा है जिसका प्रमुख कारण हर माह पंप आपरेटर के मानदेय भुगतान के अलावा बार-बार मोटर खराब होने के बाद उसे निकालने एवं मरम्मत कार्य में खर्च होना है। साथ ही लीकेज मरम्मत आदि में भी राशि खर्च की गई है। अभी तक किसी भी ग्राम में जल कर से बिजली का बिल प्रदाय नहीं किया गया। जबकि कुछ ग्रामों में बिजली खपत की बड़ी राशि का बिल आया है। जिन ग्रामों में नियमित जलकर आ रहा है वहां पंप आपरेटर का हर माह भुगतान दिया जा रहा है शेष खर्च मोटर मरम्मत, स्टार्टर मरम्मत, लीकेज सुधार आदि में खर्च हुआ है।

5. ग्रामवार जल सप्लाई से जुड़ी प्रमुख समस्याएँ— एक नजर में


सर्वेक्षण में शामिल 35 ग्रामों में समुदाय द्वारा उनके ग्राम में जल सप्लाई से जुड़ी प्रमुख समस्याओं को चिन्हित किया गया है। कई ग्रामों में काफी लंबे समय से जल वितरण पाईप लाईनों, वाल्वों एवं नल कनेक्सन पाईपों में बड़े लीकेज है जिनका सुधार नहीं हो पा रहा। कई ग्रामों में वाल्व नहीं लगाये जाने या लगाये गये वाल्व के खराब हो जाने से सप्लाई बाधित है तो कुछ ग्रामों की बसाहटों में पाईप लाईन की कमी है। देवरी ग्राम की जल सप्लाई इसलिये बंद है क्योंकि वहां लीकेज सुधार नहीं हुआ जिससे गांव में कीचड़ होता है। लड़ाई-झगड़े की संभावना को खत्म करने के कारण सप्लाई ही बंद कर दी गई है।

क्र	विशेष समस्याएँ	ग्राम संख्या	ग्राम/बसाहट के नाम
1	एक बोरवेल वाले ग्राम	07	बिजवारा, अमहाई, सवाईगंज, पल्थरा, दुबहिया, ऊटन, फूलदरी
2	बोरवेल का मोटर जला/खराब है	10	डडबरिया, कुल्हुआ, इटवां तिल्हा, रमखिरिया, रानीगंजपुरवा, पल्थरा, बहेरा, दुबहिया, मुराछ (उपरपुरा), जरधोवा
3	बोरवेल छतिग्रस्त है	02	मनोर, कुल्हुआ,
4	मोटर की तार खराब/ नहीं है	06	बिजवारा, नैगुवां, इटवां तिल्हा, उमरी, रमखिरिया, मुटवा कला
5	बोल्टेज कम है बार-बार मोटर की तार जल जाती है	01	बिजवारा
6	संप वेल का मोटर खराब है	04	डडबरिया, इटवां तिल्हा, उमरी, मुराछ (निम्हा)
7	संपवेल/ओव्हरहेड टैंक को दूसरे बोर से नहीं जोड़ा गया	07	मनोर, इटवां तिल्हा, उमरी, रमखिरिया, मुटवा कला, पल्थरा, गुखौर
8	ओव्हरहेड टैंक में लीकेज है	02	बिजवारा, सुन्दरा
9	संपवेल लीकेज/खराब है	03	मनोर, उमरी, दुबहिया
10	पाईप लाईन में लीकेज है	21	दिया, गोविंदपुरा, डडबरिया, मनोर, कुल्हुआ, नुनाही, बंगला, सुन्दरा, इटवां तिल्हा, रमखिरिया, मुटवा कला, देवरी, अमहाई, सवाईगंज, रानीगंजपुरवा, बहेरा, दुबहिया, समाना, मुराछ, अकोला
11	नल कनेक्सन में लीकेज है	03	बहेरा, समाना, मुराछ
12	कुछ बसाहटों में पाईप लाईन की कमी है	23	बिजवारा, दिया, गोविंदपुरा, डडबरिया, मनोर, कुल्हुआ, नुनाही, तारा, तारा (शंकरपुरा), सुन्दरा, नैगुवा, इटवां तिल्हा, उमरी, रमखिरिया, देवरी, जमुनिहा, सवाईगंज, रानीगंजपुरवा, पल्थरा, गुखौर, दुबहिया, ऊटन, फूलदरी, अकोला
13	कुछ बसाहटों/ क्षेत्रों में वाल्व लगाने की जरूरत है	24	बिजवारा, दिया, गोविंदपुरा, मनोर, कुल्हुआ, सुन्दरा, नैगुवा, इटवां तिल्हा, उमरी, रमखिरिया, मुटवा कला, देवरी, जमुनिहा, अमहाई, सवाईगंज, रानीगंजपुरवा, पल्थरा, बहेरा, दुबहिया, ऊटन, फूलदरी, मुराछ, जरधोवा
14	वाल्व खराब/लीकेज है	05	रानीगंजपुरवा, पल्थरा, मुराछ, जरधोवा, अकोला
15	सप्लाई प्रारंभ नहीं हो सकी	02	जमुनिहा एवं उमरी, रतगवां, गुड़हा, पाठा, गुखौर,

			मनकी
16	सप्लाई चालू होने के बाद काफी समय से बंद है	04	कुल्हुआ, ललईया (दिया), देवरी, यादव टोला (मनोर), दुबहिया (दो माह से बंद), ऊटन (एक वर्ष से बंद), फुलदरी (दो वर्ष से बंद), मुराछ (8 माह से बंद), जरधोवा (नयापुरा, नरिया टोला एवं बहेरिया)
17	सप्लाई का जल खारा है	08	डडबरिया, फुलदरी, नुनाही, फुलवारी, दुबहिया एवं कुल्हुआ, दुबहिया, फुलदरी

6. 24 फीसदी जल सप्लाई व्यवस्था बंद, जबकि 20 फीसदी अप्रारंभ

चयनित 35 ग्रामों की 41 बसाहटों में अलग-अलग प्रकार की 41 प्रकार की जल सप्लाई व्यवस्था बनाई गई है। एक ही गांव की बड़ी बसाहट में ओव्हरहेड टैंक से जल सप्लाई हो रही है वहीं इसी गांव की कुछ बसाहटों में डायरेक्ट बोरवेल से जल सप्लाई की जा रही है। इन ग्रामों में सभी घरों को जल देने हेतु बनाई गई जल सप्लाई की 41 व्यवस्थाओं में से 10 जल सप्लाई व्यवस्थायें अर्थात 24 फीसदी बंद है। जबकि 8 ग्रामों अर्थात 20 फीसदी ग्रामों में अभी तक जल सप्लाई व्यवस्था बनाने के काम में काफी धीमी गति के कारण सप्लाई शुरू नहीं हो सकी है। जिन ग्रामों में जल सप्लाई व्यवस्था बंद है उनमें से कुछ ग्रामों में 02 वर्ष तो कुछ में 01 वर्ष एवं 06 माह से ज्यादा समय से जल सप्लाई बंद है। इन योजनाओं के सुधार हेतु ग्राम पंचायत एवं पीएचई के द्वारा आवश्यक मदद नहीं की जा रही है।

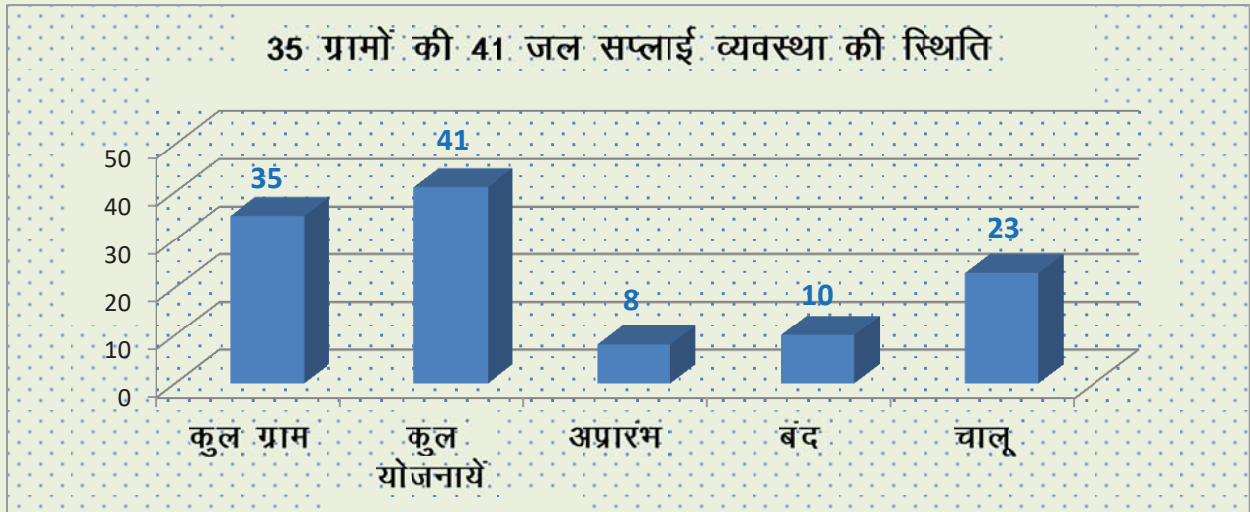

क्र	ग्राम का नाम	बसाहट जहां सप्लाई बंद है	सप्लाई बंद होने का समय	सप्लाई बंद होने का कारण
1	दिया	ललईया	04 माह	बोरवेल में पानी की बहुत ज्यादा कमी है जिससे सप्लाई करना संभव नहीं हो पा रहा। आपरेटर भी बार-बार बदला जा रहा है।
2	कुल्हुआ	कुल्हुआ	07 माह से	कई बार मोटर खराब हुआ। वर्तमान में मोटर खराब है जिसकी मरम्मत नहीं हो सकी। गांव में कई जगह लीकेज है जिसका सुधार कभी नहीं कराया गया। कुछ बसाहटों में

				पाईप भी नहीं है।
3	मनोर	यादव टोला	पूर्व से	ग्राम के ओव्हरहेड टैंक से सप्लाई व्यवस्था बनाई गई थी लेकिन किसी परिवार को पानी नहीं मिल सका। अभी नयाबोर कर इस बसाहट को ओव्हरहेड टैंक से अलग कर डायरेक्ट बोर से सप्लाई की व्यवस्था बनाई जा रही है।
4	देवरी	देवरी	03 माह से	गांव में लीकेज है जिसका सुधार नहीं हुआ। वाल्व खराब भी है। लीकेज होने से गांव में गंदगी होती है जिससे विवाद की संभावना है। विवाद न हो इसलिये सप्लाई बंद की गई है।
5	जमुनिहा	जमुनिहा	अप्रारंभ	अभी तक जल सप्लाई प्रारंभ ही नहीं हो सकी। काफी लंबे समय से इस ग्राम में पाईप लाईन बिछाने का काम चल रहा है जो अपूर्ण है। पिछले 06 माह से कोई कार्य नहीं किया गया।
6	उमरी	उमरी	अप्रारंभ	अभी तक जल सप्लाई प्रारंभ ही नहीं हो सकी। काफी लंबे समय से इस ग्राम में पाईप लाईन बिछाने का काम चल रहा है जो अपूर्ण है। पिछले 06 माह से कोई कार्य नहीं किया गया।
7	कोढनपुरवा	कोढनपुरवा	अप्रारंभ	अभी तक एक भी घर में नल कनेक्सन नहीं दिये गये हैं।
8	दुबहिया	दुबहिया	02 माह	बोरवेल की मोटर जली हुई है जिसकारण से सप्लाई बंद है।
9	ऊंटन	ऊंटन	01 वर्ष	स्टार्टर खराब है एवं बोरवेल की केविल/तार चोरी हो गई है।
10	फुलदरी	फुलदरी	02 वर्ष	स्टार्टर जलने के कारण सप्लाई बंद है।
11	मुराछ	मुराछ	08 माह	मोटर खराब है एवं ट्रांसफार्मर जल चुका है जिससे सप्लाई बंद है।
12	जरधोवा	नयापुरा	06 माह	डायरेक्ट बोर से सप्लाई है। बोरवेल का मोटर पिछले 06 माह से खराब है।
		नरिया	06 माह	पाईप में जोक/जाम है जिससे पानी आंगे के घरों में नहीं जा पा रहा है।
		बहेरिया	06 माह	पाईप में जोक/जाम है जिससे पानी आंगे के घरों में नहीं जा पा रहा है।
13	पाठा	पाठा	अप्रारंभ	काफी मंद गति से काम चल रहा है। कई कई माह काम बंद कर दिया जाता है।
14	गुड़हा	गुड़हा	अप्रारंभ	काफी मंद गति से काम चल रहा है। कई कई माह काम बंद कर दिया जाता है।
15	गुखौर	गुखौर	अप्रारंभ	काफी मंद गति से काम चल रहा है। कई कई माह काम बंद कर दिया जाता है।
16	रतगवां	रतगवां	अप्रारंभ	काफी मंद गति से काम चल रहा है। कई कई माह काम बंद कर दिया जाता है।
17	मनकी	मनकी	अप्रारंभ	काफी मंद गति से काम चल रहा है। कई कई माह काम बंद कर दिया जाता है।

7. 06 ग्रामों का पेय योग्य नहीं है जल, खारेपन की शिकायत

घर-घर नल कनेक्सन होने एवं जल सप्लाई होने के बावजूद भी कई ग्राम ऐसे हैं जहां सप्लाई के जल का उपयोग पानी पीने एवं खाना बनाने में नहीं किया जाता बल्कि केवल घर के अन्य दैनिक उपयोग मात्र के लिये किया जाता है। ऐसे कई ग्राम हैं जहां के लोग पीने के लिये पूर्व से ही गांव के बाहर से पानी लाते थे। समुदाय का कहना है कि जल जीवन मिशन के द्वारा भी ग्राम में ही बोरवेल कर पानी सप्लाई की जा रही है जिससे हम लोग उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी पीने के लिये गांव के बाहर से पानी लाना पड़ता है। साथ ही अधिकांश घरों में आर.ओ. लगाने पड़े हैं। पन्ना जनपद में ऐसे कई गांव हैं जहां समुदाय का मानना है कि उनके गांव का जल पीने योग्य नहीं है। डडबरिया, फुलदरी, नुनाही, फुलवारी, दुबहिया एवं कुल्हुआ में पानी दूषित होने की शिकायतें हैं। कुछ गरीब कमजोर परिवार सप्लाई के पानी को पीने में उपयोग करते भी हैं वे केवल मजबूरी में करते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। संस्था द्वारा कुछ ग्रामों में जल के गुणवत्ता की जांच भी की गई थी जिसमें इन ग्रामों का जल पीने योग्य नहीं पाया गया है।

सारणी-1 संस्था द्वारा की गई जल जांच का प्रतिवेदन

Gram Panchayat	Gram	Date of Water Testing (Select Testing Date by Calender)	PH (6.5-8.5)	Hardness (500-1000mg/l)	Chloride (250-1000mg/l)	RC (0-2mg/l)	Iron (0.3-1mg/l)	Turbidity (1-5NTU)	Nitrate (45NTU)	Fluoride (1.0-1.5mg/NTU)	E-Coli	TDS	Water is Suitable to Drink
Sundara	Dubahiya	06-09-2023	7	2400	354.5	0.2	0.3	5	10	1	No	765	No
Ranwaha	Kulhua	13-06-2023	8.5	600		0.2	0.3	10	10	1	Yes	286	No
Golhi Pathak	Nunahi	06-10-2023	8.5	2100	900	0.2	0.3	1.5	10	1.5	Yes	456	No
Fulwari	Fulwari	14-06-2023	10	4400	106.35	0.2	0.3	5	10	1	No	124	No

सारणी-2 जेजेएम पोर्टल के अनुसार इन ग्रामों में जल गुणवत्ता की स्थिति (2024-25)

Grampanchayat name	No. of villages wherein contamination found in samples															
	Chemical Contaminants													Bacteriological Contamination		
	pH	TDS	Turbidity	Chloride	Total Alkalinity	Total Hardness	Sulphate	Iron	Total Arsenic	Fluoride	Nitrate	Residual Chlorine	Others	E coli	Total Coliform	Others
Dadwariya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golhi Pathak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Phulwari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

8. ग्राम जहां एक बोरवेल/स्त्रोत से सप्लाई है

जल जीवन मिशन की गाईडलाईन के अनुसार जल सप्लाई व्यवस्था बनाने के लिये दो स्त्रोतों की जरूरत थी ताकि एक स्त्रोत की व्यवस्था खराब होने से दूसरे स्त्रोत से जल सप्लाई को नियमित किया जा सके। लेकिन ऐसे भी ग्राम हैं जहां एक ही स्त्रोत चिन्हित किया गया है। ऐसे भी कई ग्राम हैं जहां दो स्त्रोत चिन्हित करने के बाद भी जल सप्लाई के लिये एक ही स्त्रोत को जोड़ा गया है। विवरण को निम्नप्रकार से समझा जा सकता है।

क्र	दो बोरवेल करने के बाद एक ही बोर को सप्लाई व्यवस्था में जोड़ा गया	एक ही बोर है जिससे सप्लाई की जा रही है
1	राजापुर	बिजवारा
2	दुबहिया	अमहाई,
3	सुन्दरा	सवाईगंज
4	पल्थरा	दुबहिया
5	—	ऊटन
6	—	फुलदरी

9. बिजली बन रही नियमित जल सप्लाई में बाधा


वनों के अंदर बसे ग्रामों में बिजली की लगातार समस्या सामने आ रही है। बिजली की समस्या के कारण कई-कई माह जल सप्लाई बाधित होती रहती है। जेजेएम की गाईडलाईन में वनों एवं पहाड़ी अंचलों में बसे ग्रामों में सोलर पैनल के माध्यम से जल सप्लाई व्यवस्था बनाने की बात की गई थी। ताकि वनों के अंदर से जाने वाली बिजली की तारों के टूट-फूट की स्थिति एवं लंबे समय तक सुधार नहीं होने की स्थिति में जल सप्लाई बाधित न हो। जेजेएम के द्वारा पन्ना जनपद में अभी तक एक भी ग्राम में सोलर पैनल नहीं लगाये गये हैं। बल्कि अधिकांश ग्रामों में जल सप्लाई हेतु अलग से ट्रांसफार्मर लगाये गये हैं। जबकि कुछ ग्राम ऐसे भी हैं जहां नवीन ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं। ट्रांसफार्मर नहीं लगाये जाने के कारण भी कुछ ग्रामों में जल सप्लाई के मार्ग में बिजली की समस्या का सामना करना पड़ रहा है।

पन्ना जिले की रहुनिया पंचायत अंतर्गत बिजवारा ग्राम में 32 घर हैं। पाईप लाईन नहीं होने से 08 घर अभी भी नल कनेक्सन से वंचित हैं। ग्राम में अलग से ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया। गांव के ही ट्रांसफार्मर से जल सप्लाई व्यवस्था बनाई गई है। बिजली शक्ति कम होने के कारण बोरवेल के मोटर में लगी तार बार-बार जल जाती है। घने वनों के बीच बसे इस ग्राम में बिजली कई-कई दिन बंद रहती है जिसके कारण भी लोगों को पानी नहीं मिल पाता। ग्राम के लोगों को ऐसी समस्याओं से आये दिन जूझना पड़ता है और जल सप्लाई बाधित होती रहती है।

10. नल कनेक्सन की वर्तमान स्थिति

सर्वेक्षण हेतु चयनित 35 ग्रामों में अभी भी 16 फीसदी परिवार नल कनेक्सन से वंचित हैं। जिसका प्रमुख कारण इन्हीं ग्रामों की कुछ बसाहटों में पाईप लाईन नहीं बिछाया जाना है। हांलांकि जेजेएम के अनुसार अधिकांश ग्रामों में 100 फीसदी घरों को नल कनेक्सन दिये जा चुके हैं जबकि समुदाय के अनुसार इन्हीं


ग्रामों में कई घर अभी भी नल के जल से वंचित है। कार्ययोजना के निर्माण के दौरान समुदाय ने उन बसाहटों को चिन्हित किया था जहां पाईप लाईन नहीं डाली गई जिससे उस बसाहट के सभी घर नल के जल से वंचित है। बिजवारा ग्राम के मानचित्र को देखा जा सकता है जहां स्पष्ट है कि छोटे के ग्राम जहां मात्र 33 घर है वहां के 08 घर पाईप नहीं डाले जाने के कारण नल के जल से वंचित है। ऐसे कई ग्राम/बसाहटें एवं परिवार है जो कि बिछाई गई पाईप लाईन से बहुत पास में निवास करते है इसके बाद भी उन घरों तक पाईप लाईन डालकर नल कनेक्सन नहीं दिये गये।

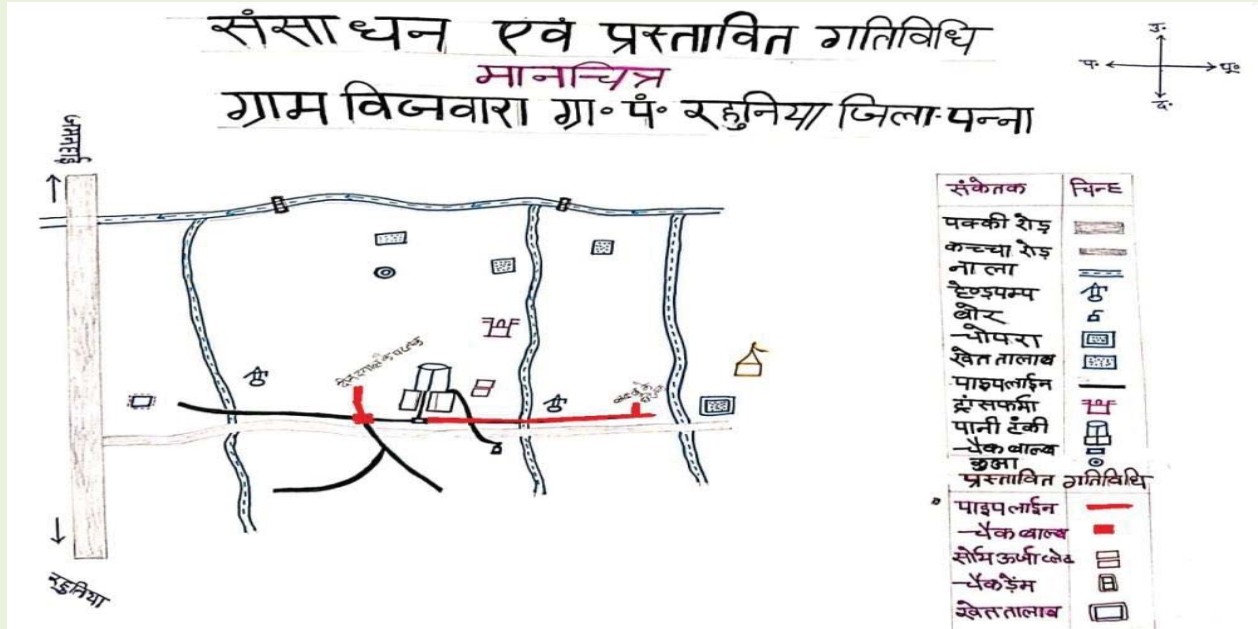

क्र	ग्राम	कार्ययोजना में दर्ज बसाहटें	कनेक्सन सं वंचित परिवार	नल कनेक्सन नहीं होने के प्रमुख कारण	पाईप लाईन से वंचित बसाहट के प्रथम एवं अंतिम घर की दूरी (मीटर में)
1	जमुनिहा	जमुनिहा	228	अभी पाईप लाईन बिछाने का काम शुरू हुआ है एक भी घर में कनेक्सन नहीं है और न ही स्रोत की स्पष्टता है।	पाईप डालने के काम की शुरूआत 6 माह पूर्व ही हुई है। अभी काम चल रहा है।
2	उमरी	उमरी	59	पाईप लाईन नहीं बिछाई गई जिससे घर नल कनेक्सन से वंचित है। अभी सप्लाय भी प्रारंभ नहीं हो सकी है।	संतराम लोधी के घर से पंचायत भवन तक 150 मी, पुष्पराज लोधी के घर से हेतराम के घर तक 60 मी, रामलखन के घर से मोतीलाल के घर तक 80 मी
		टिंगुलातरे	24	पाईप लाईन नहीं बिछाई गई जिससे घर नल कनेक्सन से वंचित है। अभी सप्लाय भी प्रारंभ नहीं हो सकी है।	जलिम गोड के घर से रामलाल लोधी के घर तक 300 मीटर। भैंसहाई मोड से राजाराम लोधी के घर तक

					150 मीटर
3	नैगुवां	नैगुवां	30	नल कनेक्सन के दौरान इन परिवारों के घरों में नल कनेक्सन नहीं हुये थे जो आज तक वंचित है।	कनेक्सन के दौरान ये परिवार पलायन पर थे जिससे ये घर कनेक्सन से वंचित रह गये हैं।
4	देवरी	भटिया सिद्धपुरा	51	इस बसाहट में अभी तक पाईप लाईन नहीं डाली गई जिससे सभी परिवार कनेक्सन से वंचित है।	गोरेलाल कोरी के घर से कल्लू आदिवासी के घर तक 1000 मी,
		मेन रोड	22	अभी तक इस बसाहट में पाईप लाईन नहीं बिछाई गई है।	ओव्हरहेड टैंक से गोरेलाल कोरी का घर 2000 मी
5	तारा	टपरियन	14	इस बसाहट के कुछ क्षेत्र में पाईप लाईन नहीं डाली गई है जिससे कई परिवार वंचित है।	कनेक्सनधारी घर से वंचित घरों की दूरी लगभग 100 मीटर से प्रारंभ हो जाती है।
		शंकरपुरा (नया टोला)	17	इस बसाहट में पाईप लाईन नहीं डाली गई जिससे सभी घर कनेक्सन से वंचित है।	ये पुरा शंकरपुरा बसाहट से लगभग 400 मीटर की दूरी पर बसा हुआ है।
6	इटवां तिल्हा	अहरी टोला	15	इस बसाहट में अभी तक पाईप लाईन नहीं डाली गई जिससे सभी परिवार कनेक्सन से वंचित है।	पहला घर गणेश विश्वकर्मा का 500 मी एवं अंतिम घर 900 मी है।
7	रमखिरिया	चमेलीपुरा	4	बसाहट में पाईप लाईन नहीं डाली गई जिससे परिवार नल कनेक्सन से वंचित है।	गांव में डाली गई अंतिम पाईप लाईन से 2500 मीटर दूर है।
		लखा मजरा	05	बसाहट के अंत तक पाईप लाईन नहीं है जिससे बसाहट के अंतिम के घर नल कनेक्सन से वंचित है।	बिछाई गई पाईप लाईन से मात्र 150 मीटर दूर है।
8	बिजवारा	बिजवारा धाम	08	इस बसाहट में अभी तक पाईप लाईन नहीं डाली गई जिससे सभी परिवार कनेक्सन से वंचित है।	कनेक्सनधारी घर से वंचित बसाहट का पहला घर 600 मीटर एवं अंतिम घर 800 मीटर। रामू के घर से दीनदयाल के घर तक 200 मीटर
9	गोविंदपुरा	गोविंदपुरा	09	पलायन पर थे जिससे इन्हें कनेक्सन नहीं दिये गये जबकि इन्हें कनेक्सन की जरूरत है। 01 घर मोतीलाल गोंड का 200 मीटर दूर है जिससे उन्हें कनेक्सन नहीं दिया गया।	नल कनेक्सन युक्त घर से मोतीलाल के घर तक 200 मीटर।
10	दिया	डाक्टर टोला	06	इस बसाहट में अभी तक पाईप लाईन नहीं डाली गई जिससे सभी परिवार कनेक्सन से वंचित	हाईस्कूल से डाक्टर टोला तक 500 मीटर

				है।	
11	मनोर	आदिवासी बस्ती	09	पाईप लाईन की कमी के कारण ये घर कनेक्सन से वंचित है।	कनेक्सनयुक्त घर से कनेक्सन से वंचित पहला घर 100 मीटर
12	कुल्हुआ	आदिवासी / हरिजन टोला	10	आदिवासी टोले में पाईप लाईन नही होने से आदिवासी परिवार कनेक्सन से वंचित है।	मंगोला आदिवासी के घर से चैता आदिवासी के घर तक 100 मीटर
13	अम्हाई	चमेली	02	पाईपलाइन नही बिछाई गई	लगभग 300 मीटर
14	सवाईगंज	सवाईगंज	05	पाईपलाइन नही बिछाई गई	लगभग 500 मीटर
15	पल्थरा	पल्थरा	04	पाईपलाइन नही बिछाई गई	एक जगह 300 एवं दूसरी जगह 400 फिट पाईप की जरूरत है।
16	बहेरा	बहेरा	03	पीएचई / ग्राम पंचायत कनेक्सन नही दे पा रहे है।	15 मीटर
17	गुखौर	बरुआ टोला	17	पाईप लाईन नही है	लगभग 1.5 किलोमीटर
		बगिया टोला	08	पाईप लाईन नही है	लगभग 1 किलोमीटर
		डेयरी रोड	04	पाईप लाईन नही है	लगभग 1 किलोमीटर
18	दुबहिया	रामगढी टो	10	पाईप लाईन नही है	200 मीटर दूर है बसाहट
19	ऊटन	ऊटन	47	पाईप लाईन नही है	100 मीटर दूर है बसाहट
20	जरधोवा	कलारन टो	03	कनेक्सन के समय घर से बाहर थे	

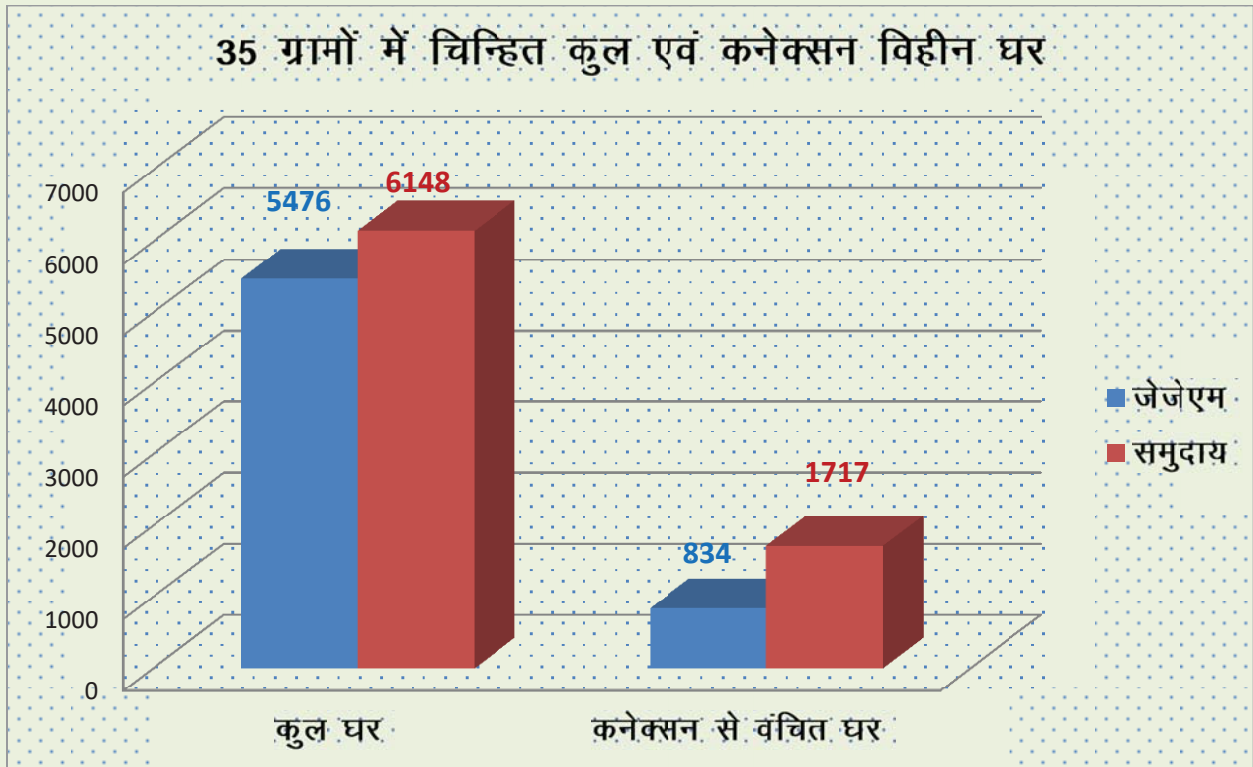


11. कनेक्सनधारी परिवारों में जल दबाव की स्थिति

समुदाय के अनुसार कुल कनेक्सनधारी परिवारों में से 4 फीसदी से ज्यादा घरों में काफी कम दबाव से पानी मिल रहा है जबकि 9 फीसदी से ज्यादा घरों में बिल्कुल भी पानी नहीं मिल रहा है। कुछ ग्रामों जैसे जरधोवा एवं मुराछ में पाईपलाईन चोक/जाम हो गई है जिससे पानी आंगे नहीं बढ़ पा रहा है। इन परिवारों में कम दबाव या सून्य दबाव से जल जाने के प्रमुख कारणों को निम्नप्रकार से समझा जा सकता है।

क्र	ग्राम के नाम	कम/सून्य जल दबाव वाले घर	जल दबाव कम होने के प्रमुख कारण
1	सुन्दरा	19	मढिया टोला 03 घर — पाईप लीकेज है जिससे नल कनेक्सनों में पानी या तो कम जाता है या बिल्कुल नहीं जाता। पटेल टोला 13 घर — पाईप लीकेज है जिससे नल कनेक्सनों में पानी या तो कम जाता है या बिल्कुल नहीं जाता।
2	रमखिरिया	09	रामकालानी 04 घर — वाल्व होने के बाद भी बंद नहीं किया जाता जिससे दूसरी लाईन के 04 घरों को पानी नहीं मिलता।
3	बिजवारा	05	दूसरी पाईप लाईन में वाल्व नहीं लगाया गया जिससे उपर के घर में पानी नहीं चढ़ता
4	मुटवा कला	35	यादव टोला में नल कनेक्सन पाईप जाम है। जबकि आदिवासी बस्ती उपर होने के कारण पानी नहीं मिलता। गांव की पाईप लाईन में गुमान सिंह के घर के पास वाल्व लगाने से स्थिति सुधर जायेगी।
5	गोविंदपुरा	15	एक वाल्व की जरूरत है। कुछ घर ऐसे भी हैं जहां के नल कनेक्सन में कचरा होने की संभावना है क्योंकि आसपास के घरों में पानी जाता है।
6	दिया	29	आदिवासी टोला 07 घर — टोले में बहुत पतला पाईप डाला गया है एवं पाईप में लीकेज है। ठाकुर टोला 01 घर — वाहन से कुचलने के कारण नल कनेक्सन पाईप दब गई है जिससे पानी काफी कम जाता है।
7	नैगुवां	50	ढाल है एवं सही स्थान पर वाल्व नहीं लगे हैं जिससे उपरी क्षेत्र में स्थित बोरवेल के चलने पर पूरा पानी निचले क्षेत्र में आ जाता है जिससे उपर के क्षेत्र में बसे लोगों को पानी नहीं मिलता।
8	तारा	17	तालगांव 09 घर — चढ़ाई पड़ने से पाईप में दबाव पड़ता है जिससे पाईप फट जाती है। दूसरी लाईन डालने पर स्थिति सुधर सकती है। आदिवासी टोला 02 घर —दूसरी पाईप डालने की जरूरत है। हरिजन बस्ती 06 घर — वाल्व की कमी है। प्रारंभ के घरों की टॉटी खुलने से अंतिम घर वंचित रह जाते हैं।
9	मनोर	24	गडरियन टोला 13 घर —यह बसाहट साहू टोले के ठीक बगल में है लेकिन इस बसाहट के लिये पाईप लाईन काफी दूर मनोर ढावा से घुमाकर डाली गई है। साहू टोले से सीधी पाईप डालने से स्थिति में सुधार होगा।

			आदिवासी टोला 07 घर —वाल्व नहीं बंद किया जाता।
10	डडबरिया	09	चौधरी टोला 03 घर —एक ही नल कनेक्सन पाईप से 03 घरों को नल कनेक्सन दिये गये है। लखनपुर 06 घर — वाहन निकलने से जल वितरण पाईप लाईन दब गई है जिससे पानी नहीं जा पाता है।
11	नुनाही	07	नुनाही 04 घर — डायरेक्ट सप्लाई है। ये घर उंचाई में बसे है जिससे इन परिवारों के घर में पानी कम जाता है।
12	इटवां तिल्हा	10	इटवां तिल्हा 07 घर — जल वितरण पाईप लाईन में लीकेज है जिससे जल दबाव कम बन पाता है। आदिवासी टोला 03 घर — ये तीनों कनेक्सनों में लीकेज है जिससे पानी नहीं जा पाता।
13	कुल्हुआ	11	खदरी टोला 11 घर — वाल्व की जरूरत है ताकि इस बसाहट को पानी मिल सके। काफी समय से वाल्व की मांग है।
14	देवरी	23	हरिजन टोला 23 घर — पाईप लीकेज है जिससे नल कनेक्सनों में जल दबाव काफी कम है। कुछ नल कनेक्सनों में भी लीकेज है। कुआं चौक 04 घर — पाईप लीकेज है जिससे नल कनेक्सनों में जल दबाव काफी कम है।
15	अमहाई	07	इन घरों की बसाहट के क्षेत्र में थोड़ी उंचाई है। वाल्व की जरूरत है। वाल्व लगने से स्थिति में सुधार होगा एवं बोरवेल के मोटर में पाईप लगाकर उसकी गहराई बढ़ाने की जरूरत है।
16	जरधोवा	70	नयापुरा — बोरवेल का मोटर जला है जिससे सप्लाई बंद है। बहेरिया — पाईप लाईन चोक/जाम है जिससे आंगे पानी बहुत कम जा रहा है। नरिया टोला — पाईप लाईन चोक/जाम है जिससे बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है।
17	सवाईगंज	05	मोटर काफी कम पानी दे रहा है। एवे इन घरों की बसाहट के आसपास अपेक्षाकृत थोड़ी उंचाई है। मोटर में सुधार करने से अगर मोटर अपेक्षाकृत ज्यादा ताकत से पानी देगा तो स्थिति सुधर जायेगी।
18	पल्थरा	06	वाल्व की जरूरत है। स्थिति में सुधार हेतु वाल्व लगाये गये थे लेकिन चैम्बर नहीं बनाने के कारण वे खराब हो चुके है।
19	दुबहिया	27	चेकवाल्व की आवश्यकता है। वाल्व लगाने में स्थिति में सुधार की संभावना है।
20	समाना	64	कई स्थानों पर पाईपलाईन में लीकेज है साथ ही कई घरों के नल कनेक्सन में लीकेज है जिससे जल व्यर्थ में बह जाता है। लीकेज में सुधार होने से स्थिति में बदलाव होगा।
21	मुराछ	70	कई स्थानों पर पाईपलाईन में लीकेज है साथ ही कई घरों के नल कनेक्सन में लीकेज है जिससे जल व्यर्थ में बह जाता है। लीकेज में सुधार होने से स्थिति में बदलाव होगा। कुछ जगह पाईप लाईन चोक/जाम की शिकायत है।
22	अकोला	27	पाईप लाईन में लीकेज है एवं वाल्व खराब है। इन दोनों के सुधार होने से स्थिति में सकारात्मक बदलाव होगा।
23	बहेरा	05	कचरा फसने से इन घरों के नल कनेक्सन चोक/जाम हो चुके है।


कनेक्सनधारी परिवारों में जल दबाव की स्थिति

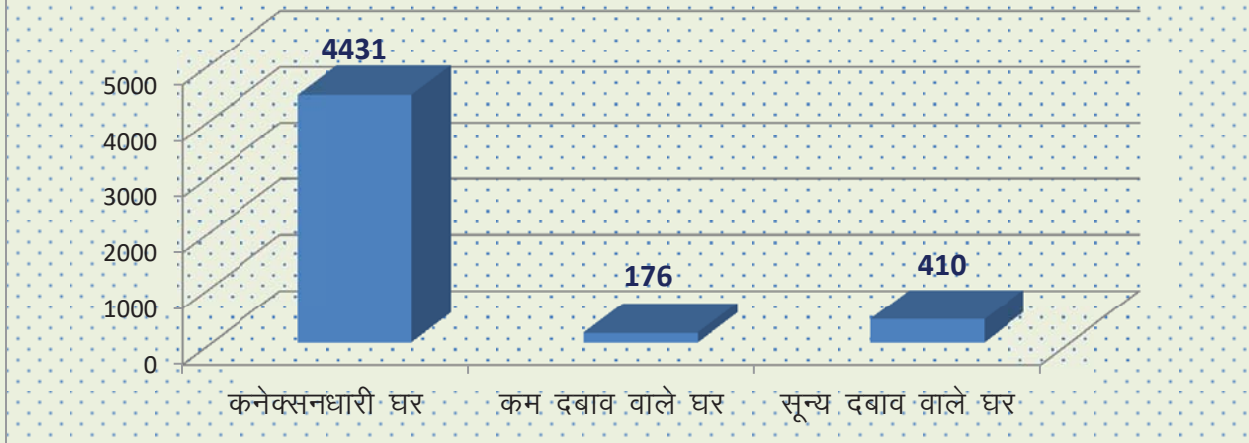

12. ग्राम स्तरीय संस्थाओं में नल कनेक्सन एवं जल सप्लाई की स्थिति

जेजेएम बेवसाइट के अनुसार 65 फीसदी स्कूल एवं 80 फीसदी आंगनवाड़ी केन्द्र नल कनेक्सन से वंचित है जबकि समुदाय के अनुसार 54 फीसदी स्कूल एवं 56 फीसदी आंगनवाड़ी केन्द्र नल कनेक्सन से वंचित है। जिन स्कूलों में नल कनेक्सन दिये गये है उनमें से 52 फीसदी स्कूलों में जल सप्लाई बंद है जबकि जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्सन दिये गये है उनमें से 58 फीसदी आंगनवाड़ी केन्द्रों में जल सप्लाई बंद है। जबकि जेजेएम के अनुसार कनेक्सनयुक्त सभी स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में जल सप्लाई चालू है। जेजेएम एवं समुदाय के अनुसार इन ग्रामों में स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या में अंतर है। दूसरी तरफ समुदाय अनुसार ज्यादा स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्सन है ये बात अलग है कि अधिकांश में सप्लाई बंद है।

35 ग्रामों की स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन की स्थिति

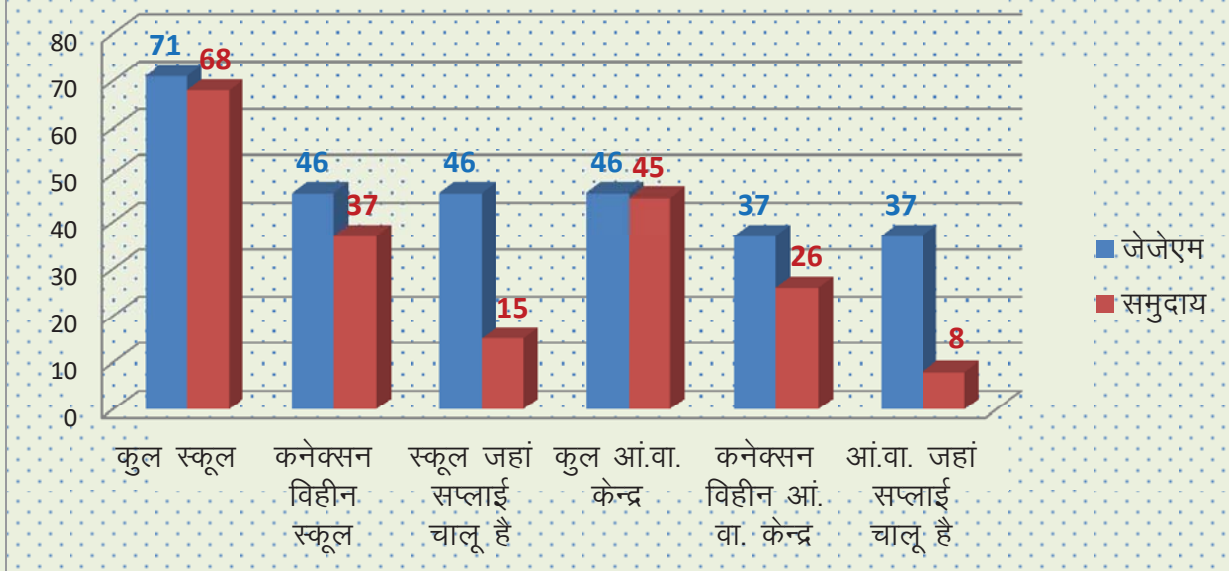

13. जल सप्लाई व्यवस्था की बेहतरी हेतु प्रमुख अनुशंसायें

जल जीवन मिशन बड़ी सोच के साथ जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत को आम नागरिकों तक पहुँचाने का बड़ा मिशन है। हर घर नल से शुद्ध, नियमित एवं पर्याप्त जल देना सरकार की बड़ी सोच है जिसके क्रियान्वयन का कार्य जारी है। जिन ग्रामों में जल सप्लाई प्रारंभ हो चुकी है वहां लोग खुस है। इन ग्रामों में वर्तमान में जो समस्यायें हैं उनमें से ऐसी कोई समस्यायें नहीं हैं जिन्हें ठीक नहीं किया जा सकता। जमीनी परिस्थितियों में सुधार एवं अनुभवों के आधार पर कुछ अनुशंसायें की जा रही हैं। इन अनुशंसाओं पर काम कर जल सप्लाई की आदर्श स्थितियां पैदा की जा सकती हैं।

सहभागी नियोजन

- किसी भी ग्राम में जल सप्लाई की व्यवस्था बनाने के पूर्व समुदाय के साथ मिलकर नियोजन करने की आवश्यकता है ताकि उस गांव की सभी बसाहटों एवं घरों की जानकारी स्पष्ट हो सके। ऐसा होने से पाईप लाईन बिछाने एवं हर घर को नल कनेक्सन देने की योजना बेहतर हो सकती है।
- तैयार सहभागी ग्राम कार्ययोजनाओं का ग्रामसभाओं से अनुमोदन लेने के दौरान सभी बसाहटों से लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की जरूरत है ताकि समुदाय के नजरिये से अंतिम जांच कर उसे अनुमोदित कराया जा सके।
- ग्राम पंचायतों की वार्षिक कार्ययोजना में जल संचयन की गतिविधियां, पौधरोपण, ग्रेजल प्रबंधन, छत जल प्रबंधन एवं पुरानी जल संरचनाओं के संरक्षण के कार्य अनिवार्य रूप से जोड़ने की जरूरत है।
- सहभागी रूप से तैयार की गई कार्ययोजनाओं का दीवार लेखन किया जाना चाहिये ताकि समुदाय द्वारा उसकी निगरानी बेहतर ढंग से की जा सके।

क्रियान्वयन

- सभी ग्रामों में दो स्रोतों के माध्यम से जल सप्लाई की व्यवस्था को अनिवार्य किया जाये। ऐसे में एक स्रोत में समस्या आने पर, मोटर आदि खराब होने पर जल सप्लाई को कुछ दिन तक अनवरत किया जा सकेगा, जब तक दूसरा स्रोत पुनः ठीक नहीं हो जाता।
- मांग के आधार पर ही नल कनेक्सन दिये जायें। कई परिवार ऐसे भी सामने आते हैं जिन्हें एक ही घर में कई नल कनेक्सन दिये गये हैं जिसका विरोध भी होता देखा गया है।
- हर नल कनेक्सन में उचित दबाव से पानी मिले इसके लिये सही स्थान पर वाल्व लगाने एवं पाईप लाईन बिछाने के तकनीकी पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- जिन ग्रामों में बहु ग्राम योजना से जल सप्लाई व्यवस्था बनाई जा रही है वहां ग्राम में मौजूद वैकल्पिक स्रोत को भी ओव्हरहेड टैंक से जोड़ा जाना चाहिये ताकि बहुग्राम योजना से पानी नहीं मिलने या पाईप लाईन में बाधा आने पर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जा सके।
- हैण्डओव्हर की प्रक्रिया को और जबावदेह बनाने की जरूरत है। कुछ लोगों की सहमति के आधार पर हैण्डओव्हर नहीं किया जाना चाहिये बल्कि 03 माह बेहतर संचालन के बाद सभी बसाहटों के लोगों को शामिल कर हैण्डओव्हर किया जाना आवश्यक है।

अनुश्रवण/निगरानी/गुणवत्ता

- कार्ययोजना में शामिल गतिविधियों के प्राथमिकता से क्रियान्वयन की निगरानी करने की आवश्यकता होगी।

- इतने कम समय में अधिकांश वाल्व, प्लास्टिक के ओव्हरहेड टैंकों का खराब होना, नल कनेक्सनों के ज्वाइंट से लीकेज होना, इस बात का सूचक है कि सामग्री एवं काम की गुणवत्ता पर कम जोर दिया गया है। आवश्यक है कि अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग कर टिकाऊ काम किया जाये।
- कई ग्रामों का पानी पहले से पेय योग्य नहीं है, कुछ ग्राम ऐसे भी हैं जहां का जल स्तर काफी नीचे है जिससे सप्लाई बंद हो चुकी है। ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर बहुग्राम योजना में शामिल करना होगा।
- जिन ग्रामों में जल सप्लाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है वहां की कुछ बसाहटों में या कुछ घरों तक पाईप लाईन नहीं बिछाई गई है जिससे वे नल कनेक्सन से वंचित हैं। ऐसे ग्रामों को चिन्हित कर हर घर तक कनेक्सन देने की व्यवस्था बनाने की जरूरत है।
- उचित स्थान पर वाल्व नहीं होने से कुछ घरों में जल दबाव नहीं है। नवीन वाल्व लगाकर तथा खराब वाल्वों में सुधार कर जल सप्लाई व्यवस्था को उचित दबाव से अनवरत किये जाने की आवश्यकता है।
- अधिकांश ग्रामों में नल कनेक्सन घरों के बाहर एवं घरों से दूर दे दिये गये हैं। जल जीवन मिशन की भावना के अनुसार ऐसे नल कनेक्सनों को घर के अंदर किये जाने की जरूरत है। ताकि लोग नलों में टॉटी लगा सके। बाहर नल कनेक्सन होने से टॉटियों की चोरी होती है एवं कई बार टॉटियों को तोड़कर नुकसान पहुँचाया जा रहा है।

मरम्मत एवं संचालन

- बसाहटों के अनुसार जल सप्लाई के समय को समुदाय की सहमति के आधार पर तय करने की आवश्यकता है। किस बसाहट में किस समय पानी दिया जायेगा, इसे सहमति से तय कर दीवार लेखन करने की आवश्यकता है। उपर के क्षेत्र में बसी बसाहटों को टंकी पूरी भरी होने पर पहले सप्लाई की जाये ताकि दूर की बसाहटों या अपेक्षाकृत उपरी सतह पर बसी बसाहटों को पानी मिल सके।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी भूमिकाओं को निभाने सक्षम हों। समितियों में ऐसे भी सदस्य हैं जिनके पास समय नहीं है या तो उनकी रूचि नहीं है ऐसी स्थिति में समितियों को पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है।
- ग्राम पंचायतों को अधिक जबावदेह बनाने की आवश्यकता है ताकि जल सप्लाई से जुड़ी समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु आगे आये एवं जिम्मेवारी लें।
- बनाई गई जल सप्लाई व्यवस्था के त्वरित मरम्मत की ठोस एवं परिणामदायी व्यवस्था बनाने की जरूरत है। बेहतर होगा कि कुछ पंचायतों के क्लस्टर बनाकर प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार किया जाये। मरम्मत हेतु तकनीकी रूप से प्रशिक्षित ऐसे व्यक्तियों के पास सभी आवश्यक यंत्र उपलब्ध कराने होंगे। ऐसे संसाधन व्यक्तियों की संख्या कम से कम एक क्लस्टर में दो होगी तो बेहतर होगा। संसाधन व्यक्तियों के संपर्क नम्बर ग्राम की समितियों के साथ एवं दीवार लेखन कर समुदाय के साथ साझा करना होगा।
- ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों के स्वतंत्र खाते खोले जाने की आवश्यकता है ताकि समितियां जल कर से प्राप्त राशि का स्वयं से प्रबंधन करने में सक्षम हों। जल सप्लाई व्यवस्था के बाधित होने एवं उसके सुधार में बड़े खर्चे होने की स्थिति में ग्राम पंचायतों को 15वे वित्त आयोग की बाढ़ राशि से त्वरित मदद कर सुधार कार्य कराये जाने की पैरवी करनी होगी।

- समस्या निवारण की ऐसी व्यवस्था बनाने की जरूरत है जिसमें कोई भी व्यक्ति जल सप्लाई से जुड़ी समस्या को लिखित में अवगत करा सके। लोगों के द्वारा दर्ज ऐसी समस्याएँ जिले एवं क्लस्टर स्तर के संसाधन व्यक्ति के साथ ग्राम पंचायत तक एक साथ देखी जा सके। ऐसी दर्ज शिकायतों को 24 घंटे में निराकरण करने एवं समस्या के निराकरण की सतत निगरानी करने की आवश्यकता है।

स्वयं सेवी संस्थाओं की भागीदारी का बढ़ाना

- समुदाय के नजरिये से उपयोगी ग्राम कार्ययोजना के निर्माण, हितभागियों की क्षमतावृद्धि, जलस्तर बढ़ाने हेतु समुदाय अनुसार आवश्यक गतिविधियों को जीपीडीपी/मनरेगा की कार्ययोजनाओं में स्थान दिलाने, निगरानी/अनुश्रवण एवं समय-समय पर सामाजिक अंकेक्षण/ कार्ययोजना की प्रगति के आंकलन के कार्य में के.आर.ए. के अतिरिक्त जमीनी स्तर पर काम कर रही स्वयं सेवी संस्थाओं को शामिल कर उन्हें इस पवित्र काम में भागीदार बनाया जाना उचित होगा।

संलग्नक

हर घर नल से शुद्ध, नियमित एवं पर्याप्त जल के क्रियान्वयन का सामाजिक अंकेक्षण

1- समुदाय/ग्रामसभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण में सामने आये तथ्य

क्र	ग्राम का नाम	जेजेएम अनुसार बसाहटें	व्ही.ए.पी. अनुसार बसाहटें	एमआईएस अनुसार स्थिति				समुदाय अनुसार स्थिति				एमआईएस अनुसार-संस्थानों की स्थिति				समुदाय अनुसार संस्थानों की स्थिति						
				स्वीकृत राशि लाख में	खर्च राशि लाख में	स्थिति पूर्ण/अपूर्ण	कुल घर	कनेक्सन विहीन घर (प्रारंभ में)	कनेक्सन विहीन घर (अब)	कनेक्सन विहीन घर	कुल घर	कनेक्सन विहीन घर	कुल घर	कनेक्सन विहीन घर	कुल घर	कनेक्सन विहीन घर	कुल घर	कनेक्सन विहीन घर	कुल घर	कनेक्सन विहीन घर		
1	सुन्दरा	सुन्दरा	मंदिर टोला	61.42/	48.24/	प्रगतिरत	200	0	5	0	0	0	4	1	1	0	0	0	0			
			मढिया टो	0.94	0.16	/			25	2	1	0	3				0	0	0	0		
			मुशिलम			प्रगतिरत			4	1	1	0	0				2	0	0	0	0	
			आदिवासी						24	0	0	0	0				0	0	0	0	0	
			कोरियाना				13	0	17	1	1	2	0				0	0	0	0	0	
			पटेल						17	12	4	4	9				2	1	1	1	0	1
			दहायत						30	4	0	0	1				0	0	0	0	0	0
			बीच चौधरी						27	2	2	0	0				0	0	0	0	0	0
			चौधरी						13	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0

2	रमखिरिया	रमखिरिया	देवनटोला	117.42	94.54/	प्रगतिरत / प्रगतिरत	55	0	28	28	3	0	0	6	1	4	1	1	0	1	1	1	0	0			
			राजापुर	/128.5	76.73		55	27	7	7	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	
			चमेलीपुरवा	6			4	0	4	4	4	0	0														
			रामतलैया				45	0	85	14	0	5															
			रामकालोनी				32	0	49	7	0	4															
			लखा मजरा				19	0	7	7	5	0	0														
			लखा टोला						8	8	2	0	0														
			पडितान टोला				19	15	44	44	3	0	0														
			मिश्रा टोला						9	9	0	0	0														
			गटरूपुर																								
3	बिजवारा	बिजवारा	बिजवारा	12.38/	8.52/0.	पूर्ण/ प्रगतिरत	24	0	33	8	8	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				0.94	16																						
4	मुटवाकला	मुटवाकला	यादव	79.20/	58.50/	प्रगतिरत / प्रगतिरत	235	0	91	20	2	6	4	2	2	3	3	0	0	0	0	0	0	0			
			गंगोरिया	0.94	0.16																						
			आदिवासी																								
			पीपल टोला																								
			हरिजन				31	0	40	40	9	0	0														
5	गोविंदपुरा	गोविंदपुरा	गोविंदपुरा				61	0	131	28	9	5	10														
6	दिया	दिया	ठाकुर टोला	97.22/	57.68/	प्रगतिरत / प्रगतिरत	150	0	14	11	3	1	4	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0			
			बढई टोला	128.56	75.53																						
			कुम्हारन टोला																								
			मिश्रा टोला																								
			हरिजन टोला																								
			चौबे टोला																								
			चौहान टोला																								
			जाक्टर टोला																								
			आदिवासी बस्ती				18	0	36	21	2	0	7														
			ललईया				51	0	78	26	3	0	0														

7	नैगुवा	नैगुवा	नैगुवां	22.81/ 0.94	4.58/ 0.18	प्रगतिरत / प्रगतिर त	80	0	104	30	30	15	35	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	मनोर	मनोर	यादव	98.71/ 0.94	74.39/ 0.092	प्रगतिरत	135	0	71	4	4	4	0	4	3	1	1	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0
			गडरियन					13	0	13	0	0	0	13							0	0	0	0	0	0	0
			आदिवासी					145	0	136	9	9	0	7							1	1	0	1	1	0	0
			साहू, मोहल्ला					26	0	12	1	1	0	0							0	0	0	0	0	0	0
9	तारा	तारा	वंशकार टोला	148.66 /0.94	78.78/ 0.16	प्रगतिरत / प्रगतिरत	269	0	11	3	3	0	0	4	4	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
			बस स्टेण्ड							16	1	1	0	0							0	0	0	0	0	0	0
			बजरंग टोला							7	5	2	0	0							0	0	0	0	0	0	0
			कालका टोला							22	9	2	0	0							0	0	0	0	0	0	0
			कुशवाहा टोला							62	15	5	0	0							0	0	0	0	0	0	0
			बिधुआ टोला							40	7	2	0	0							0	0	0	0	0	0	0
			शर्मा टोला							8	0	0	0	0							0	0	0	0	0	0	0
			तालागांव टोला							23	17	0	0	9							0	0	0	0	0	0	0
			आदिवासी टोला							17	16	3	0	2							0	0	0	0	0	0	0
			गर्ग टोला							27	5	2	0	0							0	0	0	0	0	0	0
			हरिजन बस्ती							20	0	82	20	3	3						0	0	0	0	0	0	0
10	डडबरिया	डडवरिया	टपरियन	63.80/ 0.94/7	31.85/ 0.16/0	प्रगतिरत /	165	0	20	6	2	0	0	1	1	2	2	2	2	2	1	0	1	1	0	0	
			शंकरपुरा					5	0	36	14	14	0	0						1	1	0	0	0	0	0	
			नया मोहल्ला					30	0	38	3	3	0	0						1	1	0	1	1	0	0	
			बाबूपुर					17	17	17	0	0						0	0	0	0	0	0	0			
			कुपरहा टोला					15	14	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0			

34	अकोला	अकोला	अकोला	15.37/ 137.67 /1167 63	8.03/6 9.41/2 2195.7 8	प्रगतिरत / प्रगतिर त/ प्रगि तरत	38	0	41	3	3	0	27	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0
35	पाठा	पाठा	पाठा	11676 3	22195. 78	प्रगतिरत	100	86	50	50	50	NA	NA	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0
		नया टोला	नया टोला						18	18	18	NA	NA					0	0	0	0	0	0

2- समुदाय/ग्रामसभा द्वारा चिन्हित प्रमुख समस्यायें

क्र	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत	उजेएम अनुसार टोले	जल सप्लाई स्थिति	सप्लाई का प्रकार	समुदाय/ग्रामसभा द्वारा चिन्हित जल सप्लाई से जुड़ी प्रमुख समस्यायें
1	सुन्दरा	सुन्दरा	सुन्दरा	चालू	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सप्प	<ul style="list-style-type: none"> पीने योग्य पानी नहीं है। खारा पानी सप्लाई होता है। ओव्हरहेड टैंक के पास लगे तीनों वाल्वों में चैम्बर बनाने एवं ताला लगाने की जरूरत है। लोग वाल्व खोल देते हैं जिससे टंकी का पानी बह जाता है। पाईप लाईन में लीकेज है- राइजिंग पाईप एवं वुंदा चौधरी के घर के सामने, नत्थू प्रजापति के घर के पास, जगराम पटेल के घर के पास वाहन निकलने से पाईप फट गई है। बिजली बहुत ज्यादा बंद हो रही है जिससे ओव्हरहेड टैंक नहीं भर पाता। कई घरों को पानी नहीं मिलता। पाईप लाईन नहीं- अहरी टोला में पाईप लाईन नहीं है जिससे 04 घर जल सप्लाई से वंचित है। आदिवासी टोले में भी पाईप लाईन डालने की जरूरत है। वाल्व की जरूरत है- बब्लू प्रजापति के घर के पास मातारानी वाली पाईप लाईन एवं एवं पंचायत वाली पाईप लाईन में।
2	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	सुन्दरा	चालू	उपरोक्तानुसार	<ul style="list-style-type: none"> संप की एक पनडुब्बी 01 वर्ष से खराब है। पुराने बोर का मोटर 02 वर्ष से खराब है।

					<ul style="list-style-type: none"> ● आदिवासी बस्ती में 90 फीसदी घरों में टॉटी नहीं है। ● गांव में 7 से 8 परिवार मोटर चलाकर छतों में पानी चढ़ाते हैं। ● 03 जगह पाईप लीकेज है- मुरारी आदिवासी के घर के सामने, सिया आदिवासी के घर के सामने, अयोध्या विश्वकर्मा के घर के सामने लीकेज है। ● नवीन वाल्व की जरूरत है- ओमप्रकाश द्विवेदी के घर के आसपास ताकि सभी को पानी मिल सके। ● नवीन पाईप लाईन की जरूरत- बूंदीलाल कुशवाहा के घर से दशरथ विश्वकर्मा के घर तक ● नवीन पाईप लाईन की जरूरत- पुष्पेन्द्र परिहार के घर से सड़क के उस पार बसे परिवारों के घर तक ● 	
3	बिजवारा	रहुनिया	बिजवारा	चालू	प्लास्टिक का ओव्हरहेड टैंक	<ul style="list-style-type: none"> ● 08 घर कनेक्सन विहीन है। जिन्हें पेयजल की काफी दिक्कत है। ● 04 घरों में बहुत कम पानी जाता है। वाल्व लगाने की आवश्यकता है। ● बिजली का बोल्टेज काफी कमजोर होने से मोटर की तार बार-बार जल जाती है। नवीन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है।
4	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवा	चालू	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सम्प	<ul style="list-style-type: none"> ● चेकवाल्व खराब- गणेश यादव के घर के पास ● वाल्व खराब होने के कारण 22 घरों को बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। ● नवीन वाल्व की जरूरत- गुमानसिंह यादव के घर के पास ताकि आदिवासी बस्ती के लोगों को पानी मिलने लगे। ● आदिवासी टोले में पाईप लीकेज है।
			नई बस्ती		उपरोक्तानुसार	<ul style="list-style-type: none"> ● 05 जगह पाईप लीकेज- भरतसिंह यादव के घर के पास पाईप लाईन लीकेज, स्कूल बाउन्ड्री के पास पाईप लीकेज, रामकिशोर चौधरी के घर के पास पाईप लीकेज, दरयावसिंह के घर के पास पाईप लीकेज, अन्बूबाई यादव के घर के पास पाईप लीकेज है। ● स्कूल के बोर का मोटर 20 दिन से खराब है। ● वाल्व खराब- धनीराम चौधरी के घर के पास वाल्व खराब है, टूट चुका है। ● सम्प की पनडुब्बी का स्टार्टर खराब है।
5	गोविंदपुरा	गोविंदपुरा	गोविंदपुरा	चालू	डायरेक्ट बोर से	<ul style="list-style-type: none"> ● बड़ा गांव है। 131 परिवार है इसके बाद भी डायरेक्ट बोर से सप्लाई दी गई है। ● 80 फीसदी नल कनेक्सन घर के बाहर दिये गये है। जिससे टॉटी की चोरी होती है इसलिये

8	जमुनिहा	दिया	जमुनिहा	बंद/ अप्रारंभ	अभी कुछ नहीं	<p>में बह जाता है उपर के क्षेत्र में बसे लोगों को पानी नहीं मिलता।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● मनीष पाण्डेय के घर के ज्योतिप्रकाश द्विवेदी के घर तक पाईप लाईन डालनी शेष है। ● कोदूलाल लोधी के घर से संतराम लोधी के घर तक पाईपलाईन शेष है। ● तेजीलाल गुप्ता के घर से शुशील पाण्डेय के घर तक पाईप लाईन शेष है। ● कुछ गलियों में पाईप लाईनें डाली गई है लेकिन 08 माह से काम बंद है। डाली गई या रखी पाईपें खराब हो रही है।
9	मनौर	मनौर	मनौर	बंद	डायरैक्ट बोर से	<ul style="list-style-type: none"> ● यादव टोला में जल सप्लाई का पानी नहीं पहुँचता जिसके कारण नया बोर कर कर इस बसाहट में डायरैक्ट बोर से सप्लाई बनाई जा रही है। लेकिन अभी सप्लाई प्रारंभ नहीं की गई है। ● बड़ा लीकेज है जिससे आधी टंकी का पानी सड़क में बह जाता है। कनेक्सनधारियों को पानी नहीं मिल पाता। ● 05 जगह लीकेज— नत्थू यादव के घर के पास, एवं मूरत सिंह यादव के घर के पास ● नलों से आने वाले पानी के साथ कचड़ा आता है। ● 13 घरों के नल कनेक्सन टूट चुके हैं जिससे सप्लाई बंद है। ● 37 नल कनेक्सनों में पानी नहीं आ रहा है। ● रामावतार के घर के पास लगा चैम्बर बंद करने की जरूरत है ताकि उपर क्षेत्र में बसे परिवारों को पानी मिल सके। पूरा पानी नीचे की क्षेत्र में बहता है जिससे उपर क्षेत्र के लोगो को पानी काफी कम मिलता है।
			नयापुरा		सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सम्प	<ul style="list-style-type: none"> ● 76 घरों में स्टैंडपोस्ट नहीं बनाये गये है। ● 07 घरों में नल कनेक्सन नहीं है। ● जलसा बाई के घर के पास बने चैम्बर में ढक्कन नहीं है। ● स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन नहीं है। ● रामस्वरूप साहू के घर से रामगोपाल साहू के घर तक पाईप लाईन नहीं है। ● 01 घर में नल कनेक्सन नहीं है।
			साहू टोला		उपरोक्तानुसार	
10	तारा	तारा	तारा	चालू	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सम्प	<ul style="list-style-type: none"> ● तालगांव टोले के 09 घरों में बिल्कुल पानी नहीं जा रहा है। ● इसीप्रकार आदिवासी टोले के 02 घरों में पानी नहीं जा रहा है।
			हरिजन बस्ती	चालू	उपरोक्तानुसार	<ul style="list-style-type: none"> ● हरिजन बस्ती के 03 घरों में पानी नहीं जा रहा है।

			शंकरपुरा	चालू	डायरेक्ट बोर से	<ul style="list-style-type: none"> ● 03 घरों में नल कनेक्सन नहीं है। ● प्राथमिक स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन नहीं है। ● नया मोहल्ला में पाईप लाईन नहीं डाली गई जिससे 17 घर नल कनेक्सन से वंचित है। ● 14 घर नल कनेक्सन से वंचित है। ● प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन नहीं है।
11	बंगला	भटहरमेघा	बंगला	चालू	प्लास्टिक टैंक एवं आधे में डायरेक्ट बोर से	<ul style="list-style-type: none"> ● टंकी निर्माण स्थल के पास जल वितरण पाईप लाईन में लीकेज है। ● अवध राज के घर के पास नल कनेक्सन में लीकेज है। ● 23 स्टेण्डपोस्ट टूट चुके हैं एवं उनका नल कनेक्सन पाईप लाईन नीचे से कटा हुआ है। जिससे लीकेज होता है।
12	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	चालू	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सम्प	<ul style="list-style-type: none"> ● पानी पीने योग्य नहीं है पूरा गांव पीने का पानी कई किलोमीटर दूर से लाता है। ● तीन जगह लीकेज है- सोनेलाल साहू के घर के पास, मीरा साहू के घर के पास एवं पुराने बोर आम के पौधे के पास ● वाल्व खराब है- राम जानकी मंदिर के पास लगे बाल्व की चूड़िया खत्म हो चुकी है जिससे वह काम नहीं करता। ● वाल्व खराब है- लखनपुर लाईन वाला वाल्व 04 माह से खराब है। ● वाल्व खराब है- पुराने बोर के पास वाला वाल्व ● मोटर जला- सम्प के अंदर डाला गया एक मोटर खराब है जिससे टंकी भरने में काफी समय लगता है। ● नया बोर का मोटर खराब है- मोटर जलने के बाद उसकी मरम्मत हुई तब से मोटर पहले से एक-चौथाई पानी दे रहा है। ● बाबूपूर के दो घरों के कनेक्सन में लीकेज है। ● बेडियाना टोले के 20 घरों में नल कनेक्सन पाईप स्टेण्डपोस्ट से अलग कर दी गई है। ● 05 घरों में केवल दो नल कनेक्सन पाईपों से कनेक्सन कर दिया गया है जिससे पानी नहीं जाता। ● प्राथमिक स्कूल का नल कनेक्सन टूट चुका है।
13	नुनाही	गोल्ही पाठक	नुनाही	चालू	डायरेक्ट बोर से	<ul style="list-style-type: none"> ● पानी खराब- एक बोर का पानी पीने योग्य नहीं है। दूसरे बोर से पूरे गांव में सप्लाई कर लोगों को शुद्ध पानी दिया जा सकता है। वर्तमान में दूसरे बोर का पानी लगभग आधे गांव

					में ही मिलता है।	<ul style="list-style-type: none"> ● 03 पाईप लीकेज— बब्लू बिल्थारिया के घर के सामने, मन्तूलाल वर्मा के घर के पास, अनिल सेन के घर के सामने ● 04 कनेक्शनों में लीकेज—बखतिया दहायत, राजमन दहायत एवं मन्तूलाल वर्मा के घर के पास, सिमरी मोड पर नल कनेक्शनों में लीकेज है। ● 06 माह से ररियन टोला में सप्लाई बंद— पाईपलाईन काट दी गई है जिससे ररियन टोला में जल सप्लाई बंद है। ● वाल्व खराब— दोनों बोरेल के पास लगे चैम्बरों के लाक खराब है। ● दोनों बोरेलों की पाईप लाईन ● बड़ा गांव होने के बाद भी डायरेक्ट बोरे से सप्लाई है। ● सभी नल कनेक्शन घर के बाहर दिये गये हैं। ● 6 माह से मोटर जली है, जल सप्लाई बंद है लोगों को पेयजल की काफी दिक्कतें हैं। ● 06 जगह कनेक्शनों में लीकेज —दरवारी लाल यादव के घर के सामने, जगदीश यादव के घर के सामने, राजू महाराज के घर के सामने, लोकेन्द्र के घर के सामने, तीरथ पटेल के घर के सामने, बालकृष्ण प्रजापति के घर के सामने ● पाईप में लीकेज— स्कूल के पास वाल्व लीकेज, बरम बाबा टोले में नाले के पास ● वाल्व की जरूरत— स्कूल के पास खदरी टोले की लाईन में ● पाईप लाईन की जरूरत— मंगोला आदिवासी के घर से चैता आदिवासी के घर तक ● मुख्य पाईप लाईन नहीं डाली गई। ● कई बसाहटों में काफी कम दबाव से पानी जाता है। ● वाल्व खराब है एवं कई स्थानों पर वाल्व लगाने की जरूरत है। ● 07 जगह लीकेज है—अशोक नामदेव के घर के पास, कौशल सोनी के घर के पास, पाठक महाराज के घर के पास, श्यामसुन्दर के घर के पास, अनिल सोनी के घर के पास, कुन्ती प्रजापति के घर के पास, गोविंद राजपूत के घर के पास एवं ज्ञान सिंह के घर के सामने ● भठिया टोला में पाईप लाईन नहीं डाली गई है। ● बस्ती में काफी कम दबाव से पानी मिलता है। ● स्टैण्ड के पास पाईप लाईन लीकेज है।
14	कुल्हुआ	रनवाहा	कुल्हुआ	बंद, 6 माह से	डायरेक्ट बोरे से	
15	देवरी	देवरी	देवरी	बंद	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सम्प	
			हरिजन बस्ती	बंद	उपरोक्तानुसार	
			अगोलापुरा	बंद	उपरोक्तानुसार	

16	उमरी	उमरी	उमरी	अप्रारंभ	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सम्प	<ul style="list-style-type: none"> पनी सप्लाई अभी तक प्रारंभ नहीं हुई है। संप निर्माण का काम अभी भी अधूरा है। 07 जगह वाल्व नहीं लगाये गये है। भैसहाई मोड से राजाराम लोधी के घर तक पाईप लाईन नहीं डाली गई। रामलखन के घर से मोतीलाल के घर तक पाईपलाईन नहीं डाली गई। संतराम लोधी के घर से चिन्तामणि लोधी के घर तक पाईन लाईन नहीं है। अमृतलाल गुप्ता के घर से बैजनाथ लोधी के घर तक पाईप नहीं है। बाला लोधी के घर से हेतराम लोधी के घर तक पाईप नहीं है। अयोध्या प्रसाद गौतम के घर से बहादुर सिंह के घर तक पाईप नहीं है। जालिम गोंड के घर से रामलाल लोधी के घर से पाईप नहीं है। अधिकांश घर अभी भी नल कनेक्सन से वंचित है। घर के बाहर नल कनेक्सन दिये जा रहे है जो उचित नहीं है। सरकार की मंशा के विपरीत है।
17	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	चालू	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सम्प	<ul style="list-style-type: none"> पानी सप्लाई का समय निश्चित करने की जरूरत है ताकि हर टोले के लोगों को पता हो दिन में कितने बजे पानी सप्लाई होगी। ओव्हरहेड टैंक के पास लीकेज है। ओव्हरहेड टैंक के पास देवन टोला में वाल्व की जरूरत है। राममूरत मिश्रा के घर के पास वाल्व में लीकेज है। ओव्हरहेड टैंक के पास राजा मोड में वाल्व की जरूरत है। 07 घरों को पानी नहीं मिलता है। इस टोले में लगे वाल्व को कुछ समय के लिये बंद करने की जरूरत है ताकि इन 07 घरों तक पानी पहुँच जाये। सप्ताह में दो से तीन दिन पानी नहीं मिलता है। रामशरण मिश्रा के घर के पास पाईप लाईन में लीकेज है। स्कूल के पास वाल्व की जरूरत है। रमतलैया से चमेली पुरवा के लिये नवीन पाईप लाईन डालने की जरूरत है। अभी तक ग्राम में किसी भी घर को नल कनेक्सन नहीं दिये गये और न ही कहीं पाईप
18	कोढनपुरवा	रानीगंज	कोढनपुरवा	अप्रारंभ		

19	अम्हाई	पुरवा	लक्ष्मीपुर	अम्हाई	चालू	प्लास्टिक टैंक	लाईन बिछाई गई है। <ul style="list-style-type: none"> अम्हाई के 07 घर अपेक्षाकृत उंचाई में होने के कारण इन्हें पानी नहीं मिल रहा है। वाल्व की आवश्यकता है। वाल्व लगने से पानी मिलने लगेगा। स्कूल के नल कनेक्सन में सुधार की आवश्यकता है। सुधार हा जाने से पानी मिलने लगेगा। बोरवेल में पानी कम है। मोटर पंप को पाईप बढ़ाकर और अधिक गहराई में डालने की आवश्यकता है। लीकेज— सुनीता सिंह, दीपू, प्रतिपाल सिंह के घर के पास लीकेज है। गोपाल सिंह के घर के पास एक वाल्व की जरूरत है। लीकेज— लखन सिंह के घर के पास, हनाम सिंह के घर के पास पाईप लाईन में लीकेज है। पाईप विस्तार की जरूरत— तुलसीदास के घर से संजू के घर तक नल कनेक्सनों में लीकेज— 03 नल कनेक्सनों में लीकेज है। अभी पाईप बिछाने का कार्य किया जा रहा है। कार्य काफी मंद गति से चल रहा है। अभी सप्लाई चालू नहीं हो सकी है। पाईप लीकेज— मलखान सिंह यादव के घर के पास एक मोटर खराब— पिछले 06 माह से एक बोरवेल का मोटर खराब है। वाल्व लीकेज— ओव्हरहेड टैंक के पास वाल्व में लीकेज है। मोटर की मरम्मत होने के बाद काफी कम पानी दे रहा है जिससे ओव्हरहेड टैंक भरने में काफी समय लगता है। टंकी भरने में समय ज्यादा लगने से मोटर बार-बार जल/खराब हो रहा है। दो चेकवाल्व लगाये गये थे लेकिन वे खराब है। जिससे 7 घरों को पानी बहुत कम या न के बराबर मिल रहा है। 06 घरों के कनेक्सन में दिक्कतें है, पानी काफी कम जाता है कुछ में बिल्कुल नहीं जाता। नल कनेक्सनों को ठीक करने की जरूरत है। स्टार्टर एवं वायरिंग को दुरुस्त करने की जरूरत है। वायरिंग ठीक नहीं होने से बार-बार सप्लाई बंद होती है। 05 घर नल कनेक्सन से वंचित है। पाईप विस्तार कर नल कनेक्सन देने की आवश्यकता है। लीकेज— कित्ताबाई आदिवासी के घर के पास, महेश यादव के घर के पास, यादव टोला में
20	सवाईगंज	रंजोरपुरवा	सवाईगंज	सवाईगंज	चालू	डायरेक्ट बोर से	
21	गुडहा	रहुनिया	गुडहा	गुडहा	अप्रारंभ	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक	
22	रानीगंज पुरवा	रानीगंज पुरवा	रानीगंज पुरवा	रानीगंज पुरवा	चालू	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं संप	
23	पल्थरा	रहुनिया	पल्थरा	पल्थरा	चालू	प्लास्टिक टैंक	
24	बहेरा	जनवार	बहेरा	बहेरा	चालू	डायरेक्ट	

					<p>इंड कैप के पास पाईप लाईन में लीकेज है।</p> <ul style="list-style-type: none"> ● प्राथमिक स्कूल का मोटर खराब है। ● बोरेवेल में पानी कम है। मोटर पंप में पाईप बढ़ाकर गहराई बढ़ाने की जरूरत है। ● 04 घर नल कनेक्सन से वंचित है। ● वाल्व की जरूरत- प्रहलाद सिंह के घर के पास वाल्व की जरूरत है। ● कई माह से काम बंद है। ओव्हरहेड टैंक का निर्माण कार्य शुरू हुआ, प्लिंथ स्तर तक काम हुआ इसके बाद पिछले 03 माह से कोई काम नहीं किया गया है। ● गांव के लोगों के पास पेयजल के साधन बहुत कम है। काफी समस्याओं से जुझ रही है आम जनता। 	
25	रतगवां	गुखौर	रतगवां	अप्रारंभ	ओव्हरहेड टैंक	<ul style="list-style-type: none"> ● सप्लाई व्यवस्था बनाने का काम काफी मंद गति से है। पिछले 03 वर्षों पूर्व प्रारंभ हुआ कार्य आज तक पूरा नहीं किया जा सका है। ● 04 माह से कोई कार्य नहीं किया गया। ● नाली से पाईपलाईन डाली गई है। ● ट्रांसफार्मर से स्टार्टर तक बिजली सप्लाई नहीं जोड़ी गई है जिससे सप्लाई अभी तक अभी तक अप्रारंभ की स्थिति में है।
26	गुखौर	गुखौर	गुखौर	अप्रारंभ	ओव्हरहेड टैंक एवं संप	<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम में अभी तक नल कनेक्सन देने के लिये किसी भी प्रकार का काम प्रारंभ नहीं किया गया है। ● बसाहट में अभी तक नल कनेक्सन देने के लिये किसी भी प्रकार का काम प्रारंभ नहीं किया गया है। ● बसाहट में अभी तक नल कनेक्सन देने के लिये किसी भी प्रकार का काम प्रारंभ नहीं किया गया है।
27	मनकी	मनकी	नयापुरा मनकी मनटोला	अप्रारंभ	अभी तक काम प्रारंभ नहीं	<ul style="list-style-type: none"> ● नवीन मोटर जली/खराब है। ● अधिकांश स्टैण्डपोस्ट टूट चुके हैं। ● लीकेज है- मुक्तिधाम में पास पाईप में लीकेज है। ● संप लीकेज- संप में लीकेज है। ● ग्रिप एवं बल्व नहीं है। ● वाल्व खोलने वाली चाबी/टॉमी खराब है।
28	दुबहिया	सुन्दरा	दुबहिया	बंद	संप	

29	जंटेन	बिरवाही	जंटेन	बंद	प्लास्टिक टैंक	<ul style="list-style-type: none"> ● कुशवाहा टोले के 09 घरों में पानी काफी कम दबाव से जाता है। ● रामगढ़ी टोले के 10 घर नल कनेक्सन से वंचित है क्योंकि यहां तक पाईप लाईन नहीं डाली गई है। ● स्टार्टर खराब— मोटर चलाने वाला स्टार्टर जल गया है। ● बोरेवेल से प्लास्टिक टैंक तक की केवल/तार चोरी हो चुकी है। ● सीसी सड़क निर्माण के दौरान 08 घरों का नल कनेक्सन पाईन टूट चुका है। ● पाईप विस्तार की जरूरत— वीरेन्द्र पाण्डेय के घर से गौरीशंकर नामदेव के मकान तक पाईप नहीं है।
30	समाना	समाना	समाना	चालू	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं संप	<ul style="list-style-type: none"> ● 07 जगह लीकेज— धर्मेन्द्र पाठक के घर के पास, रमेश पाठक के घर के पास, रावेन्द्र द्विवेदी के घर के पास, सुम्मेर चौधरी के घर के पास, बृजेन्द्र चौधरी के घर के पास, राआशाराम द्विवेदी के घर के पास एवं बगीचा मंदिर के पास पाईप में लीकेज है। ● नल कनेक्सन में लीकेज— रूपलाल चौधरी, अज्जू खरे, लालू दहायत, राजेश दहायत, सुम्मेरा चौधरी, राममिलन चौधरी, दशवा कोरी, जयपाल चौधरी के कनेक्सन में लीकेज है।
31	फुलदरी	फुलवारी	फुलदरी	बंद	डायरेक्ट	<ul style="list-style-type: none"> ● स्टार्टर जल चुका है जिसके कारण सप्लाई बंद है। ● नल टॉटी एवं स्टैंडपोस्ट नहीं बने है। ● रामस्वरूप बागरी के घर से हिम्मत बागरी के घर तक पाईप लाईन नहीं है। ● नई बस्ती में रेल्वे पुलिया के पास पाईप लाईन काट दी गई है। ● 03 घर नल कनेक्सन से वंचित है।
32	मुराछ	छेवरी	मुराछ	बंद	डायरेक्ट	<ul style="list-style-type: none"> ● मोटर खराब है। ● उपरपुरा का ट्रांसफार्मर जला हुआ है। ● पाईप लाईन में लीकेज है। ● वाल्व खराब— अहिस्वार टोला का वाल्व खराब है जिससे लोगों को बिल्कुल पानी नहीं मिल रहा है। ● स्कूलों में नल कनेक्सन नहीं है। ● बसाहट की स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन नहीं है। ● पाईपलाईन में लीकेज है। ● संप की मोटर खराब है।

33	जरधोवा	जरधोवा	नाहर टोला	चालू	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक एवं सॉप	<ul style="list-style-type: none"> ● बरा टोला में पाईप लाईन चोक/जाम है। जिससे पानी आगे नहीं जा पा रहा। ● नरिया टोले में बचन यादव के घर से रामकिशोर यादव के घर तक की पाईप लाईन चोक/जाम हो चुकी है जिससे 15 घर जल से वंचित है। ● बहेरिया टोले में जल दबाव काफी कम होने से 08 घरों में पानी नहीं जा रहा है। ● यादव टोले में दो घरों में पानी नहीं जा रहा है। ● वाल्व की जरूरत— ठकुरास टोला में वीरन सिंह के घर के पास स्कूल एवं आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन नहीं है। ● कलारन टोले के 03 घर नल कनेक्सन से वंचित है। ● कलारन टोले के 21 घरों में पानी काफी कम जा रहा है। ● वाल्व लीकेज— ओव्हरहेड टैंक के पास वाल्व में लीकेज है। ● 06 माह से मोटर खराब होने से इस बसाहट के 26 घरों में जल सप्लाई बंद है।
34	अकोला	जरधोवा	मोहली पुरवा अकोला	6 माह से बंद चालू	डायरेक्ट डायरेक्ट	<ul style="list-style-type: none"> ● 27 घरों में पानी नहीं जा रहा है। ● पानी की टंकी के पास चेकवाल्व खराब है। ● 03 घर नल कनेक्सन से वंचित है। ● लीकेज— पुलिया के पास, बिहारी ढावा के पास, बरगद के पेड़ के पास पाईप में लीकेज है। ● नल कनेक्सन में लीकेज— सुनीता गोंड के नल कनेक्सन में लीकेज है। ● अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है जिससे सप्लाई प्रारंभ नहीं हो पाई है।
35	पाठा	रहुनिया	पाठा	अप्रारंभ	सीमेंट ओव्हरहेड टैंक	<ul style="list-style-type: none"> ● अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है जिससे सप्लाई प्रारंभ नहीं हो पाई है।

3. ग्राम कार्ययोजना, मनरेगा एवं जीपीडीपी में शामिल पेयजल तथा जल संरक्षण के कार्य एवं प्रगति की स्थिति

क्र	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	जल संग्रहण एवं पेयजल संबंधी गतिविधि का नाम एवं स्थान	जल संरक्षण/पेयजल	गतिविधि का स्रोत व्हीएपी/जीपीडीपी-23-24/जीपीडीपी 24-25/अन्य/मनरेगा	वर्तमान स्थिति प्रगतिरत / पूर्ण/अप्रारंभ
1	बिजवारा	रहुनिया	पाईप विस्तार-टंकी से बबू के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
2	बिजवारा	रहुनिया	पाईप विस्तार-रम्मू के घर से दीनदयाल के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
3	बिजवारा	रहुनिया	नवीन वाल्व-बबू के घर की तरफ डाली जाने वाली	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
4	बिजवारा	रहुनिया	नवीन वाल्व-रम्मू के घर के सामने की पाईप लाइन में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
5	बिजवारा	रहुनिया	08 घरों में नल कनेक्शन एवं स्टैण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
6	बिजवारा	रहुनिया	नवीन चेकडेम निर्माण-गया आदिवासी के खेत के पीछे	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
7	बिजवारा	रहुनिया	नवीन चेकडेम निर्माण-सुखलाल के खेत के पीछे	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
8	बिजवारा	रहुनिया	खेत तालाब निर्माण-खिल्लू के खेत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
9	बिजवारा	रहुनिया	खेत तालाब निर्माण-रम्मू के खेत में	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
10	बिजवारा	रहुनिया	खेत तालाब निर्माण-निरपत के खेत में	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
11	बिजवारा	रहुनिया	खेत तालाब निर्माण-गया प्रताप के खेत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
12	बिजवारा	रहुनिया	खेत तालाब निर्माण-श्यामलाल के खेत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
13	बिजवारा	रहुनिया	खेत तालाब निर्माण-केशू के खेत में	जल संरक्षण	Other	पूर्ण
14	बिजवारा	रहुनिया	33 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
15	बिजवारा	रहुनिया	02 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
16	बिजवारा	रहुनिया	बिजवारा मोड से बिजवारा घाम तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
17	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन स्रोत के मोटर पंप डालना	पेयजल	VAP	पूर्ण
18	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन बोरेल को सम्म से जोड़ना	पेयजल	VAP	पूर्ण

19	सुन्दरा	सुन्दरा	स्त्रोत से सम्प में जल भरने के स्थान को ढकना	पेयजल	VAP	पूर्ण
20	सुन्दरा	सुन्दरा	पाईप विस्तार-नंदी दहायत के घर से दददू कोरी के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
21	सुन्दरा	सुन्दरा	पाईप विस्तार-हाई स्कूल से रामप्रसाद कोरी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
22	सुन्दरा	सुन्दरा	राजाभैया के घर के पास पाईप काटना एवं सिरों को बंद करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
23	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन वाल्व मुख्य मार्ग में प्राथमिक बालक स्कूल के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
24	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन वाल्व सुखेन्द्र पटेल के खेत के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
25	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन वाल्व सुदर्शन प्रजापति के घर के पास दोनो पाईप लाईनों में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
26	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन वाल्व लखना दहायत के मकान के पास	पेयजल	VAP	पूर्ण
27	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन वाल्व रामकिशोर चौधरी के घर के पास	पेयजल	VAP	पूर्ण
28	सुन्दरा	सुन्दरा	25 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	पूर्ण
29	सुन्दरा	सुन्दरा	बालक प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
30	सुन्दरा	सुन्दरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र में नल कनेक्सन करना	पेयजल	VAP	पूर्ण
31	सुन्दरा	सुन्दरा	वेयर हाउस में नल कनेक्सन करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
32	सुन्दरा	सुन्दरा	घर से दूर लगे नल को घर की बाउन्ड्री के अंदर लगाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
33	सुन्दरा	सुन्दरा	सभी स्टेण्डपोस्ट में सरिया लगाकर मजबूती से बनाना	पेयजल	VAP	पूर्ण
34	सुन्दरा	सुन्दरा	स्टेण्ड पोस्ट से टॉपी को उचित दूरी पर लगाना	पेयजल	VAP	पूर्ण
35	सुन्दरा	सुन्दरा	बेयर हाउस के पीछे स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
36	सुन्दरा	सुन्दरा	श्मशान घाट के पास स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
37	सुन्दरा	सुन्दरा	जिवारी घाट के पास स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
38	सुन्दरा	सुन्दरा	बोल्डर चेक डेम-घटबईया बाबा के पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
39	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन स्टापडेम निर्माण-राजाराम चौधरी के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
40	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन स्टापडेम निर्माण-रामकृपाल पटेल के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
41	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन स्टापडेम निर्माण-जमीर खान के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
42	सुन्दरा	सुन्दरा	नवीन स्टापडेम निर्माण-गुलाब आदिवासी के घर के पीछे	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
43	सुन्दरा	सुन्दरा	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत- दहायत टोले में	पेयजल	VAP	पूर्ण
44	सुन्दरा	सुन्दरा	बालक प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
45	सुन्दरा	सुन्दरा	कन्या प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
46	सुन्दरा	सुन्दरा	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
47	सुन्दरा	सुन्दरा	हाईस्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
48	सुन्दरा	सुन्दरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण

49	सुन्दरा	सुन्दरा	ग्राम पंचायत भवन में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
50	सुन्दरा	सुन्दरा	वेयर हाउस में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
51	सुन्दरा	सुन्दरा	वन चौकी में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
52	सुन्दरा	सुन्दरा	ग्राम के 162 घरों में ग्रे-जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
53	सुन्दरा	सुन्दरा	प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण, सभी 11 हैण्डपंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
54	सुन्दरा	सुन्दरा	बालक प्रा. शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
55	सुन्दरा	सुन्दरा	कन्या प्रा. शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
56	सुन्दरा	सुन्दरा	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
57	सुन्दरा	सुन्दरा	हाई स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
58	सुन्दरा	सुन्दरा	उप स्वास्थ्य केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
59	सुन्दरा	सुन्दरा	वेयर हाउस में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
60	सुन्दरा	सुन्दरा	पौधरोपण, सुन्दरा-सिंहपुर मार्ग में दोनों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
61	सुन्दरा	सुन्दरा	पौधरोपण, वेयर हाउस परिसर में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
62	सुन्दरा	सुन्दरा	मोटर रिपेयरिंग कार्य	पेयजल	GPDP 24-25	पूर्ण
63	सुन्दरा	सुन्दरा	स्टापडेम निर्माण कार्य	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
64	सुन्दरा	सुन्दरा	स्टापडेम निर्माण कार्य	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
65	सुन्दरा	सुन्दरा	मोटर रिपेयरिंग कार्य	पेयजल	GPDP 24-25	पूर्ण
66	सुन्दरा	सुन्दरा	सोकपिट निर्माण कार्य	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
67	सुन्दरा	सुन्दरा	कन्जर्वेशन पिट	जल संरक्षण	GPDP 24-25	पूर्ण
68	सुन्दरा	सुन्दरा	ग्रेबियन स्ट्रक्चर नाला-3	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
69	सुन्दरा	सुन्दरा	ग्रेबियन स्ट्रक्चर नाला-4	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
70	सुन्दरा	सुन्दरा	ग्रेबियन स्ट्रक्चर नाला-6	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
71	सुन्दरा	सुन्दरा	ग्रेबियन स्ट्रक्चर नाला-7	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
72	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-भूदल के घर के पीछे से श्रीपाल के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
73	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-मंगू के घर से गुटउ के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
74	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल कनेक्सन पाईप का विस्तार-सरदार के घर से अनारा के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
75	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल कनेक्सन पाईप विस्तार-जीवन के घर से मोती गोंड के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
76	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नवीन वाल्व लगाना-बोरवेल के पास जग्गीलाल वाली लाईन में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
77	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नवीन वाल्व लगाना-बोरवेल के पास स्कूल वाली लाईन में	पेयजल	VAP	पूर्ण

78	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल जल कनेक्सन-28 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टेण्ड पोस्ट	वेयजल	VAP	प्रगतिरत
79	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल जल कनेक्सन-103 कनेक्सनों में टॉपी लगाना	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
80	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल जल कनेक्सन-01 कनेक्सन युक्त घर में स्टेण्डपोस्ट बनाना	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
81	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल जल कनेक्सन-प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	वेयजल	VAP	पूर्ण
82	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नल जल कनेक्सन-माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
83	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नवीन तालाब निर्माण- झिन्नु में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
84	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नवीन स्टापडेम निर्माण-रत्ना के खेत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
85	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नवीन स्टापडेम निर्माण-पटकुइया घाट में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
86	गोविंदपुरा	मुटवाकला	नवीन स्टापडेम निर्माण-सुम्मरिया के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
87	गोविंदपुरा	मुटवाकला	131 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
88	गोविंदपुरा	मुटवाकला	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
89	गोविंदपुरा	मुटवाकला	किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
90	गोविंदपुरा	मुटवाकला	किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
91	गोविंदपुरा	मुटवाकला	प्रा. मा. शाला में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
92	गोविंदपुरा	मुटवाकला	आं.वा.केन्द्र में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
93	गोविंदपुरा	मुटवाकला	पौधरोपण- गोविंदपुरा मोड से मोहन के घर तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
94	गोविंदपुरा	मुटवाकला	पौधरोपण- स्वराजू के घर से आंगनवाड़ी केन्द्र तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
95	गोविंदपुरा	मुटवाकला	मोटर संधारण	वेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
96	दिया	दिया	संप की रंगाई पुताई करना	वेयजल	VAP	पूर्ण
97	दिया	दिया	ओखर हेड टैंक की रंगाई पुताई	वेयजल	VAP	पूर्ण
98	दिया	दिया	पाईप विस्तार-मर्ग अहिरवार के घर से हीरालाल बाजपेई के घर तक	वेयजल	VAP	पूर्ण
99	दिया	दिया	पाईप विस्तार-नारायण सिंह के घर से रामलखन शुक्ला के घर तक	वेयजल	VAP	पूर्ण
100	दिया	दिया	पाईप विस्तार-नारायण सिंह के घर से मुन्नीलाल विश्वकर्मा के घर तक	वेयजल	VAP	पूर्ण
101	दिया	दिया	पाईप विस्तार-रामलखन शुक्ला के घर से आंगनवाड़ी केन्द्र तक	वेयजल	VAP	पूर्ण
102	दिया	दिया	पाईप विस्तार-इन्द्रभान अहिरवार के घर से रामदुलारी अहिरवार के घर तक	वेयजल	VAP	पूर्ण
103	दिया	दिया	पाईप विस्तार-जुडावन अहिरवार के घर से महेश बसोर के घर तक	वेयजल	VAP	पूर्ण
104	दिया	दिया	पाईप विस्तार-जुडावन के घर से सुखलाल अहिरवार के घर तक	वेयजल	VAP	पूर्ण
105	दिया	दिया	पाईप विस्तार-छत्रपाल सिंह के घर से राधेश्याम मिश्रा के घर तक	वेयजल	VAP	पूर्ण
106	दिया	दिया	पाईप विस्तार-छत्रपाल सिंह के मकान से जीतेन्द्र सिंह के घर तक	वेयजल	VAP	पूर्ण

107	दिया	दिया	पाईप विस्तार-छत्रपाल सिंह के घर से लक्षिमण सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
108	दिया	दिया	पाईप विस्तार-हाईस्कूल से नथू अहिरवार के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
109	दिया	दिया	पाईप विस्तार-गनेशा प्रजापति के घर से अवधेश मिश्रा के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
110	दिया	दिया	पाईप विस्तार-हाईस्कूल से हेमंत सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
111	दिया	दिया	पाईप विस्तार-ओंकार मिश्रा के घर से जीतेन्द्र सिंह के घर होते हुये धनजय सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
112	दिया	दिया	पाईप विस्तार-अर्जुन सिंह के घर से बिजुआ गोंड के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
113	दिया	दिया	पाईप विस्तार-पानी की टंकी से राकेश यादव के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
114	दिया	दिया	पाईप विस्तार-जगरूप रजक के घर से कमलेश मिश्रा के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
115	दिया	दिया	पाईप विस्तार-विश्राम सिंह के घर से जीतेन्द्र सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
116	दिया	दिया	पाईप विस्तार-विश्राम सिंह के घर से भुराने बाबा एवं हनुमान मंदिर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
117	दिया	दिया	पाईप विस्तार-अर्जुन सिंह के घर से दिनेश सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
118	दिया	दिया	पाईप विस्तार-कबूतर गोंड के घर से प्रभु गोंड के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
119	दिया	दिया	पाईप विस्तार-मुन्नीलाल गोंड के घर से छम्मीलाल गोंड के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
120	दिया	दिया	वाल्व लगाना-राम लखन शुक्ला के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
121	दिया	दिया	154 घरों में नल कनेक्सन करना	पेयजल	VAP	प्रगतिरत
122	दिया	दिया	प्राथमिक स्कूल, दिया में, नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
123	दिया	दिया	प्राथमिक स्कूल, ललईया में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
124	दिया	दिया	माध्यमिक स्कूल, दिया में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
125	दिया	दिया	हाई स्कूल, दिया में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
126	दिया	दिया	ग्राम पंचायत में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
127	दिया	दिया	उचित मूल्य की दुकान में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
128	दिया	दिया	पुरानी पाईप बदलना-ग्राम पंचायत भवन से छत्रपाल सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
129	दिया	दिया	पुरानी पाईप बदलना-हीरालाल वाजपेई के घर से विश्राम सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
130	दिया	दिया	पुरानी पाईप बदलना-जगरूप रजक के घर से आंगनवाड़ी केन्द्र तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
131	दिया	दिया	पुरानी पाईप बदलना-दुल्ला गोंड के घर से आदिवासी बस्ती तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
132	दिया	दिया	पुरानी पाईप बदलना-हीरालाल वाजपेई के घर से मर्सा अहिरवार के घर तक नाली के दूसरी तरफ से पाईप डालना	पेयजल	VAP	पूर्ण
133	दिया	दिया	तालाब मरम्मत-गहरीकरण एवं पार विस्तार	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

134	दिया	दिया	बेस्ट बियर की उंचाई बढ़ाना-बड़ा बांध	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
135	दिया	दिया	कटी पार का विस्तार, जंगल की ओर-बड़ा बांध	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
136	दिया	दिया	गेट को उपर करना, रिजर्व पानी बचा रहे-बड़ा बांध	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
137	दिया	दिया	छत जल प्रबंधन- प्राथमिक कन्या स्कूल, दिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
138	दिया	दिया	छत जल प्रबंधन- प्राथमिक स्कूल, ललईया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
139	दिया	दिया	छत जल प्रबंधन- माध्यमिक स्कूल, दिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
140	दिया	दिया	छत जल प्रबंधन- हाईस्कूल, दिया	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
141	दिया	दिया	छत जल प्रबंधन- ग्राम पंचायत भवन, दिया	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
142	दिया	दिया	छत जल प्रबंधन- उचित मूल्य की दुकान, दिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
143	दिया	दिया	277 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
144	दिया	दिया	लीच पिट निर्माण-पानी टंकी के ओव्हरपलो के लिये	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
145	दिया	दिया	13 हैण्डपंप में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
146	दिया	दिया	14 सामुदायिक कूपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
147	दिया	दिया	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-प्राथमिक स्कूल, दिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
148	दिया	दिया	लीच पिट निर्माण-प्राथमिक कन्या स्कूल, ललईया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
149	दिया	दिया	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-माध्यमिक स्कूल दिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
150	दिया	दिया	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-हाई स्कूल दिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
151	दिया	दिया	किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण-ग्राम पंचायत दिया	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
152	दिया	दिया	छोटे तालाब की मेढ में पौधरोपण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
153	दिया	दिया	पौधरोपण- तालाब से हाई स्कूल तक सड़क के दोनों ओर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
154	दिया	दिया	पौधरोपण- काली दाई से कोठी टोला तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
155	दिया	दिया	पौधरोपण- हाईस्कूल परिसर में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
156	दिया	दिया	पौधरोपण- बड़े बांध की पास में, मुख्य मार्ग से जंगल तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
157	दिया	दिया	पौधरोपण- ललईया मोड से ललईया तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
158	दिया	दिया	परकुलेशन टैंक निर्माण, ग्राम पंचायत के पीछे	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
159	दिया	दिया	खेत तालाब निर्माण, बुद्धीलाल पिता सुन्दरलाल गोंड के खेत में	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
160	दिया	दिया	कपिलधरा कूप निर्माण- पुष्पेन्द्र नाथ मिश्रा के खेत में	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
161	दिया	दिया	टंकी निर्माण कार्य	पेयजल	GPDP 24-25	अप्रारंभ
162	दिया	दिया	चेकडेम/स्टापडेम	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
163	दिया	दिया	सार्वजनिक कूप	पेयजल	GPDP 24-25	अप्रारंभ

164	दिया	दिया	स्टापडेम			जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
165	दिया	दिया	रेन वाटर हर्वेस्टिंग			जल संरक्षण	GPDP 23-24	पूर्ण
166	मनोर	मनोर	पुराने बोरोवेल को संप से जोड़ना			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
167	मनोर	मनोर	पाईप विस्तार -हक्कन के घर से मद्दे आदिवासी के घर तक			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
168	मनोर	मनोर	पाईप विस्तार -रामस्वरूप के मकान से रामगोपाल के घर तक			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
169	मनोर	मनोर	पाईप विस्तार -दरियाव के घर से रामप्रताप यादव के घर तक			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
170	मनोर	मनोर	पाईप विस्तार-जलसा बाई के घर से रामदरश गौड के घर तक			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
171	मनोर	मनोर	मुख्य पाईप विस्तार-टंकी से यादव टोले तक			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
172	मनोर	मनोर	वाल्व लगाना-संतोष यादव के मकान के पास, यादव टोला			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
173	मनोर	मनोर	08 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टेण्ड पोस्ट			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
174	मनोर	मनोर	प्राथमिक स्कूल, यादव टोला में नल कनेक्सन			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
175	मनोर	मनोर	प्राथमिक स्कूल, मुड़ियाना में नल कनेक्सन			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
176	मनोर	मनोर	माध्यमिक स्कूल, यादव टोला में नल कनेक्सन			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
177	मनोर	मनोर	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
178	मनोर	मनोर	वन चौकी में नल कनेक्सन			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
179	मनोर	मनोर	तालाब गहरीकरण- गुड़ियाना टोले में			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
180	मनोर	मनोर	तालाब गहरीकरण-यादव टोले के पास			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
181	मनोर	मनोर	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत- गुड़ियाना टोले में			पेयजल	VAP	अप्रारंभ
182	मनोर	मनोर	प्राथमिक स्कूल, गुड़ियाना में पाईप एवं लीच पिट			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
183	मनोर	मनोर	प्राथमिक स्कूल, यादव टोला पाईप एवं लीच पिट			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
184	मनोर	मनोर	माध्यमिक स्कूल, पाईप एवं लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
185	मनोर	मनोर	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
186	मनोर	मनोर	वन चौकी में पाईप एवं लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
187	मनोर	मनोर	217 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
188	मनोर	मनोर	05 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
189	मनोर	मनोर	प्रा. शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
190	मनोर	मनोर	प्रा. शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
191	मनोर	मनोर	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
192	मनोर	मनोर	वन चौकी में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
193	मनोर	मनोर	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण			जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

194	मनोर	मनोर	मनोर	प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण, मोटर वाले बोस्वेल में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
195	मनोर	मनोर	मनोर	प्राथमिक स्कूल गुड़ियाना परिसर में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
196	मनोर	मनोर	मनोर	जरूआपुर मार्ग से गुड़ियाना तक मार्ग के दोनों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
197	मनोर	मनोर	मनोर	पन्ना-छतरपुर मार्ग के दोनों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
198	मनोर	मनोर	मनोर	मोटर रिपेरिंग	पेयजल	GPDP 24-25	पूर्ण
199	मनोर	मनोर	मनोर	सार्वजनिक कूप निर्माण, खेरमाता मनोर	पेयजल	NREGS 23-24	प्रगतिरत
200	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-टंकी से चौपरा तक 140 मिमी	पेयजल	VAP	पूर्ण
201	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-हन्नु त्रिपाठी के खेत से रामखिलावन चौधरी के मकान तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
202	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-मवेसी अस्पताल से हरि वंशकार के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
203	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-राम जानकी मंदिर से चन्द्रशेखर मिश्रा के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
204	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-लम्पा चौधरी के घर से रामदीन चौधरी के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
205	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-चौपरा से बाबू चौधरी के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
206	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-लम्पा चौधरी के घर से श्यामलाल कोरी के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
207	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-जवाहर चौधरी के घर से बल्लार चौधरी के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
208	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पाईप विस्तार-विश्वभर चौधरी के घर से भूरा चौधरी के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
209	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	समस्त ग्राम में जीआई के स्थान पर नवीन पाईप लाईन का उपयोग करना	पेयजल	VAP	पूर्ण
210	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	नवीन वाल्व-राम जानकी मंदिर के पास	पेयजल	VAP	पूर्ण
211	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	नवीन वाल्व-रामकेश मिश्रा के घर के पास	पेयजल	VAP	पूर्ण
212	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	नवीन वाल्व-यात्री प्रतीक्षालय के पास, लखनपुर पाईप लाईन में	पेयजल	VAP	पूर्ण
213	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	नवीन वाल्व-विष्णु नामदेव के घर के पास, बेडियाना पाईपलाइन	पेयजल	VAP	पूर्ण
214	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	88 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	प्रगतिरत
215	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
216	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
217	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	ग्राम पंचायत में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
218	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	आंगनवाड़ी केन्द्र में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
219	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	पशु औषधालय में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
220	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	उप स्वास्थ्य केन्द्र में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
221	डडबरिया	डडबरिया	डडबरिया	तालाब गहरीकरण, बंधनवा तलैया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

222	डडबरिया	डडबरिया	नाला गहरीकरण, चौपरा से बंधनवा तलेया तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
223	डडबरिया	डडबरिया	चेकडैम निर्माण, बंधनवा तलेया के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
224	डडबरिया	डडबरिया	चौपरा मरम्मत एवं साफ-सफाई, राम जानकी मंदिर के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
225	डडबरिया	डडबरिया	तालाब साफ-सफाई, हरिजन टोला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
226	डडबरिया	डडबरिया	छत जल संग्रहण, प्राथमिक स्कूल, डडबरिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
227	डडबरिया	डडबरिया	छत जल संग्रहण, माध्यमिक स्कूल डडबरिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
228	डडबरिया	डडबरिया	छत जल संग्रहण, ग्राम पंचायत डडबरिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
229	डडबरिया	डडबरिया	छत जल संग्रहण, आंगनवाड़ी केन्द्र डडबरिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
230	डडबरिया	डडबरिया	छत जल संग्रहण,, पशु औषधालय डडबरिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
231	डडबरिया	डडबरिया	छत जल संग्रहण, उप स्वास्थ्य केन्द्र डडबरिया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
232	डडबरिया	डडबरिया	सभी घरों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
233	डडबरिया	डडबरिया	सभी 12 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
234	डडबरिया	डडबरिया	सभी 03 सामुदायिक कुपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
235	डडबरिया	डडबरिया	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
236	डडबरिया	डडबरिया	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
237	डडबरिया	डडबरिया	ग्राम पंचायत में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
238	डडबरिया	डडबरिया	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
239	डडबरिया	डडबरिया	पशु औषधालय में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
240	डडबरिया	डडबरिया	उप स्वास्थ्य केन्द्र में किचेन गार्डन/लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
241	डडबरिया	डडबरिया	प्राथमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
242	डडबरिया	डडबरिया	पौधरोपण- डडबरिया मोड से पंचायत भवन तक मार्ग के दोनो तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
243	डडबरिया	डडबरिया	पौधरोपण- चौपरा से लखनपुर तक मार्ग के दोनो ओर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
244	डडबरिया	डडबरिया	पौधरोपण- बंधनवा से मझगवां हार तक मार्ग के दोनो ओर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
245	डडबरिया	डडबरिया	पौधरोपण- डडबरिया या श्यामरजडा मार्ग के दोनो तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
246	डडबरिया	डडबरिया	पौधरोपण- माध्यमिक शाला परिसर में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
247	डडबरिया	डडबरिया	पौधरोपण- ग्राम पंचायत भवन परिसर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
248	डडबरिया	डडबरिया	मोटर सुधार कार्य-बोरवेल का मोटर	पेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
249	डडबरिया	डडबरिया	पाईप लाईन सुधार कार्य	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
250	डडबरिया	डडबरिया	मोटर सुधार कार्य-बोरवेल का मोटर	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
251	डडबरिया	डडबरिया	नाला गहरीकरण	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ

252	डडबरिया	डडबरिया	सामुदायिक सोकपिट निर्माण कार्य	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
253	रनवाहा	रनवाहा	ओव्हर हेड टंकी निर्माण- नवीन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
254	रनवाहा	रनवाहा	सम्प निर्माण	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
255	रनवाहा	रनवाहा	पाईप विस्तार-मंगोला आदिवासी के घर से चेता आदिवासी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
256	रनवाहा	रनवाहा	मुख्य पाईप विस्तार-बोर से बृजगोपाल के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
257	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-दरवारी लाल यादव के घर के सामने	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
258	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-माध्यमिक स्कूल के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
259	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-नाला के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
260	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-जगदीश यादव के घर के सामने	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
261	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-राजू महाराज के घर के सामने	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
262	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-लोकेश के घर के सामने	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
263	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-तीर्थ पटेल के घर के सामने	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
264	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-बालकृष्ण प्रजापति के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
265	रनवाहा	रनवाहा	लीकेज बंद करना-रामसजीवन यादव के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
266	रनवाहा	रनवाहा	नवीन वाल्व लगाना-बृजगोपाल के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
267	रनवाहा	रनवाहा	नवीन वाल्व लगाना-बाला प्रसाद के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
268	रनवाहा	रनवाहा	14 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
269	रनवाहा	रनवाहा	सभी नलों में टॉपी लगाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
270	रनवाहा	रनवाहा	सभी नल कनेक्सन में स्टैण्डपोस्ट बनाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
271	रनवाहा	रनवाहा	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना- माता मंदिर के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
272	रनवाहा	रनवाहा	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना- महेन्द्र महदले के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
273	रनवाहा	रनवाहा	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना- राजकुमार शर्मा के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
274	रनवाहा	रनवाहा	स्टापडेम मरम्मत / गहरीकरण- बलीराम के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
275	रनवाहा	रनवाहा	कूप की साफ-सफाई / मरम्मत- ग्राम के किनारे सार्वजनिक कूप	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
276	रनवाहा	रनवाहा	कुल्हुआ नाला की सफाई / गहरीकरण- कुल्हुआ नाला सम्पूर्ण ग्राम क्षेत्र में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
277	रनवाहा	रनवाहा	बीहड़ मरम्तीकरण- कुल्हुआ बीहड़	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
278	रनवाहा	रनवाहा	छत जल प्रबंधन- प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
279	रनवाहा	रनवाहा	छत जल प्रबंधन- आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
280	रनवाहा	रनवाहा	147 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

281	कुल्हुआ	रनवाहा	10 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
282	कुल्हुआ	रनवाहा	पौधरोपण- कुल्हुआ बीहड के चारों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
283	कुल्हुआ	रनवाहा	पौधरोपण- स्कूल से बांध तक मार्ग के दोनों किनारे पौधरोपण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
284	कुल्हुआ	रनवाहा	पौधरोपण- बख्तीरी मोड से पुल तक मार्ग के दोनों किनारे	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
285	कुल्हुआ	रनवाहा	जल सप्लाई-पाईप लाईन कनेक्सन- नीम के पास चेकवाल्व/ पाईप सुधार	पेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
286	कुल्हुआ	रनवाहा	जल सप्लाई-पाईप लाईन कनेक्सन	पेयजल	GPDP 24-25	प्रगतिरत
287	नुनाही	गोल्ही पाठक	नवीन बोर में मोटर बदलना 7 हार्सपावर	पेयजल	VAP	पूर्ण
288	नुनाही	गोल्ही पाठक	सप्लाई पूर्व आर.ओ. या फिल्टर लगाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
289	नुनाही	गोल्ही पाठक	जल वितरण पाईप लाईन विस्तार-विजय बिल्थरिया के घर से स्कूल तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
290	नुनाही	गोल्ही पाठक	पाईप लाईन को ढकना- ग्राम में सभी जगह	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
291	नुनाही	गोल्ही पाठक	नल कनेक्सन- 06 घरों में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
292	नुनाही	गोल्ही पाठक	सभी नल कनेक्सनों को घर के अंदर करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
293	नुनाही	गोल्ही पाठक	सभी नल कनेक्सनों में स्टैण्डपोस्ट बनाना एवं टौटी लगाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
294	नुनाही	गोल्ही पाठक	सभी पाईपों को सुरक्षित ढंग से कवर करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
295	नुनाही	गोल्ही पाठक	नवीन वाल्व लगाना- रामनिवास विश्वकर्मा के घर के पास	पेयजल	VAP	पूर्ण
296	नुनाही	गोल्ही पाठक	वाल्व का चैम्बर निर्माण- गांव के प्रारंभ में लगे दोनो वाल्वों में	पेयजल	VAP	पूर्ण
297	नुनाही	गोल्ही पाठक	स्टापडेम निर्माण- सिमरी रास्ते में पुलिया के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
298	नुनाही	गोल्ही पाठक	स्टापडेम निर्माण- नहर की पुलिया के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
299	नुनाही	गोल्ही पाठक	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत- गांव का सार्वजनिक कूप	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
300	नुनाही	गोल्ही पाठक	छत जल संग्रहण- प्राथमिक स्कूल, में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
301	नुनाही	गोल्ही पाठक	छत जल संग्रहण- माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
302	नुनाही	गोल्ही पाठक	छत जल संग्रहण- सामुदायिक भवन में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
303	नुनाही	गोल्ही पाठक	120 घरों में ग्राम के सभी घरों में ग्रे-जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
304	नुनाही	गोल्ही पाठक	सभी 05 हैण्डपंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
305	नुनाही	गोल्ही पाठक	प्रा. शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
306	नुनाही	गोल्ही पाठक	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
307	नुनाही	गोल्ही पाठक	सामुदायिक भवन में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
308	नुनाही	गोल्ही पाठक	पौधरोपण- नुनाही मोड से झिन्ना तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
309	नुनाही	गोल्ही पाठक	परकुलेशन टैंक निर्माण	जल संरक्षण	NREGS 24-25	प्रगतिरत

310	नुनाही	गोल्ही पाठक	परकुलेशन टॅक निर्माण, नुनाही नाला	जल संरक्षण	NREGS 24-25	अप्रारंभ
311	नुनाही	गोल्ही पाठक	मोटर रिपेरिंग एवं पाईपलाईन मरम्मत	पेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
312	नुनाही	गोल्ही पाठक	मौजूदा पेयजल स्रोतों का संवर्धन	पेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
313	नुनाही	गोल्ही पाठक	पेयजल क्लोरीनीकरण	पेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
314	नुनाही	गोल्ही पाठक	मौजूदा पाईपलाईन का विस्तार	पेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
315	नुनाही	गोल्ही पाठक	सोकपिट निर्माण कार्य, नुनाही	जल संरक्षण	GPDP 23-24	पूर्ण
316	नुनाही	गोल्ही पाठक	सार्वजनिक सीनों तक पेयजल पाईप लाईन की जलापूर्ति	पेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
317	नुनाही	गोल्ही पाठक	गांव की जलापूर्ति	पेयजल	GPDP 23-24	पूर्ण
318	नुनाही	गोल्ही पाठक	टंकी निर्माण कार्य	पेयजल	GPDP 24-25	पूर्ण
319	नुनाही	गोल्ही पाठक	अन्डर ग्राउंड ड्राईक - नाला-1 नुनाही	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
320	नुनाही	गोल्ही पाठक	अन्डर ग्राउंड ड्राईक - नाला-2 नुनाही	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
321	नुनाही	गोल्ही पाठक	ग्रेवियन निर्माण कार्य - नाला-3 नुनाही	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
322	नुनाही	गोल्ही पाठक	ग्रेवियन निर्माण कार्य- लिच्ची हार नुनाही	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
323	नुनाही	गोल्ही पाठक	ग्रेवियन निर्माण कार्य -कोटवार हार नुनाही	जल संरक्षण	NREGS 24-25	पूर्ण
324	तारा	तारा	अधूरे सम्प का निर्माण पूरा करना	जल संरक्षण	NREGS 24-25	पूर्ण
325	तारा	तारा	ओल्डर हेड टैंक से वितरण लाईन जोड़ना	पेयजल	VAP	पूर्ण
326	तारा	तारा	पाईप विस्तार-मिजाजी के घर से बाबूलाल कुशवाहा के मकान तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
327	तारा	तारा	पाईप विस्तार-गुप्पी अहिरवार के घर से डीलन आदिवासी के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
328	तारा	तारा	पाईप विस्तार-रामकुमार कुशवाहा के घर से सुखई कुशवाहा के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
329	तारा	तारा	पाईप विस्तार-रामखिलावन के घर से सवाई लाल कुशवाहा के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
330	तारा	तारा	पाईप विस्तार-रामकुमार गर्ग के घर से नंदा साहू के मकान तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
331	तारा	तारा	नवीन वाल्व-मिजाजी कुशवाहा के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
332	तारा	तारा	नवीन वाल्व-बस स्टैण्ड यात्री प्रतीक्षालय के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
333	तारा	तारा	नवीन वाल्व-जान मोहम्मद के मकान के पास दोनो लाईनों में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
334	तारा	तारा	नवीन वाल्व-बाबूलाल कुशवाहा के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
335	तारा	तारा	नवीन वाल्व-हरिजन बस्ती कुओं के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
336	तारा	तारा	पाईप का सिरा बंद करना-महादेव कुशवाहा के मकान के पास	पेयजल	VAP	पूर्ण
337	तारा	तारा	भूमिसेन तलैया मेढ मरम्मत एवं गहरीकरण- पन्ना रोड़ में तारा टेक के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
338	तारा	तारा	नवीन तालाब निर्माण- ताल गांव के पीछे, धुसरहा नाला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

369	बंगला	भटहरमेघा	प्लास्टिक ओव्हरहेड टैंक के स्टेण्ड को मजबूती से बनाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
370	बंगला	भटहरमेघा	सीमेंट का ओव्हरहेड टैंक बनाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
371	बंगला	भटहरमेघा	23 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
372	बंगला	भटहरमेघा	23 टूटे हुये स्टेण्डपोस्ट का नवनिर्माण करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
373	बंगला	भटहरमेघा	टॉप्टी विहीन नलों में टॉप्टी लगाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
374	बंगला	भटहरमेघा	88 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
375	बंगला	भटहरमेघा	03 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
376	बंगला	भटहरमेघा	आंतरिक मार्गों के किनारे फल-फूलदार पौधे लगाना	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
377	बंगला	भटहरमेघा	चेकडैम निर्माण	जल संरक्षण	GPDP 23-24	पूर्ण
378	बंगला	भटहरमेघा	ग्रेबियन निर्माण कार्य	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
379	नैगुवा	दिया	बोरवेल मोटर की मरम्मत	पेयजल	VAP	पूर्ण
380	नैगुवा	दिया	नवीन मोटर डालना- पीपल के पास कूप में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
381	नैगुवा	दिया	कूप के मोटर को जल वितरण लाईन को जोड़ना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
382	नैगुवा	दिया	वाल्व लगाना-सुरेश साहु के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
383	नैगुवा	दिया	वाल्व लगाना-अरुणेन्द्र मिश्रा के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
384	नैगुवा	दिया	30 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
385	नैगुवा	दिया	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
386	नैगुवा	दिया	आंगनवाडी केन्द्र में नल कनेक्सन करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
387	नैगुवा	दिया	सभी नलों में स्टेण्ड पोस्ट एवं टॉप्टी लगाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
388	नैगुवा	दिया	स्टापडेम मरम्मत एवं गेट लगाना-घोहा नाले में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
389	नैगुवा	दिया	चेकडेम मरम्मत एवं गेट लगाना-मोहली घाट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
390	नैगुवा	दिया	नवीन चेकडेम निर्माण-चिंगा गोंड के खेत के पास, डडिया नाला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
391	नैगुवा	दिया	नवीन चेकडेम निर्माण-अरविंद द्विवेदी के खेत के पास, बरकोला नाला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
392	नैगुवा	दिया	नवीन चेकडेम निर्माण-डडिया हार, छोट बेटा के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
393	नैगुवा	दिया	नवीन चेकडेम निर्माण-मुन्नी गोतम के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
394	नैगुवा	दिया	नवीन चेकडेम निर्माण-डुडसिन नाला, नारायण तिवारी के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
395	नैगुवा	दिया	नवीन चेकडेम निर्माण-नरही नाला, बाबू तिवारी के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
396	नैगुवा	दिया	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत-शिवजी मंदिर के पास	पेयजल	VAP	पूर्ण
397	नैगुवा	दिया	कूप गहरीकरण/ब्लास्टिंग-महेश्वरी मंदिर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
398	नैगुवा	दिया	प्राथमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

399	नैगुवा	दिया	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	VAP	अप्रारंभ
400	नैगुवा	दिया	103 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	VAP	अप्रारंभ
401	नैगुवा	दिया	03 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	VAP	पूर्ण
402	नैगुवा	दिया	02 कूपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	VAP	प्रगतिरत
403	नैगुवा	दिया	प्राथमिक शाला में किचेन गार्डन/लीच पिट निर्माण	VAP	अप्रारंभ
404	नैगुवा	दिया	मझगवां रोड से गांव तक सड़क के दोनों तरफ	VAP	अप्रारंभ
405	नैगुवा	दिया	बोल्डर चेकडेम - नैगुवां नाला बाबू तिवारी के खेत के पास	NREGS 23-24	प्रगतिरत
406	नैगुवा	दिया	कपिलधरा कूप निर्माण- नैगुवा मुन्नी / दादुराम गोतम	NREGS 23-24	प्रगतिरत
407	नैगुवा	दिया	कपिलधरा कूप निर्माण- नैगुवा छोटा / हजारी गोंड	NREGS 23-24	प्रगतिरत
408	नैगुवा	दिया	मोटर स्पियरिंग	पेयजल	अप्रारंभ
409	नैगुवा	दिया	नल जल योजना विस्तारीकरण- नैगुवां	GPDP 24-25	अप्रारंभ
410	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	बोर में टॉटी लगाना, मंदिर के पास	VAP	अप्रारंभ
411	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	बोर में टॉटी लगाना- बुधीलाल कुशवाहा के घर से बालाप्रसाद के घर तक	VAP	अप्रारंभ
412	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	पाईप लाईन विस्तार-हैण्डपंप से संतोश मिश्रा, रीवा वाले के घर तक	VAP	अप्रारंभ
413	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	पाईप लाईन विस्तार-हैण्डपंप से बालगोविंद मिश्रा, टिकू भईया के घर तक	VAP	अप्रारंभ
414	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	34 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	VAP	अप्रारंभ
415	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	आदिवासी टोले में टोटी को स्टैण्डपोस्ट से दूर लगाना	VAP	अप्रारंभ
416	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	टूटे हुये स्टैण्डपोस्ट का नवनिर्माण करना	VAP	पूर्ण
417	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	टॉटी विहीन नलों में टॉटी लगाना	VAP	अप्रारंभ
418	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	तालाब गहरीकरण- मंदिर के सामने	VAP	अप्रारंभ
419	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	स्टापडेम निर्माण- लालमणि रजक के खेत के पास, सतना नदी	VAP	अप्रारंभ
420	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	कूप की साफ-सफाई/मरम्मत- दोनो सामुदायिक कूप	VAP	अप्रारंभ
421	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	निजी कूपों की साफ-सफाई- दोनो निजी कूप	VAP	अप्रारंभ
422	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	छत जल संग्रहण- प्राथमिक स्कूल, में पाईप एवं लीच पिट	VAP	अप्रारंभ
423	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	छत जल संग्रहण- माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट	VAP	अप्रारंभ
424	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	छत जल संग्रहण- आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	VAP	अप्रारंभ
425	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	ग्राम के सभी 148 घरों में ग्रे-जल प्रबंधन	VAP	अप्रारंभ
426	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	सभी 05 हैण्डपंपों के पास प्लेटफार्म एवं लीचपिट निर्माण	VAP	अप्रारंभ

427	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	प्रा. शाला में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
428	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
429	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
430	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	डबलू एस. पी. निर्माण- तालाब के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
431	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	लीचपिट निर्माण- रजक मोहल्ले, रामकेश के घर के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
432	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	पौधरोपण- तालाब की मेढ पर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
433	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	पौधरोपण- सतना-पन्ना मार्ग के दोनों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
434	इटवां तिल्हा	सुन्दरा	पौधरोपण- अहरी टोले में मार्ग के दोनों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
435	उमरी	उमरी	सम्प का निर्माण पूरा करना	पेयजल	VAP	प्रगतिरत
436	उमरी	उमरी	अधुरे ओल्हर हेड टैंक को पूरा करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
437	उमरी	उमरी	पाईप लाईन-भैसाही मोड़ से राजाराम लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
438	उमरी	उमरी	पाईप लाईन-जालिम गोंड के घर से रामलाल लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
439	उमरी	उमरी	पाईप लाईन-रामलखन लोधी के घर से मोतीलाल लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
440	उमरी	उमरी	पाईप लाईन-संतराम लोधी के घर से चिंतामणि लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
441	उमरी	उमरी	पाईप लाईन-अमृतलाल गुप्ता के घर से बैजनाथ लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
442	उमरी	उमरी	पाईप लाईन-बाला लोधी के घर से हेतराम लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
443	उमरी	उमरी	पाईप लाईन-अयोध्या गौतम के घर से बहादुर सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
444	उमरी	उमरी	वाल्व लगाना-भवानीपुर मोड़ में रामकृपाल लोधी के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
445	उमरी	उमरी	वाल्व लगाना-अयोध्या प्रसाद गौतम के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
446	उमरी	उमरी	वाल्व लगाना-राजबहादुर लोधी के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
447	उमरी	उमरी	वाल्व लगाना-रमेश लोधी के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
448	उमरी	उमरी	वाल्व लगाना-जालिम गोंड के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
449	उमरी	उमरी	वाल्व लगाना-करीम गोंड के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
450	उमरी	उमरी	102 घरों में नवीन नल कनेक्सन करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
451	उमरी	उमरी	प्राथमिक स्कूल, उमरी में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
452	उमरी	उमरी	माध्यमिक स्कूल, उमरी में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
453	उमरी	उमरी	आंगनवाड़ी केन्द्र, उमरी में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
454	उमरी	उमरी	नवीन स्टापडेम निर्माण-डगनहा नाला, रामगोपाल के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
455	उमरी	उमरी	नवीन स्टापडेम निर्माण-बिल्ला गोंड के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
456	उमरी	उमरी	स्टापडेम मरम्मत, वाल निर्माण- डहरिया स्टापडेम	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

457	उमरी	उमरी	उमरी	नाला गहरीकरण- रामगोपाल नामदेव के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
458	उमरी	उमरी	उमरी	बाबडी सफाई एवं मरम्मत- नल जल टंकी के पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
459	उमरी	उमरी	उमरी	तालाब गहरीकरण- भवानीपुर तालाब	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
460	उमरी	उमरी	उमरी	छत जल संग्रहण- प्राथमिक स्कूल, उमरी	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
461	उमरी	उमरी	उमरी	छत जल संग्रहण- प्राथमिक स्कूल, महाराजपुर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
462	उमरी	उमरी	उमरी	छत जल संग्रहण- माध्यमिक स्कूल, उमरी में	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
463	उमरी	उमरी	उमरी	छत जल संग्रहण- आंगनवाड़ी केन्द्र, उमरी में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
464	उमरी	उमरी	उमरी	छत जल संग्रहण- ग्राम पंचायत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
465	उमरी	उमरी	उमरी	292 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
466	उमरी	उमरी	उमरी	लीच पिट निर्माण--ओव्हरहेड टैंक के ओव्हरफ्लो	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
467	उमरी	उमरी	उमरी	14 हैण्डपंपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
468	उमरी	उमरी	उमरी	04 सामुदायिक कूपों में प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण	पेयजल	VAP	प्रगतिरत
469	उमरी	उमरी	उमरी	किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण-प्राथमिक स्कूल उमरी	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
470	उमरी	उमरी	उमरी	किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण-प्राथमिक स्कूल महाराजपुर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
471	उमरी	उमरी	उमरी	किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण- माध्यमिक स्कूल, उमरी में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
472	उमरी	उमरी	उमरी	किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण- ग्राम पंचायत, उमरी में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
473	उमरी	उमरी	उमरी	पौधरोपण- सभी आंतरिक मार्गों एवं पन्ना-अमानगंज मार्ग पर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
474	उमरी	उमरी	उमरी	पौधरोपण- स्कूल, पंचायत के प्रांगण में चारों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
475	उमरी	उमरी	उमरी	पौधरोपण- खेतों की मेंदों पर फल-फूलदार पौधे लगाना	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
476	उमरी	उमरी	उमरी	पौधरोपण- जल संग्रहण टैंक के आसपास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
477	उमरी	उमरी	उमरी	परफुलेशन टैंक, कमला अहिरवार	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
478	उमरी	उमरी	उमरी	बोल्डर चेकडेम, भैसहाई नाला, उमरी	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
479	उमरी	उमरी	उमरी	बोल्डर चेकडेम, भैसहाई नाला, उमरी	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
480	उमरी	उमरी	उमरी	ग्रेबियन संरचना, जबहा घाट उमरी-1	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
481	उमरी	उमरी	उमरी	ग्रेबियन संरचना, जबहा घाट उमरी-2	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
482	उमरी	उमरी	उमरी	बोल्डर चेकडेम, जमुनहा सेह, उमरी-1	जल संरक्षण	NREGS 24-25	प्रगतिरत
483	उमरी	उमरी	उमरी	बोल्डर चेकडेम, जमुनहा सेह, उमरी-2	जल संरक्षण	NREGS 24-25	प्रगतिरत
484	उमरी	उमरी	उमरी	वाटर कन्जर्वेशन, चेकडेम मरम्मत कार्य, भैसहाई नाला कारी बराह, उमरी	जल संरक्षण	NREGS 24-25	प्रगतिरत
485	उमरी	उमरी	उमरी	अगमेन्टेशन आफ उपलब्ध स्रोतों में वृद्धि	पेयजल	NREGS 24-25	अप्रारंभ
486	उमरी	उमरी	उमरी	कान्स्ट्रक्सन आफ न्यू पाईप्ल	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ

487	उमरी	उमरी	उमरी	चेकडैम निर्माण	जल संरक्षण	जल संरक्षण	जल संरक्षण	अप्रारंभ
488	उमरी	उमरी	उमरी	वाटर कन्जर्वेशन	जल संरक्षण	जल संरक्षण	जल संरक्षण	अप्रारंभ
489	उमरी	उमरी	उमरी	एक्सटेंशन आफ न्यू पाईपलाइन	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
490	उमरी	उमरी	उमरी	फैसिंग आफ पोण्ड	जल संरक्षण	जल संरक्षण	जल संरक्षण	अप्रारंभ
491	उमरी	उमरी	उमरी	ग्रे वाटर मैनेजमेंट ट्रीटमेंट एवं रियूज	जल संरक्षण	जल संरक्षण	जल संरक्षण	अप्रारंभ
492	उमरी	उमरी	उमरी	पाईप टू पब्लिक	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
493	उमरी	उमरी	उमरी	सार्वजनिक कूप मरम्मत कार्य	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
494	उमरी	उमरी	उमरी	मोटर रिपेयर एवं पाईप लाईन	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
495	उमरी	उमरी	उमरी	सार्वजनिक कूप मरम्मत कार्य	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
496	उमरी	उमरी	उमरी	मोटर रिपेयरिंग कार्य	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
497	उमरी	उमरी	उमरी	चेकडैम स्टापडेम निर्माण	जल संरक्षण	जल संरक्षण	जल संरक्षण	अप्रारंभ
498	उमरी	उमरी	उमरी	टंकी निर्माण कार्य	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
499	उमरी	उमरी	उमरी	सार्वजनिक कूप मरम्मत कार्य	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
500	उमरी	उमरी	उमरी	सार्वजनिक कूप मरम्मत एवं जगत निर्माण कार्य	पेयजल	पेयजल	पेयजल	अप्रारंभ
501	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	संप की छपाई एवं रंगाई- ओल्डहेड टैंक के पास	पेयजल	पेयजल	VAP	प्रगतिरत
502	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	पाईप लाईन विस्तार- राजापुर में आधे टोले में	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
503	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	पाईप लाईन विस्तार- सनेही के घर से छंगा के घर तक	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
504	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	पाईप लाईन विस्तार- कुशमिया के घर से जुम्न गौड के घर तक	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
505	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	पाईप लाईन विस्तार- स्वामी के घर से रघुवंशी दुबे के घर तक	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
506	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	237 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टैण्ड पोस्ट	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
507	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्राथमिक स्कूल, राजापुर में नल कनेक्सन	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
508	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्राथमिक स्कूल, रामकालोनी में नल कनेक्सन	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
509	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्राथमिक स्कूल, गठरपुर में नल कनेक्सन	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
510	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्राथमिक स्कूल, लखा में नल कनेक्सन	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
511	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	आंगनवाड़ी केन्द्र, राजापुर में नल कनेक्सन	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
512	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	आंगनवाड़ी केन्द्र, रामकालोनी में नल कनेक्सन	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
513	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	ग्राम पंचायत भवन में नल कनेक्सन	पेयजल	पेयजल	VAP	पूर्ण
514	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	नवीन वाल्व- टंकी के पास देविन टोला वाली पाईप लाईन में	पेयजल	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
515	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	नवीन वाल्व- टंकी के पास राजापुर रोड़ में	पेयजल	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
516	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	नवीन वाल्व- टंकी के पास रामकालोनी रोड वाली पाईप लाईप में	पेयजल	पेयजल	VAP	अप्रारंभ

517	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	तालाब गहरीकरण एवं पार मरम्मत- रमतलैया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
518	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	स्टापडेम मरम्मत- चकरगटा में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
519	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	स्टापडेम मरम्मत- मरघटाई नाला में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
520	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	कूप की साफ-सफाई एवं मरम्मत- रामनरेश दुबे का कूप	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
521	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	कूप की साफ-सफाई एवं मरम्मत- बगीचा कूप	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
522	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	कूप की साफ-सफाई एवं मरम्मत- संतोष मिश्रा के घर के सामने	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
523	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	कूप की साफ-सफाई एवं मरम्मत- आदिवासी टोला	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
524	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	कूप की साफ-सफाई एवं मरम्मत- राजापुर	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
525	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	कूप की साफ-सफाई एवं मरम्मत- गटरूपुर	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
526	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	छत जल प्रबंधन- प्राथमिक स्कूल, राजापुर में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
527	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्राथमिक स्कूल, रामकालोनी में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
528	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्राथमिक स्कूल, लखा में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
529	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्राथमिक स्कूल, गठरपुर में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
530	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
531	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	आंगनवाड़ी केन्द्र रामकालोनी में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
532	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	आंगनवाड़ी केन्द्र राजापुर में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
533	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	ग्राम के सभी घरों में ग्रे-जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
534	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	सभी 05 हेण्डपंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
535	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्रा. शा. राजापुर में किचेन गार्डन/लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
536	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्रा. शा. रामकालोनी में किचेन गार्डन/लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
537	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्रा. शा. लखा में किचेन गार्डन/लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
538	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	प्रा. शा. गठरपुर में किचेन गार्डन/लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
539	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	माध्यमिक स्कूल में किचेन गार्डन/लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
540	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	आंगनवाड़ी केन्द्र राजापुर में किचेन गार्डन/लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
541	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	आं.वा. केन्द्र रामकालोनी में किचेन गार्डन/लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
542	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	नदी से हटाकर पंप का स्टार्टर संप में रखना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
543	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	नाला से ग्राम की पुलिया तक मार्ग के दोनों ओर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
544	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	ग्रेबियन संरचना निर्माण, कुलवा नाला-1, रमखिरिया	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
545	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	ग्रेबियन संरचना निर्माण, कुलवा नाला-1, रमखिरिया	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
546	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	ग्रेबियन संरचना निर्माण, बहेरा नाला-2, रमखिरिया	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण

547	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	बोल्डर ग्रेबियन संरचना निर्माण, बहेरा नाला-1, रमखिरिया	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
548	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	ग्रेबियन संरचना निर्माण, बसहा नाला, रमखिरिया	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
549	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	कूप मरम्मत कार्य, बड़ी माता पास	पेयजल	GDPD 23-24	अप्रारंभ
550	रमखिरिया	रमखिरिया	रमखिरिया	पानी की सप्लाई, रमखिरिया	पेयजल	GDPD 23-24	अप्रारंभ
551	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	सम्प की छपाई करना	पेयजल	VAP	पूर्ण
552	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	सम्प की रंगाई-पुताई करना	पेयजल	VAP	पूर्ण
553	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	सम्प से टंकी तक पाईप जोड़ना	पेयजल	VAP	पूर्ण
554	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	ओव्हर हेड टैंक की रंगाई पुताई	पेयजल	VAP	पूर्ण
555	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	पाईप विस्तार-फतेसिंह के घर से आशाराम के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
556	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	पाईप विस्तार-जमुना यादव के घर से दरियाव के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
557	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	पाईप विस्तार-धनीराम के घर से बौरा गोंड के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
558	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	पाईप विस्तार-बल्लू यादव के घर से बट्टी अहिरवार के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
559	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	चैम्बर निर्माण-दोनो वाल्व के पास मुख्य सड़क के किनारे	पेयजल	VAP	पूर्ण
560	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	99 घरों में नवीन कनेक्सन करना	पेयजल	VAP	प्रगतिरत
561	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	हाई स्कूल कम्पस में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
562	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	आंगनवाड़ी केन्द्र, में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
563	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	उचित मूल्य की दुकान में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
564	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	ग्राम पंचायत भवन में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	पूर्ण
565	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	टूटे स्टापछेम की मरम्मत, नाला सफाई-रंजीत के घर के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
566	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	बाबड़ी की मरम्मत, सफाई-मुख्य सड़क के किनारे	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
567	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	बड़े तालाब तक नाली निर्माण-सुआ जोहार से तालाब तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
568	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	कूप मरम्मत, सफाई, जगत निर्माण-बधियन वाले कूप में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
569	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	प्राथमिक स्कूल, मुटवा कला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
570	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	माध्यमिक स्कूल, मुटवा कला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
571	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	हाईस्कूल स्कूल, मुटवा कला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
572	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	आंगनवाड़ी केन्द्र, मुटवा कला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
573	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	उचित मूल्य की दुकान, मुटवा कला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
574	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	ग्राम पंचायत, मुटवा कला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
575	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	212 घरों के ग्रे-जल का प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
576	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	लीच पिट निर्माण- टैंक ओव्हरपलो के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

577	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	04 प्लेटफार्म एवं लीच पिट निर्माण-सभी हैण्डपंप के पास	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
578	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	नाली के अंदर गंदे जल का उपचार-रंजीत के घर के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
579	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	लीच पिट-राजाराम गोंड के घर के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
580	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	नाली के अंदर गंदे जल का उपचार-स्वामी यादव के घर के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
581	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	लीच पिट निर्माण-अनवर गोंड के घर के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
582	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	सभी आंतरिक मार्गों एवं मुख्य मार्ग पर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
583	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	स्कूल, पंचायत के प्रांगण में चारों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
584	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	खेतों की मड़ों पर फल-फूलदार पौधे लगाना	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
585	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	बोल्डर चैकडेम निर्माण कार्य, झिन्नु नाला, मुटवाकला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
586	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	ग्रेबियन चैकडेम निर्माण कार्य, गलगलहा नाला, मुटवाकला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
587	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	ग्रेबियन चैकडेम निर्माण कार्य, गलगलहा नाला, मुटवाकला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
588	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	स्टापडेम मरम्मत, शंकर जी स्थान	जल संरक्षण	NREGS 24-25	अप्रारंभ
589	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	ग्रेबियन चैकडेम, गलगलहा नाला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
590	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	ग्रेबियन चैकडेम, गलगलहा नाला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
591	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	ग्रेबियन चैकडेम, गलगलहा नाला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
592	मुटवाकला	मुटवाकला	मुटवाकला	मोटर संधारण कार्य, स्कूल का हैण्डपंप	पेयजल	GDPD 23-24	पूर्ण
593	जमुनहा	दिया	दिया	नवीन बोरेल खनन, मुक्तिधाम के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
594	जमुनहा	दिया	दिया	संप निर्माण, मुक्तिधाम के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
595	जमुनहा	दिया	दिया	ओव्हरहेड टैंक निर्माण, मुक्तिधाम के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
596	जमुनहा	दिया	दिया	जल वितरण पाईप विस्तार- ओव्हरहेड टैंक से संतू कु'वाहा के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
597	जमुनहा	दिया	दिया	जल वितरण पाईप विस्तार- ओव्हरहेड टैंक से रीता पाण्डेय के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
598	जमुनहा	दिया	दिया	नल कनेक्सन पाईप- रीता वाण्डेय के घर से वीरेन्द्र अहिरवार के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
599	जमुनहा	दिया	दिया	नल कनेक्सन पाईप- कैलास द्विवेदी के घर से नीरज द्विवेदी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
600	जमुनहा	दिया	दिया	नल कनेक्सन पाईप- हैण्डपंप से दया'ंकर द्विवेदी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
601	जमुनहा	दिया	दिया	नल कनेक्सन पाईप- नरेन्द्र पाण्डेय के घर से राम'रण के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
602	जमुनहा	दिया	दिया	नल कनेक्सन पाईप- किशोर लोधी के घर से रामऔतार पाण्डेय के घर होते हुये राममूरत के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
603	जमुनहा	दिया	दिया	नल कनेक्सन पाईप- राहुल त्रिपाठी के घर से अजय द्विवेदी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
604	जमुनहा	दिया	दिया	नल कनेक्सन पाईप- धर्मैन्द्र पाण्डेय के घर से रमाकांत लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ

605	जमुनहा	दिया	तक	नल कनेक्सन पाईप- राजकुमार लोधी के घर से मोहन लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
606	जमुनहा	दिया	तक	नल कनेक्सन पाईप- कोदूराम लोधी के घर से संतराम लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
607	जमुनहा	दिया	तक	नल कनेक्सन पाईप- शंकर जी चबूतरा से सुनील पाण्डेय के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
608	जमुनहा	दिया	तक	नल कनेक्सन पाईप- रामाचार्य द्विवेदी के घर से बबू लोधी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
609	जमुनहा	दिया	तक	नवीन वाल्व लगाना- रामाचार्य द्विवेदी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
610	जमुनहा	दिया	तक	नवीन वाल्व लगाना- कोदूलाल लोधी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
611	जमुनहा	दिया	तक	नवीन वाल्व लगाना- किशोर सिंह लोधी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
612	जमुनहा	दिया	तक	नवीन वाल्व लगाना- रीता पाण्डेय के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
613	जमुनहा	दिया	तक	228 घरों में नल कनेक्सन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	प्रगतिरत
614	जमुनहा	दिया	तक	प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
615	जमुनहा	दिया	तक	माध्यमिक स्कूल में नल कनेक्सन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
616	जमुनहा	दिया	तक	तलैया गहरीकरण एवं विस्तारीकरण- चैता वाली तलैया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
617	जमुनहा	दिया	तक	नाला गहरीकरण- सड़क से स्टापडेम तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
618	जमुनहा	दिया	तक	कूप जगत एवं मरम्तीकरण- शंकर जी के पास वाला कूप	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
619	जमुनहा	दिया	तक	कूप जगत एवं मरम्तीकरण- केदार के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
620	जमुनहा	दिया	तक	कूप जगत एवं मरम्तीकरण- राहुल त्रिपाठी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
621	जमुनहा	दिया	तक	कूप जगत एवं मरम्तीकरण- मुन्नीलाल के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
622	जमुनहा	दिया	तक	कूप जगत एवं मरम्तीकरण- बबू चौधरी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
623	जमुनहा	दिया	तक	कूप जगत एवं मरम्तीकरण- छोटे के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
624	जमुनहा	दिया	तक	कूप जगत एवं मरम्तीकरण- रोहणी पाण्डेय के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
625	जमुनहा	दिया	तक	ग्राम के 228 सभी घरों में ग्रे-जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
626	जमुनहा	दिया	तक	सभी 07 हैण्डपंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
627	जमुनहा	दिया	तक	प्रा. शाला में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
628	जमुनहा	दिया	तक	मा. शाला में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
629	जमुनहा	दिया	तक	प्रा. शाला में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
630	जमुनहा	दिया	तक	हाई स्कूल परिसर में किचेन गार्डन / लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
631	जमुनहा	दिया	तक	पौधरोपण- ललैया से जमुनहा तक सड़क के दोनों ओर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

क्र.सं.	जमुनहा	दिया	पौधरोपण मुक्तिधाम से वनखंड सीमा तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
632	जमुनहा	दिया	सार्वजनिक सिंचाई कूप निर्माण, सामुदायिक भवन के पास, जमुनिहा	पेयजल	NREGS 24-25	अप्रारंभ
633	जमुनहा	दिया	परकुलेशन टैंक निर्माण, राजाभैया के खेत के पास, जमुनिहा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
634	जमुनहा	दिया	सार्वजनिक कूप निर्माण कार्य, जमुनिहा	पेयजल	GPDP 24-25	अप्रारंभ
635	देवरी	देवरी	बोरवेल को संप से जोड़ना- बस स्टैण्ड के पास स्थित बोरवेल	पेयजल	VAP	पूर्ण
636	देवरी	देवरी	मुख्य पाईप का विस्तार- बस स्टैण्ड से रनवाहा रोड मंगल सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
637	देवरी	देवरी	नल कनेक्सन पाईप विस्तार- टंकी से भठिया टोला तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
638	देवरी	देवरी	नल कनेक्सन पाईप विस्तार- बस स्टैण्ड से टंकी तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
639	देवरी	देवरी	नल कनेक्सन पाईप विस्तार- हिममत दास के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
640	देवरी	देवरी	नल कनेक्सन पाईप विस्तार- शिवपाल राजपूत के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
641	देवरी	देवरी	नल कनेक्सन पाईप विस्तार- यादव टोला में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
642	देवरी	देवरी	नल कनेक्सन पाईप विस्तार- सुरेन्द्र यादव के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
643	देवरी	देवरी	नल कनेक्सन पाईप विस्तार- टंटा डीमर के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
644	देवरी	देवरी	नल कनेक्सन पाईप विस्तार- हरि दयाल के घर से लंपा के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
645	देवरी	देवरी	पाईप काटकर इंड कैप लगाना- प्रकाश कोरी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
646	देवरी	देवरी	पाईप काटकर इंड कैप लगाना- मुन्ना डा0 साहब के घर के पास मुख्य पाईप लाईन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
647	देवरी	देवरी	पाईप काटकर इंड कैप लगाना- श्यामसुन्दर के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
648	देवरी	देवरी	पाईप काटकर इंड कैप लगाना- मनोज पाठक, हरप्रसाद उपसरपंच एवं रमाकांत के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
649	देवरी	देवरी	पाईप काटकर इंड कैप लगाना- मंगल सिंह के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
650	देवरी	देवरी	पाईप काटकर इंड कैप लगाना- मुन्ना सोनी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
651	देवरी	देवरी	मुख्य पाईप से नलकनेक्सन पाईप जोड़ना- प्रकाश कोरी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
652	देवरी	देवरी	मुख्य पाईप से नलकनेक्सन पाईप जोड़ना- श्यामसुन्दर के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
653	देवरी	देवरी	मुख्य पाईप से नलकनेक्सन पाईप जोड़ना- मनोज पाठक, हरप्रसाद उपसरपंच एवं रमाकांत के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
654	देवरी	देवरी	मुख्य पाईप से नलकनेक्सन पाईप जोड़ना- मंगल सिंह के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
655	देवरी	देवरी	मुख्य पाईप से नलकनेक्सन पाईप जोड़ना- मुन्ना सोनी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
656	देवरी	देवरी	मुख्य पाईप से नलकनेक्सन पाईप जोड़ना- मुन्ना सोनी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
657	देवरी	देवरी	वाल्व लगाना- मुख्य पाईप से वितरण पाईप के सभी जोड़ में	पेयजल	VAP	अप्रारंभ

658	देवरी	देवरी	देवरी	140 घरों में नल कनेक्शन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
659	देवरी	देवरी	देवरी	सभी घरों के कनेक्शन घर के अंदर करना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
660	देवरी	देवरी	देवरी	तालाब की साफ-सफाई/गहरीकरण- ग्राम का तालाब	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
661	देवरी	देवरी	देवरी	तलैया की साफ सफाई/गहरीकरण- ग्राम की तलैया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
662	देवरी	देवरी	देवरी	तलैया की साफ सफाई/गहरीकरण- मठली की तलैया	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
663	देवरी	देवरी	देवरी	कूपों की साफ-सफाई- सभी सार्वजनिक एवं निजी कूप	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
664	देवरी	देवरी	देवरी	प्राथमिक स्कूल, में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
665	देवरी	देवरी	देवरी	माध्यमिक स्कूल में पाईप एवं लीच पिट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
666	देवरी	देवरी	देवरी	आंगनवाड़ी केन्द्र में पाईप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
667	देवरी	देवरी	देवरी	ग्राम के सभी घरों में ग्रे-जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
668	देवरी	देवरी	देवरी	सभी 10 हैण्डपंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
669	देवरी	देवरी	देवरी	प्रा. शाला में किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
670	देवरी	देवरी	देवरी	माध्यमिक स्कूल में किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
671	देवरी	देवरी	देवरी	आंगनवाड़ी केन्द्र में किचन गार्डन/लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
672	देवरी	देवरी	देवरी	पौधरोपण- देवरी रोड़ में दोनों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
673	अकोला	जर्धोवा	जर्धोवा	पौधरोपण, झिना नाला अकोला	जल संरक्षण	NREGS 24-25	अप्रारंभ
674	अकोला	जर्धोवा	जर्धोवा	चेक डैम निर्माण झिना नाला ग्राम अकोला भाग 2	जल संरक्षण	NREGS 24-25	अप्रारंभ
675	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	चेक डैम निर्माण अम्हाई	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
676	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	टंकी निर्माण अम्हाई	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
677	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	गंदे पानी का प्रबंधन NA	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
678	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार टंकी से बेबी रानी के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
679	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	नवीन वाल्व सभी चेंबर में ठकने की जरूरत है	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
680	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	वाल्व के चेम्बर बनाना 7 घरों में नल कनेक्शन एवम स्टैंड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
681	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	नल कनेक्शन प्राथमिक स्कूल	पेयजल	VAP	पूर्ण
682	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	नल जल कनेक्शन स्टॉप डेम में गेट लगाना खेर माता में	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
683	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	कोई नहीं छपरा में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
684	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	स्टाप डैम निर्माण प्रीतम सिंह के खेत पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
685	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	स्टाप डैम निर्माण प्रीतम सिंह के खेत पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
686	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	तालाब सफाई/गहरीकरण मिट्टू के घर पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
687	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	सार्वजनिक कूप निर्माण प्राथमिक स्कूल ,आंगनवाड़ी केंद्र	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
688	अमहाई	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	रूप टाप जल संरक्षण सभी के ग्रे जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

689	अमहाई	लक्ष्मीपुर	गंदे पानी का प्रबंधन अमहाई मोड से ग्राम तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
690	अमहाई	लक्ष्मीपुर	वृक्षारोपण आगनवाड़ी केंद्र ,प्राथमिक स्कूल	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
691	ऊटन	विरवाही	किचेन गार्डन गहडारी नाला	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
692	ऊटन	विरवाही	श्रेवियन संरचना निर्माण बीरेंद्र पांडे के घर से गौरी शंकर के मकान तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
693	ऊटन	विरवाही	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार बीरेंद्र पांडे के घर से गुलजारी लाल प्रजापति के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
694	ऊटन	विरवाही	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार हरप्रसाद के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
695	ऊटन	विरवाही	नवीन वाल्व किशोरी साहू के मकान के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
696	ऊटन	विरवाही	नवीन वाल्व कंकेशन सेशेष रह गए घर	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
697	ऊटन	विरवाही	नल जल कनेक्शन माध्यमिक स्कूल	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
698	ऊटन	विरवाही	नल जल कनेक्शन हॉयर सेकेंडरी स्कूल	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
699	ऊटन	विरवाही	नल जल कनेक्शन ग्राम के सभी कनेक्शनों	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
700	ऊटन	विरवाही	नवीन स्टाप डैम निर्माण नाउ घट ऊटन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
701	ऊटन	विरवाही	स्टाप डैम मरम्मत किनारा कटाव सुधार माध्यमिक शाला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
702	ऊटन	विरवाही	लीच पिट निर्माण हॉयर सेकेंडरी स्कूल में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
703	ऊटन	विरवाही	लीच पिट निर्माण ग्राम के सभी घरों में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
704	ऊटन	विरवाही	गंदे पानी का प्रबंधन ग्राम के सभी हैंडपंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
705	ऊटन	विरवाही	लीच पिट निर्माण माध्यमिक शाला	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
706	ऊटन	विरवाही	किचेन गार्डन हॉयर सेकेंडरी स्कूल में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
707	ऊटन	विरवाही	किचेन गार्डन संपूर्ण ग्राम की नली सफाई कार्य	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
708	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	स्टाप डैम निर्माण Jagannath ke khwet ke pass	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
709	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	स्टाप डैम निर्माण Gahradi nala	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
710	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	श्रेवियन संरचना निर्माण Gahradi nala	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
711	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	श्रेवियन स्ट्रक्चर गहरी नाला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
712	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	श्रेवियन संरचना निर्माण गहराडी नाला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
713	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	श्रेवियन स्ट्रक्चर कोढन पुरवा	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
714	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	टंकी निर्माण कोढन पुरवा	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
715	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार कोढन पुरवा	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
716	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार कोढन पुरवा	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
717	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार कोढन पुरवा	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
718	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	नवीन वाल्व कोढन पुरवा	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
719	कोढनपुरवा	रानीगंजपुरवा	नल जल कनेक्शन कोढन पुरवा	पेयजल	VAP	अप्रारंभ

720	गुखौर	गुखौर	गुखौर	तालाब सफाई/गहरीकरण गुखौर	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
721	गुखौर	गुखौर	गुखौर	मोटर सुधार गुखौर	पेयजल	GPDP 24-25	अप्रारंभ
722	गुखौर	गुखौर	गुखौर	मोटर सुधार गुखौर	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
723	गुखौर	गुखौर	गुखौर	चेक डैम निर्माण गुखौर	पेयजल	GPDP 24-25	अप्रारंभ
724	गुखौर	गुखौर	गुखौर	टंकी निर्माण गुखौर	पेयजल	GPDP 24-25	अप्रारंभ
725	गुखौर	गुखौर	गुखौर	सार्वजनिक कूप निर्माण गुखौर	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
726	गुखौर	गुखौर	गुखौर	अमृत वाटिका गुखौर	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
727	गुखौर	गुखौर	गुखौर	ग्रेवियन स्ट्रक्चर गुखौर	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
728	गुखौर	गुखौर	गुखौर	ग्रेवियन संरचना निर्माण गुखौर	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
729	गुखौर	गुखौर	गुखौर	अमृत वाटिका गुखौर	जल संरक्षण	GPDP 23-24	प्रगतिरत
730	गुखौर	गुखौर	गुखौर	ग्रेवियन स्ट्रक्चर गुखौर	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
731	गुखौर	गुखौर	गुखौर	ग्रेवियन स्ट्रक्चर आशाराम यादव के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
732	गुखौर	गुखौर	गुखौर	पाइप लाइन सुधार चन्द्रिका के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
733	गुखौर	गुखौर	गुखौर	पाइप लाइन सुधार अशोक के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
734	गुखौर	गुखौर	गुखौर	पाइप लाइन सुधार पर्वत के घर के पास भुइहा लाइन को	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
735	गुखौर	गुखौर	गुखौर	पाइप लाइन सुधार सुदामा के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
736	गुखौर	गुखौर	गुखौर	पाइप लाइन सुधार सुदामा के घर के पास आदिवासी टोले की लाइन को	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
737	गुखौर	गुखौर	गुखौर	पाइप लाइन सुधार मिडिल स्कूल के पास छोटी गुखौर लाइन को	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
738	गुखौर	गुखौर	गुखौर	पाइप लाइन सुधार सुरेश के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
739	गुखौर	गुखौर	गुखौर	पाइप लाइन सुधार बन्नी कुशवाहा के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
740	गुखौर	गुखौर	गुखौर	लीच पिट निर्माण अशोक के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
741	गुखौर	गुखौर	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार भूइहा लाइन को	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
742	गुखौर	गुखौर	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार सुदामा के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
743	गुखौर	गुखौर	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार मिडिल स्कूल के पास बाल्व के पूर्व छोटी गुखौर लाइन को	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
744	गुखौर	गुखौर	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार सुदामा के घर के पास आदिवासी टोले की पाइप	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
745	गुखौर	गुखौर	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार बाबू लाल कोरी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
746	गुखौर	गुखौर	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार प्राथमिक शाला गुखौर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
747	गुखौर	गुखौर	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार गोपाल के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
748	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन बाल्व माध्यमिक स्कूल के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
749	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन बाल्व सुरेश दहायत के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ

750	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन वाल्व सुदामा के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
751	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन वाल्व चंद्रिका के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
752	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन वाल्व बाबू लाल कोरी के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
753	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन वाल्व 379 घरों में नल कनेक्शन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
754	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नल जल कनेक्शन कनेक्शन युक्त 421 घरों में टोटी लगाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
755	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नल जल कनेक्शन कनेक्शन युक्त सभी घरों में स्टेण्ड पोस्ट बनाना	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
756	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नल जल कनेक्शन धनहा नाला राम सिपाही के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
757	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन स्टाप डैम निर्माण गडरहा नाला में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
758	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन स्टाप डैम निर्माण सारंग नाला में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
759	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नवीन स्टाप डैम निर्माण राजापुर वीहर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
760	गुखौर	गुखौर	गुखौर	तालाब सफाई/गहरीकरण सारंग नाला 1में लगा 2 शेय	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
761	गुखौर	गुखौर	गुखौर	स्टाप डैम में गेट लगाना प्राथमिक स्कूल में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
762	गुखौर	गुखौर	गुखौर	लीच पिट निर्माण प्राथमिक शाला छोटी गुखौर में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
763	गुखौर	गुखौर	गुखौर	रूफ टाप जल संरक्षण माध्यमिक स्कूल में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
764	गुखौर	गुखौर	गुखौर	रूफ टाप जल संरक्षण हाई स्कूल में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
765	गुखौर	गुखौर	गुखौर	रूफ टाप जल संरक्षण उप स्वास्थ्य केंद्र में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
766	गुखौर	गुखौर	गुखौर	रूफ टाप जल संरक्षण आगनवाड़ी नई बस्ती में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
767	गुखौर	गुखौर	गुखौर	रूफ टाप जल संरक्षण आगनवाड़ी छोटी गुखौर में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
768	गुखौर	गुखौर	गुखौर	रूफ टाप जल संरक्षण आगनवाड़ी आदिवासी टोला में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
769	गुखौर	गुखौर	गुखौर	रूफ टाप जल संरक्षण ग्राम के सभी घरों में ग्रे जल का प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
770	गुखौर	गुखौर	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन सभी हैंड पंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
771	गुखौर	गुखौर	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन सभी हैंड पम्प में किचिन गार्डन / एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
772	गुखौर	गुखौर	गुखौर	स्टाप डैम मरम्मत किनारा कटाव सुधार माध्यमिक स्कूल में किचिन गार्डन / एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
773	गुखौर	गुखौर	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन हाई स्कूल में किचिन गार्डन / एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
774	गुखौर	गुखौर	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन ग्राम पंचायत में किचिन गार्डन / एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
775	गुखौर	गुखौर	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन उप स्वास्थ्य केंद्र में किचिन गार्डन / एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
776	गुखौर	गुखौर	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन संपूर्ण गांव	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
777	गुखौर	गुखौर	गुखौर	कोई नहीं माध्यमिक स्कूल से कंछेदी यादव भूडहा मोहल्ला तक	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
778	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नालियों को ढकना/बंद करना बाबू के घर से चंद्रिका लोनिया के घर तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

779	गुखौर	गुखौर	गुखौर	नाली निर्माण एवं ढक्कन जल संग्रहण टैंक के पास विजली घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
780	गुखौर	गुखौर	गुखौर	लीच पिट निर्माण कृष्णा डेयरी से जगदेव लाल के घर तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
781	गुखौर	गुखौर	गुखौर	आंतरिक मार्गों के किनारे फल फूल दार पौधे लगाना ग्राम स्वराज्य भवन से शांति धाम तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
782	गुखौर	गुखौर	गुखौर	स्टाप डैम मरम्मत किनारा कटाव सुधार हाई स्कूल से नई बस्ती तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
783	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	कोई नहीं पलथरा नाला जरधोवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
784	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	चेक डैम निर्माण खिन्न नाला भाग 2	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
785	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	चेक डैम निर्माण स्वामी गोंड के खेत पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
786	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	खेत तालाब मंदिर नाला ग्राम पंचायत जरधोवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
787	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	चेक डैम निर्माण बहेरिया ग्राम पंचायत जरधोवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
788	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	चेक डैम निर्माण पानी की टंकी के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
789	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	पाइप लाइन सुधार पानी की टंकी के पास	पेयजल	VAP	पूर्ण
790	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	सम्प में लगा भराई संकेतक में सुधार माध्यमिक विद्यालय से नया पुरा टोले में बखत सिंह के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
791	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार नया पुरा में बिहारी के घर के पास नवीन वाल्व	पेयजल	VAP	पूर्ण
792	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	नवीन वाल्व ठाकुरास टोले में वीरनसिंह के घर पास वाल्व	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
793	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	नवीन वाल्व कलारन टोला	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
794	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	नल जल कनेक्शन आंगनवाड़ी	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
795	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	नल जल कनेक्शन बहेरिया नाला राजेंद्र सिंह राजगोंड के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
796	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	स्टाप डैम में गेट लगाना कसैला नाला भूलन माता मंदिर के पास	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
797	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	स्टाप डैम में गेट लगाना हर्षा घाट तालाब	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
798	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	तालाब सफाई/गहरीकरण बल्लेव सागर तालाब 2	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
799	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	तालाब सफाई/गहरीकरण देवी सागर तालाब	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
800	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	तालाब सफाई/गहरीकरण नया तालाब	जल संरक्षण	VAP	प्रगतिरत
801	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	तालाब सफाई/गहरीकरण बाबूसिंह सिंह के खेत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
802	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	तालाब सफाई/गहरीकरण प्राथमिक स्कूल जरधोवा	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
803	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	रूफ टाप जल संरक्षण माध्यमिक स्कूल जरधोवा	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
804	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	रूफ टाप जल संरक्षण आगनवाड़ी केंद्र जरधोवा	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
805	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	रूफ टाप जल संरक्षण ग्राम पंचायत भवन जरधोवा	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
806	जरधोवा	जरधोवा	जरधोवा	रूफ टाप जल संरक्षण उप स्वास्थ्य केन्द्र जरधोवा	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
807	दुबहियां	सुन्दरा	सुन्दरा	रूफ टाप जल संरक्षण Dubahiya me ped ke pas	पेयजल	VAP	प्रगतिरत
808	दुबहियां	सुन्दरा	सुन्दरा	मोटर सुधार नीम के पेड़ के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ

809	दुबहियां	सुन्दरा	नवीन बोर वेल खोत से संप में जल भरने के स्थान को ढकना	वेयजल	VAP	पूर्ण
810	दुबहियां	सुन्दरा	सम्प में लगा भराई सकेतक में सुधार सम्प से रामगढ़ी तक नवीन पाइप लाइन विद्यना	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
811	दुबहियां	सुन्दरा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार संप का सीपेज दूर करना	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
812	दुबहियां	सुन्दरा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार संप में गंदा जल घुसने से रोकना	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
813	दुबहियां	सुन्दरा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार काशी प्रसाद गौतम के घर के पास	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
814	दुबहियां	सुन्दरा	नवीन वाल्व ग्राम में लगे सभी वाल्व	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
815	दुबहियां	सुन्दरा	वाल्व के चेम्बर बनाना 13 घरों में नल कनेक्शन एवं पोस्ट स्टैण्ड	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
816	दुबहियां	सुन्दरा	नल जल कनेक्शन संप बेल के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
817	दुबहियां	सुन्दरा	नवीन स्टाप डैम निर्माण राम गढ़ी के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
818	दुबहियां	सुन्दरा	नवीन स्टाप डैम निर्माण सभी कूपो की	वेयजल	VAP	प्रगतिरत
819	दुबहियां	सुन्दरा	रूफ टाप जल संरक्षण आंगन वादी केंद्र में पाइप एवं लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
820	दुबहियां	सुन्दरा	रूफ टाप जल संरक्षण ग्राम के सभी घरों में ग्रे जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
821	दुबहियां	सुन्दरा	गंदे पानी का प्रबंधन सभी 03 हैंड पंपों के पास	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
822	दुबहियां	सुन्दरा	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण आंगन वादी केंद्र में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
823	दुबहियां	सुन्दरा	वृक्षारोपण मुख्य मार्ग के दोनो किनारे	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
824	पल्थरा	रहिनियां	वृक्षारोपण पल्थरा	जल संरक्षण	NREGS 24-25	पूर्ण
825	पल्थरा	रहिनियां	तालाब सफाई/गहरीकरण पल्थरा	वेयजल	GPDP 24-25	अप्रारंभ
826	पल्थरा	रहिनियां	सार्वजनिक कूप निर्माण पल्थरा	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
827	पल्थरा	रहिनियां	तालाब सफाई/गहरीकरण पल्थरा	जल संरक्षण	GPDP 24-25	अप्रारंभ
828	पल्थरा	रहिनियां	चेक डैम सुधार नवीन खोत मोटर पंप का सुधार कार्य	वेयजल	VAP	पूर्ण
829	पल्थरा	रहिनियां	मोटर सुधार प्राथमिक स्कूल से भान सिंह के घर तक	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
830	पल्थरा	रहिनियां	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार प्राथमिक स्कूल ,भान सिंह के घर से डाली जाने वाली पाइप लाइन में	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
831	पल्थरा	रहिनियां	नवीन वाल्व गंभीर सिंह के दुकान के पास दोनो तरफ की लाइन में	वेयजल	VAP	पूर्ण
832	पल्थरा	रहिनियां	नवीन वाल्व 3 घरों में नल जल कनेक्शन एवम स्टैंड पोस्ट	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
833	पल्थरा	रहिनियां	नल जल कनेक्शन आंगन वादी केंद्र में नल जल कनेक्शन एवम स्टैंड पोस्ट	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
834	पल्थरा	रहिनियां	नल जल कनेक्शन घर से दूर लगे कनेक्शन को बाउंड्री के अंदर देना	वेयजल	VAP	पूर्ण
835	पल्थरा	रहिनियां	नल कनेक्शन सभी स्टैंड पोस्ट को सरिया लगा कर बनाना	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
836	पल्थरा	रहिनियां	नल जल कनेक्शन रूप सिंह ,फूल सिंह का कनेक्शन काटना	वेयजल	VAP	अप्रारंभ
837	पल्थरा	रहिनियां	नल जल कनेक्शन शिव सिंह के खेत पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
838	पल्थरा	रहिनियां	तालाब सफाई/गहरीकरण गुलाब सिंह के खेत पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

839	पल्थरा	रहूनियां	खेत तालाब कन्हैया खेत पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
840	पल्थरा	रहूनियां	चेक डैम सुधार रूप सिंह के खेत पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
841	पल्थरा	रहूनियां	चेक डैम निर्माण महुप सिंह के खेत से प्रताप सिंह खेत तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
842	पल्थरा	रहूनियां	नाला सफाई प्राथमिक स्कूल	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
843	पल्थरा	रहूनियां	रूफ टाप जल संरक्षण आंगन वाड़ी केंद्र	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
844	पल्थरा	रहूनियां	रूफ टाप जल संरक्षण सभी घरों के ग्रे जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
845	पल्थरा	रहूनियां	गंदे पानी का प्रबंधन भारत सिंह के घर पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
846	पल्थरा	रहूनियां	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण गंभीर सिंह के दुकान पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
847	पल्थरा	रहूनियां	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण सार्वजनिक कूप के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
848	पल्थरा	रहूनियां	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण प्राथमिक स्कूल में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
849	पल्थरा	रहूनियां	किचन गार्डन आंगन वाड़ी केंद्र पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
850	पल्थरा	रहूनियां	किचन गार्डन सम्पूर्ण ग्राम की नाली ढकना	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
851	फुलदरी	फुलवारी	टंकी निर्माण फूलवारी नाला के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
852	फुलदरी	फुलवारी	ग्रेवियन संरचना निर्माण फुलवारी नाला 2	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
853	फुलदरी	फुलवारी	ग्रेवियन संरचना निर्माण फुलवारी नाला 3	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
854	फुलदरी	फुलवारी	ग्रेवियन संरचना निर्माण फुलवारी नाला के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
855	फुलदरी	फुलवारी	ग्रेवियन संरचना निर्माण बोर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
856	फुलदरी	फुलवारी	टंकी निर्माण बोर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
857	फुलदरी	फुलवारी	पंप हाउस निर्माण बोर से लाल जी गौतम के घर तक नवीन पाइप लाइन डालना	पेयजल	VAP	पूर्ण
858	फुलदरी	फुलवारी	शौच ऊर्जा संयंत्र की स्थापना करना बोर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
859	फुलदरी	फुलवारी	वृक्षारोपण लखन लाल गौतम के खेत में दोनों तरफ	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
860	फुलदरी	फुलवारी	अमृत वाटिका राम नारायण बागरी के खेत में 1 एकड़	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
861	फुलदरी	फुलवारी	अमृत वाटिका सभी घरों में 60 रुपए माह जल कर देना	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
862	फुलदरी	फुलवारी	जल कर संग्रहण प्रबंधन बाबूलाल के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
863	फुलदरी	फुलवारी	नवीन स्टाप डैम निर्माण धूप कुमार मिश्रा के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
864	फुलदरी	फुलवारी	नवीन स्टाप डैम निर्माण बड़े देव के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
865	फुलदरी	फुलवारी	नवीन स्टाप डैम निर्माण टिकुरा	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
866	फुलदरी	फुलवारी	नवीन तालाब निर्माण प्राथमिक स्कूल में पाइप लाइन एवं लीच पिट निर्माण	पेयजल	VAP	पूर्ण
867	फुलदरी	फुलवारी	रूफ टाप जल संरक्षण आंगन वाड़ी केंद्र में पाइप लाइन एवं लीच पिट निर्माण	पेयजल	VAP	पूर्ण
868	फुलदरी	फुलवारी	रूफ टाप जल संरक्षण ग्राम के सभी घरों में ग्रे जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
869	फुलदरी	फुलवारी	गंदे पानी का प्रबंधन सभी 4 हैड पंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

870	फुलदरी	फुलवारी	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण बालक प्राथमिक शाला में किचन गार्डन	VAP	अप्रारंभ
871	फुलदरी	फुलवारी	किचन गार्डन लाल जी गौतम के घर के पास पुरानी पाइप लाइन काटकर बंद करना	VAP	पूर्ण
872	फुलदरी	फुलवारी	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार लाल जी गौतम के घर के पास वितरण लाइन के दोनो सिरों को नवीन पाइप से जोड़ना	VAP	पूर्ण
873	फुलदरी	फुलवारी	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार लाल जी गौतम के घर के पास वितरण लाइन के सिरों पर बाल्व लगाना	VAP	अप्रारंभ
874	फुलदरी	फुलवारी	नवीन बाल्व 08 घरों में नल कनेक्शन	VAP	अप्रारंभ
875	फुलदरी	फुलवारी	नल जल कनेक्शन 78 घरों में पोस्ट स्टैण्ड	VAP	अप्रारंभ
876	फुलदरी	फुलवारी	नल जल कनेक्शन सभी नल कनेक्शन में टोटी लगाना	VAP	अप्रारंभ
877	बमुरहिया	बिरवाही	नल जल कनेक्शन ठाकुर बाबा के पास	VAP	पूर्ण
878	बमुरहिया	बिरवाही	मोटर सुधार सकील के खेत के पास	NREGS 24-25	अप्रारंभ
879	बमुरहिया	बिरवाही	स्टाप डैम मरम्मत किनारा कटाव सुधार स्कूल के पास	VAP	अप्रारंभ
880	बमुरहिया	बिरवाही	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार दिनेश के घर के पास	VAP	अप्रारंभ
881	बमुरहिया	बिरवाही	पाइप लाइन सुधार दिनेश के घर के पास	VAP	अप्रारंभ
882	बमुरहिया	बिरवाही	पाइप लाइन सुधार बोर के पास दोनों लाइन में	VAP	अप्रारंभ
883	बमुरहिया	बिरवाही	नवीन बाल्व प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला	VAP	अप्रारंभ
884	बमुरहिया	बिरवाही	नल जल कनेक्शन स्कूल के सामने मेधाशन नदी में, सकील के खेत के पास	VAP	अप्रारंभ
885	बमुरहिया	बिरवाही	स्टाप डैम निर्माण गांधी चौक के पास स्थित कूप	VAP	अप्रारंभ
886	बमुरहिया	बिरवाही	गंदे पानी का प्रबंधन सभी 05 हैंड पंपों के पास	VAP	अप्रारंभ
887	बमुरहिया	बिरवाही	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण प्राथमिक शाला में	VAP	अप्रारंभ
888	बमुरहिया	बिरवाही	किचन गार्डन माध्यमिक शाला में	VAP	अप्रारंभ
889	बमुरहिया	बिरवाही	किचन गार्डन बीरन के घर के पास ढकी हुई नली निर्माण	VAP	अप्रारंभ
890	बहेरा	जनवार	मोटर सुधार Bahera	VAP	अप्रारंभ
891	बहेरा	जनवार	टंकी निर्माण Bahera	VAP	अप्रारंभ
892	बहेरा	जनवार	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार Bahera	VAP	अप्रारंभ
893	बहेरा	जनवार	नल कनेक्शन Bahera	VAP	अप्रारंभ
894	बहेरा	जनवार	तालाब सफाई/गहरीकरण Bahera	VAP	अप्रारंभ
895	बहेरा	जनवार	चेक डैम निर्माण Bahera	VAP	अप्रारंभ
896	बहेरा	जनवार	रूफ टाप जल संरक्षण Bahera	VAP	अप्रारंभ
897	बहेरा	जनवार	लीच पिट निर्माण Bahera	VAP	अप्रारंभ
898	बहेरा	जनवार	रूफ टाप जल संरक्षण Bahera	VAP	अप्रारंभ

899	बहेरा	जनवार	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण Bahera	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
900	बहेरा	जनवार	लीच पिट निर्माण Bahera	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
901	बहेरा	जनवार	लीच पिट निर्माण Bahera	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
902	मनकी	मनकी	वृक्षारोपण गीता बाई के खेत के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
903	मनकी	मनकी	शेवियन स्ट्रक्चर लीले सिंह के खेत के पास मनकी	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
904	मनकी	मनकी	शेवियन स्ट्रक्चर केरवन नाला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
905	मनकी	मनकी	चेक डैम निर्माण कोशम नाला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
906	मनकी	मनकी	चेक डैम निर्माण रिछाई नाला	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
907	मनकी	मनकी	चेक डैम निर्माण अभय के खेत के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
908	मनकी	मनकी	शेवियन स्ट्रक्चर फुट्टा नाला के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
909	मनकी	मनकी	शेवियन स्ट्रक्चर रावेन्द्र सिंह यादव के खेत के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
910	मनकी	मनकी	खेत तालाब फुट्टता नाला बुद्धि गौड़ के खेत के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
911	मनकी	मनकी	शेवियन स्ट्रक्चर फुट्टा नाला महेंद्र सिंह के खेत के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
912	मनकी	मनकी	शेवियन स्ट्रक्चर संपत बाई के खेत के पास	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
913	मनकी	मनकी	शेवियन स्ट्रक्चर होरी तालाब	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
914	मनकी	मनकी	नाला सफाई हरि लाल के घर के पास ।	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
915	मनकी	मनकी	खेत तालाब चबूतरा के पास ।	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
916	मनकी	मनकी	मेड़ बंधान रमेश के घर के पास।	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
917	मनकी	मनकी	तालाब सफाई/गहरीकरण मनकी	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
918	मनकी	मनकी	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार माध्यमिक शाला।	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
919	मनकी	मनकी	चेक डैम निर्माण आंगनबाड़ी केंद्र।	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
920	मनकी	मनकी	नल कनेक्शन बन चौकी p	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
921	मनकी	मनकी	नवीन स्टाप डैम निर्माण सासुदायिक भवन ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
922	मनकी	मनकी	शेवियन संरचना निर्माण सैदा नाला ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
923	मनकी	मनकी	सार्वजनिक कूप निर्माण मोटे की तलैया ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
924	मनकी	मनकी	नवीन वाल्व कोडन की तलैया ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
925	मनकी	मनकी	गंदे पानी का प्रबंधन खजलाऊ की तलैया ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
926	मनकी	मनकी	सार्वजनिक कूप निर्माण मंटोला की तलैया ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
927	मनकी	मनकी	स्टाप डैम मरम्मत किनारा कटाव सुधार करोदा घाट ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
928	मनकी	मनकी	तालाब सफाई/गहरीकरण भटन से मुडिया तक ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
929	मनकी	मनकी	नाला सफाई प्राथमिक शालास्कूल ।	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ

930	मनकी	मनकी	सर्वजनिक कूप निर्माण आंगनबाड़ी के पास ।	जल संरक्षण	GDPP 23-24	अप्रारंभ
931	मनकी	मनकी	लीच पिट निर्माण मनकी	पेयजल	GDPP 23-24	पूर्ण
932	मनकी	मनकी	नवीन बोर वेल शौकी लाल के खेत के पास ।	जल संरक्षण	GDPP 23-24	अप्रारंभ
933	मुराछ	देवरी	खेत तालाब सगंधार नाला मुराछ	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
934	मुराछ	देवरी	चेक डैम निर्माण छपरा घाट मुराछ	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
935	मुराछ	देवरी	चेक डैम निर्माण सुरा घाट मुराछ	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
936	मुराछ	देवरी	ग्रेवियन स्ट्रक्चर रपटना मुराछ	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
937	मुराछ	देवरी	ग्रेवियन स्ट्रक्चर तरैया परैया नाला मुराछ	जल संरक्षण	NREGS 24-25	पूर्ण
938	मुराछ	देवरी	स्टाप डैम में गेट लगाना नाउ तलैया मुराछ	जल संरक्षण	NREGS 24-25	प्रगतिरत
939	मुराछ	देवरी	तालाब सफाई/गहरीकरण Murachh	जल संरक्षण	GDPP 23-24	अप्रारंभ
940	मुराछ	देवरी	स्टाप डैम निर्माण Murachh	जल संरक्षण	GDPP 24-25	अप्रारंभ
941	मुराछ	देवरी	स्टाप डैम निर्माण 1.चंदन यादव के घर से गिरधारी आहिरवार के घर तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
942	मुराछ	देवरी	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार टंकी से गुमान सिंह के घर तक।	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
943	मुराछ	देवरी	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार गुमान सिंह के घर के पास पुरानी पाइप काटकर इंड कैप लगाना एवं पाइप लाइन से जोडना।	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
944	मुराछ	देवरी	नवीन वाल्व गुमान सिंह के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
945	मुराछ	देवरी	नवीन वाल्व चंदन सिंह के घर के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
946	मुराछ	देवरी	नवीन वाल्व चौपडा मरम्मत सफाई। टंकी के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
947	मुराछ	देवरी	किचेन गार्डेन आंगनबाड़ी केंद्र में किचेन गार्डेन /लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
948	मुराछ	देवरी	किचेन गार्डेन आंगनबाड़ी केंद्र में किचेन गार्डेन लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
949	मुराछ	देवरी	किचेन गार्डेन नालियों को ढकना एवं सड़क से नीचे करना। जमींदार टोले में कोई नहीं रतगुवां	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
950	रतगवां	गुखौर	टंकी निर्माण रतगुवां	पेयजल	GDPP 23-24	अप्रारंभ
951	रतगवां	गुखौर	टंकी निर्माण रतगुवां	पेयजल	GDPP 24-25	अप्रारंभ
952	रतगवां	गुखौर	टंकी निर्माण प्राथमिक स्कूल के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
953	रतगवां	गुखौर	नवीन बोर वेल प्राथमिक स्कूल के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
954	रतगवां	गुखौर	टंकी निर्माण बोरवेल से संप तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
955	रतगवां	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार बहु ग्राम पाइप लाइन से संप तक	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
956	रतगवां	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार ओल्हरहेड टैंक से रामनाथ रजक के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
957	रतगवां	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार राजाराम रजक के घर से जगदीश रजक के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
958	रतगवां	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार इन्द्रपाल के टूटे घर से बैजू रजक के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण
959	रतगवां	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार रोड से रामचरण के घर तक	पेयजल	VAP	पूर्ण

960	रतगवां	गुखौर	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार ओव्हरहेड टैंक के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
961	रतगवां	गुखौर	नवीन वाल्व 55 घरों में नल कनेक्शन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
962	रतगवां	गुखौर	नल जल कनेक्शन प्रथमिक स्कूल मेरा नल कनेक्शन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
963	रतगवां	गुखौर	नल जल कनेक्शन मशान के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
964	रतगवां	गुखौर	तालाब सफाई/गहरीकरण संतोष रजक के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
965	रतगवां	गुखौर	नवीन स्टाप डैम निर्माण हरीराम रजक के खेत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
966	रतगवां	गुखौर	खेत तालाब दरवारी लाल रजक के खेत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
967	रतगवां	गुखौर	खेत तालाब संतोष रजक के तलवा हार में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
968	रतगवां	गुखौर	मेड़ बंधान छोटेलाल रजक के खेत सरोता हार में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
969	रतगवां	गुखौर	मेड़ बंधान ग्राम के सभी घरों में ग्रे जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
970	रतगवां	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन ग्राम के सभी घरों में ग्रे जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
971	रतगवां	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन ग्राम के सभी घरों में ग्रे जल प्रबंधन	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
972	रतगवां	गुखौर	गंदे पानी का प्रबंधन सभी 02 हैण्डपंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
973	रतगवां	गुखौर	हैण्डपंप एवं लीच पिट निर्माण प्रा. शाला में किचन गार्डन /लीच पिट निर्माण	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
974	रतगवां	गुखौर	किचन गार्डन सम्पूर्ण ग्राम में जहां शीप	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
975	रतगवां	गुखौर	रूफ टाप जल संरक्षण जल संग्रहण टैंक के पास, विजली घर	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
976	रतगवां	गुखौर	नवीन ट्रांसफार्मर लगाना 1 नाले से पुष्पेन्द्र रजक के घर तक 2 पुष्पेन्द्र रजक के घर से संतोष रजक के घर तक	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
977	रतगवां	गुखौर	आंतरिक माग के किनारे स्थायित्व फल-फूलदार पौधे लगाना रतगवा में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
978	रतगवां	गुखौर	डामरीकृत सड़क निर्माण मटिहा तालाब	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
979	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	स्टाप डैम मरम्मत किनारा कटाव सुधार raniganjpurwa	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
980	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	गंदे पानी का प्रबंधन raniganjpurwa	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
981	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	गंदे पानी का प्रबंधन Karibarah Nala	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
982	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	स्टाप डैम निर्माण जगन्नाथ के खेत पास	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
983	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	स्टाप डैम निर्माण रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
984	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	स्टाप डैम निर्माण रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
985	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	वृक्षारोपण रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
986	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	अमृत वाटिका रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
987	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	लीच पिट निर्माण रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
988	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	श्रेवियन संरचना निर्माण रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
989	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	श्रेवियन संरचना निर्माण रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ

990	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	शेवियन संरचना निर्माण रानीगंज पुरवा	पेयजल	VAP	पूर्ण
991	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	नवीन वाल्व रानीगंज पुरवा	पेयजल	VAP	पूर्ण
992	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	नल कनेक्शन रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	VAP	पूर्ण
993	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	नाला सफाई रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
994	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	रूफ टाप जल संरक्षण रानीगंज पुरवा	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
995	रानीगंजपुरवा	रानीगंजपुरवा	गंदे पानी का प्रबंधन कोडन पुरवा	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
996	समाना	समाना	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार Khabeeha har	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
997	समाना	समाना	ग्रेवियन स्ट्रक्चर Khabeeha har	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
998	समाना	समाना	ग्रेवियन स्ट्रक्चर Hanumanji Mandir	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
999	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Hanumanji Mandir	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1000	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Hanumanji Mandir	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1001	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Pathak muhlla	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1002	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Pathak muhlla	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1003	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Lakhn ke pass	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1004	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Chaudhary muhlla	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1005	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Tiwari muhlla	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1006	समाना	समाना	पाइप लाइन सुधार Hanumanji Mandir	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1007	समाना	समाना	चेक डैम सुधार Pathak muhlla	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1008	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Chaudhary muhlla	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1009	समाना	समाना	स्टाप डैम निर्माण खबीस हार समाना	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
1010	समाना	समाना	ग्रेवियन स्ट्रक्चर समाना	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1011	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1012	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Hanuman ji mandir pass samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1013	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Pathak muhlla samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1014	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Lakhera ke pass samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1015	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Chodhri mohalla samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1016	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Samana	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1017	समाना	समाना	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार Samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1018	समाना	समाना	चेक डैम निर्माण Samana	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1019	समाना	समाना	सार्वजनिक कूप निर्माण Samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1020	समाना	समाना	स्टाप डैम निर्माण Khabis har samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ

1021	समाना	समाना	समाना	स्टाप डैम निर्माण Gulli har samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1022	समाना	समाना	समाना	चेक डैम निर्माण Samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1023	समाना	समाना	समाना	कोई नहीं Samana	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1024	समाना	समाना	समाना	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार samana	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1025	समाना	समाना	समाना	स्टाप डैम निर्माण Samana	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1026	समाना	समाना	समाना	चेक डैम सुधार Samana	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1027	समाना	समाना	समाना	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार टंकी से भिरी के घर तक 100 मिमी मुख्य पाइप लाइन विस्तार	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
1028	समाना	समाना	समाना	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार 19 घरों में नल कनेक्शन एवं स्टेण्ड पोस्ट	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
1029	समाना	समाना	समाना	नल जल कनेक्शन प्राथमिक स्कूल में नल कनेक्शन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
1030	समाना	समाना	समाना	नल जल कनेक्शन ग्राम पंचायत में नल कनेक्शन	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
1031	समाना	समाना	समाना	नल जल कनेक्शन खिरका तालाब मसान बाबा के पास	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
1032	समाना	समाना	समाना	तालाब सफाई/गहरीकरण धर्मेन्द्र पाठक के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1033	समाना	समाना	समाना	नवीन स्टाप डैम निर्माण कटुआ घाट में में राजा राम तिवारी के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1034	समाना	समाना	समाना	नवीन स्टाप डैम निर्माण मनु राजा के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1035	समाना	समाना	समाना	नवीन स्टाप डैम निर्माण अवध द्विवेदी के खेत के पास खरी घाट	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1036	समाना	समाना	समाना	नवीन स्टाप डैम निर्माण पुल के ऊपर सुरेंद्र द्विवेदी के खेत के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1037	समाना	समाना	समाना	नवीन स्टाप डैम निर्माण सभी 02 हैंड पंपों के पास	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1038	समाना	समाना	समाना	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण प्राथमिक स्कूल में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1039	समाना	समाना	समाना	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण माध्यमिक स्कूल में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1040	समाना	समाना	समाना	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण ग्राम पंचायत में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1041	समाना	समाना	समाना	हैण्डपम्प एवं लीच पिट निर्माण खुली नाली की मरम्मत एवं ढकना संपूर्ण ग्राम में	जल संरक्षण	VAP	अप्रारंभ
1042	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	अमृत वाटिका सवाईगंज	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1043	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	रूफ टाप जल संरक्षण सवाईगंज	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1044	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	रूफ टाप जल संरक्षण सवाईगंज	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1045	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	गंदे पानी का प्रबंधन सवाईगंज	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1046	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	चेक डैम निर्माण सवाईगंज	पेयजल	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1047	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार सवाईगंज	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1048	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	चेक डैम निर्माण सवाईगंज	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1049	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	चेक डैम सुधार सवाईगंज	जल संरक्षण	GPDP 23-24	अप्रारंभ
1050	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	सवाईगंजपुरवा	चेक डैम सुधार सवाईगंज	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण

1051	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	शेवियन संरचना निर्माण सवाईगंगज	जल संरक्षण	NREGS 23-24	अप्रारंभ
1052	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	शेवियन संरचना निर्माण सवाईगंगज	जल संरक्षण	NREGS 23-24	पूर्ण
1053	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	शेवियन संरचना निर्माण सवाईगंगज	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
1054	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	शेवियन संरचना निर्माण सवाईगंगज	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
1055	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	शेवियन संरचना निर्माण सवाईगंगज	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
1056	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	शेवियन स्ट्रक्चर सवाईगंगज	जल संरक्षण	NREGS 23-24	प्रगतिरत
1057	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	शेवियन स्ट्रक्चर सवाईगंगज	पेयजल	VAP	पूर्ण
1058	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	कोई नहीं सवाईगंगज	पेयजल	VAP	अप्रारंभ
1059	सवाईगंगजपुरवा	सवाईगंगजपुरवा	जल वितरण पाइप लाइन विस्तार सवाईगंगज	पेयजल	VAP	अप्रारंभ



सेन्टर फॉर डेवलपमेन्ट सपोर्ट

36, ग्रीन एवेन्यू, चूना भट्टी, कोलार रोड, भोपाल- 462016, मध्यप्रदेश
फोन : 9893563713 | ई-मेल : info@samarthan.org | वेबसाइट : www.samarthan.org
